

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1					
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
1	<b>Budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i</b>	100%	Thu 17-02-02	Sat 19-03-16												
2	<b>PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY</b>	100%	Thu 17-02-02	Thu 17-02-02												
3	<b>1. ROBOTY PODSTAWOWE SEKCJA 1 i 2</b>	85%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03											
4	NADZÓR PRZYRODNICZY - STAN ZEROWY + PŁOTKI DLA PŁAZÓW	100%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03											
5	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	70%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03											
6	<b>2. ROBOTY DROGOWE SEKCJA 1 i 2</b>	47%	Mon 17-07-03	Sat 19-03-16	07-03											
7	<b>SEKCJA 1 - KM 0+000 DO 8+400</b>	79%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03											
8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	79%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03											
9	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	75%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03											
10	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	90%	Mon 17-07-03	Tue 17-10-03	07-03	10-03										
11	<b>ROBOTY</b>	46%	Mon 17-07-03	Sat 19-03-16	07-03											
12	<b>A1 0+000 - 3+075</b>	43%	Mon 17-07-03	Tue 18-12-11	07-03											
13	WYKOPY (180 000 m3)	95%	Mon 17-07-03	Fri 17-11-10	07-03	11-10										
14	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	70%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03											
15	WZMOCNIENIE PODŁOŻA (9000 m2)	100%	Fri 17-07-07	Mon 17-07-31	07-07	07-31										
16	NASYPY (280 000 m3)	50%	Sat 17-07-08	Thu 18-05-17	07-08											
17	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	45%	Sat 17-07-08	Thu 18-09-20	07-08											
18	GWN 0,5 m (30 000 m3)	20%	Mon 17-07-24	Wed 18-05-30	07-24											
19	WYKONANIE ZBIORNIKÓW 3 szt.	30%	Tue 17-07-18	Fri 18-09-14	07-18											
20	Podbudowa z betonu C 5/6 (63 000 m2)	15%	Tue 17-08-01	Mon 18-06-04	08-01											
21	Podbudowa c 8/10 (61 000 m2)	0%	Thu 17-08-10	Sat 18-06-09	08-10											
22	Drogi serwisowe i technologiczne	80%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-21	07-03											
23	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (30 000 m2)	0%	Mon 18-07-16	Wed 18-08-01												
24	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (30 000 m2)	0%	Tue 18-10-30	Thu 18-11-15												
25	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Wed 18-07-25	Tue 18-12-11												
26	<b>A2 3+075 - 3+975</b>	48%	Thu 17-07-06	Fri 18-11-30	07-06											
27	NASYPY (35 000 m3)	85%	Thu 17-07-06	Tue 17-10-17	07-06	10-17										
28	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Thu 17-07-06	Sat 18-09-29	07-06											
29	GWN 0,5 m (13 200 m3)	30%	Thu 17-10-05	Thu 17-10-26	10-05	10-26										

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	


Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
30	WYKONANIE ZBIORNIKÓW 2 szt.	10%	Fri 17-09-01	Thu 18-05-31			09-01									
31	Podbudowa z betonu C 5/6 (20 500 m2)	30%	Mon 17-10-23	Thu 18-07-05				10-23								
32	Podbudowa c 8/10 (20 000 m2)	0%	Tue 17-10-31	Fri 18-07-20				10-31								
33	Drogi serwisowe i technologiczne	80%	Tue 17-07-18	Wed 18-05-30	07-18											
34	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (9 500 m2)	0%	Thu 18-08-02	Mon 18-08-06												
35	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (9 500 m2)	0%	Thu 18-10-25	Mon 18-10-29												
36	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Tue 18-08-07	Fri 18-11-30												
37	<b>A3 3+975 - 5+050</b>	<b>57%</b>	<b>Mon 17-07-17</b>	<b>Wed 18-11-14</b>	07-17											
38	WYKOPY (35 000 m3)	100%	Mon 17-07-17	Sat 17-09-30	07-17			09-30								
39	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Tue 17-07-25	Sat 18-10-06	07-25											
40	NASYPY (35 000 m3)	95%	Wed 17-07-19	Fri 18-04-20	07-19											
41	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Tue 17-07-25	Sat 18-10-06	07-25											
42	GWN 0,5 m (5 000 m3)	50%	Wed 17-08-23	Fri 18-03-16			08-23						03			
43	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 2	5%	Thu 17-07-20	Sat 18-08-04	07-20											
44	Podbudowa z betonu C 5/6 (23 000 m2)	80%	Wed 17-10-25	Mon 18-06-25				10-25								
45	Podbudowa c 8/10 (22 500 m2)	0%	Thu 17-11-02	Thu 18-07-12				11-02								
46	Drogi serwisowe i technologiczne	50%	Tue 17-07-25	Sat 18-09-29	07-25											
47	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (11 100 m2)	0%	Tue 18-08-07	Mon 18-08-13												
48	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (11 100 m2)	0%	Thu 18-10-18	Wed 18-10-24												
49	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Tue 18-08-14	Wed 18-11-14												
50	<b>A4 5+050 - 6+150</b>	<b>73%</b>	<b>Fri 17-07-14</b>	<b>Thu 18-11-29</b>	07-14											
51	WYKOPY (10 000 m3)	100%	Fri 17-07-14	Wed 17-08-23	07-14			08-23								
52	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	100%	Fri 17-07-14	Mon 18-07-30	07-14											
53	NASYPY (2 000 m3)	100%	Mon 17-07-17	Mon 17-09-11	07-17			09-11								
54	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	95%	Mon 17-07-17	Wed 18-08-01	07-17											
55	GWN 0,5 m (500 m3)	90%	Sat 17-07-22	Mon 17-09-11	07-22			09-11								
56	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 1	10%	Fri 17-09-22	Fri 18-08-10				09-22								
57	Podbudowa z betonu C 5/6 (8 000 m2)	85%	Tue 17-08-01	Mon 17-10-02	08-01			10-02								
58	Podbudowa c 8/10 (7 500m2)	80%	Thu 17-10-12	Thu 17-10-19				10-12	10-19							

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Październik.mpp																		
					Jun	2017 Qtr 3	Jul	Aug	Sep	2017 Qtr 4	Oct	Nov	Dec	2018 Qtr 1	Jan	Feb	Mar						
59	Drogi serwisowe i technologiczne	85%	Wed 17-07-26	Fri 18-09-28			07-26																
60	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (11 000 m2)	0%	Tue 18-08-14	Sat 18-08-18																			
61	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (11 000 m2)	0%	Fri 18-10-12	Wed 18-10-17																			
62	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Mon 18-08-20	Thu 18-11-29																			
63	<b>A5 6+150 - 8+400</b>	<b>51%</b>	<b>Mon 17-07-10</b>	<b>Mon 18-11-26</b>			07-10																
64	WYKOPY (30 000 m3)	80%	Mon 17-07-10	Mon 18-04-30			07-10																
65	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	95%	Mon 17-07-10	Wed 18-07-25			07-10																
66	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	85%	Mon 17-07-10	Mon 18-04-02			07-10																
67	NASYP PRZECIĄŻAJĄCY 6+250 - 6+400 STR. L	30%	Wed 17-10-11	Tue 17-11-14																			
68	ROZBIÓRKA NASYPU PRZECIĄŻAJĄCEGO 6+250 - 6+400 STR. L	0%	Fri 18-03-16	Thu 18-04-19																			
69	NASYPY POZOSTAŁE (35 000 m3)	65%	Mon 17-07-10	Wed 18-05-30			07-10																
70	GWN 0,5 m (23 000 m3)	30%	Fri 17-07-28	Mon 18-06-11			07-28																
71	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 2	10%	Sat 17-07-15	Sat 18-09-29			07-15																
72	Podbudowa z betonu C 5/6 (46 500 m2)	35%	Thu 17-10-12	Fri 18-06-15																			
73	Podbudowa c 8/10 (46 000 m2)	0%	Mon 17-10-30	Tue 18-07-03																			
74	Drogi serwisowe i technologiczne	85%	Fri 17-07-28	Mon 18-09-03			07-28																
75	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (22 500 m2)	0%	Tue 18-08-14	Fri 18-08-24																			
76	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (22 500 m2)	0%	Mon 18-10-01	Thu 18-10-11																			
77	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Sat 18-08-25	Mon 18-11-26																			
78	<b>PODBUDOWY</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-09-01</b>	<b>Fri 18-11-16</b>																			
79	<b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-09-01</b>	<b>Fri 18-11-16</b>																			
85	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Sat 18-10-13</b>																			
91	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-05-29</b>	<b>Tue 18-11-20</b>																			
92	<b>Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-06-13</b>	<b>Mon 18-11-12</b>																			
98	<b>Warstwa ścierna z betonu asfaltowego</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-05-29</b>	<b>Tue 18-11-20</b>																			
106	<b>Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-08-08</b>	<b>Wed 18-11-14</b>																			
108	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-08-13</b>	<b>Sat 19-03-16</b>																			
114	<b>SEKCJA 2 - KM 8+400 DO 12+221,45</b>	<b>37%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sat 19-03-16</b>																			
115	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>90%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Wed 18-06-13</b>			07-03																

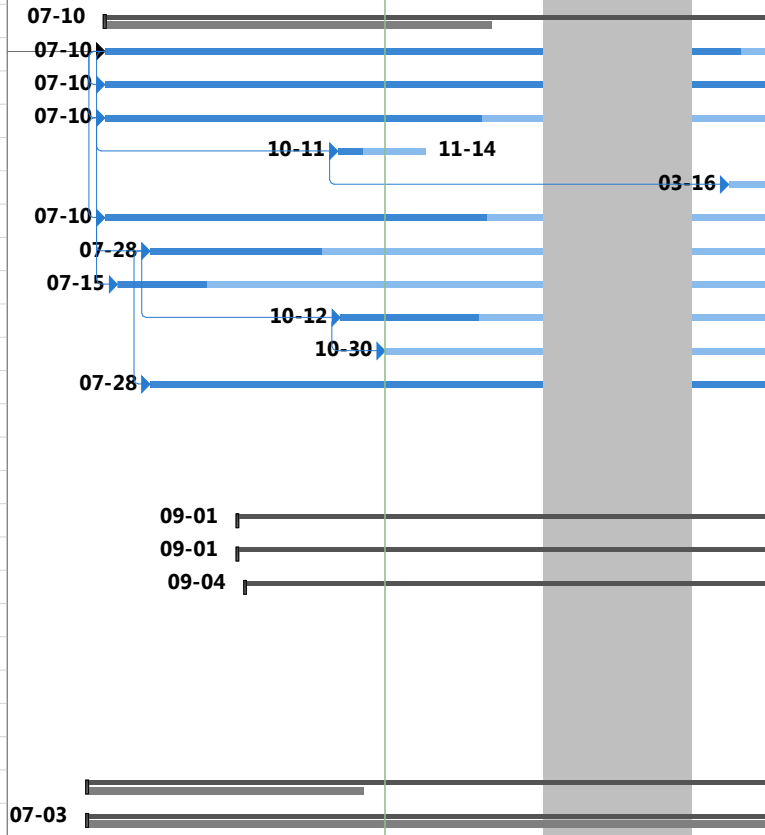

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Październik.mpp												
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1					
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar				
116	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	90%	Mon 17-07-03	Wed 18-06-13	07-03	[Progress bar]											
117	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>39%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Tue 18-09-18</b>	07-03	[Progress bar]											
118	<b>WYKOPY TRASA GŁÓWNA, DD, DG, DP, DW</b>	<b>63%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Fri 18-09-14</b>	07-03	[Progress bar]											
119	WYKOPY 8+400 DO 9+700 - ( 195 000 m3 )	45%	Mon 17-07-03	Fri 18-04-27	07-03	[Progress bar]											
120	WYKOPY 9+700 DO 10+800 - ( 150 000 m3 )	45%	Mon 17-07-03	Fri 18-04-27	07-03	[Progress bar]											
121	WYKOPY 10+800 DO 12+221 - ( 10 000 m3 )	90%	Mon 17-07-03	Wed 18-06-13	07-03	[Progress bar]											
122	WYKOPY DD,DW,DP	65%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03	[Progress bar]											
123	<b>NASYPY TRASA GŁÓWNA, DD, DG, DP, DW</b>	<b>25%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Tue 18-09-18</b>	07-03	[Progress bar]											
124	NASYPY 8+400 DO 9+250 - ( 135 000 m3 )	30%	Mon 17-07-03	Thu 18-08-16	07-03	[Progress bar]											
125	NASYPY 10+200 DO 10+800 - ( 99 600 m3 )	40%	Mon 17-07-03	Fri 18-04-27	07-03	[Progress bar]											
126	NASYPY DD,DW,DP	25%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03	[Progress bar]											
127	<b>GWN</b>	<b>14%</b>	<b>Sat 18-03-24</b>	<b>Tue 18-09-18</b>		[Progress bar]											
128	TRASA GŁÓWNA ( 26 950 m3 )	30%	Sat 18-03-24	Wed 18-08-22		[Progress bar]											
129	DD, DG, DP, DW ( 3 300 m3 )	0%	Sat 18-03-24	Tue 18-09-18		[Progress bar]											
130	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	<b>22%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Fri 18-09-14</b>	07-03	[Progress bar]											
131	TRASA GŁÓWNA, DD, DG, DP, DW	40%	Fri 17-07-21	Mon 18-05-28	07-21	[Progress bar]											
132	WYKONANIE ZBIORNIKÓW	10%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03	[Progress bar]											
133	<b>PODBUDOWY</b>	<b>14%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sat 18-11-24</b>	07-03	[Progress bar]											
134	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,5	0%	Sat 18-03-31	Fri 18-06-08		[Progress bar]											
137	Warstwa mrozoochronna	0%	Mon 17-09-04	Fri 18-05-25		[Progress bar]											
140	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30	0%	Mon 18-04-16	Tue 18-10-02		[Progress bar]											
144	Podbudowa z betonu asfaltowego	0%	Wed 18-08-01	Sat 18-11-24		[Progress bar]											
148	Podbudowa z betonu C 5/6	40%	Tue 17-07-04	Fri 18-08-24	07-04	[Progress bar]											
149	TRASA GŁÓWNA S61 ( 79 900 m2 )	40%	Tue 17-07-04	Fri 18-08-24	07-04	[Progress bar]											
150	Podbudowa c 8/10	40%	Mon 17-07-03	Sat 17-08-26	07-03	[Progress bar]											
151	TRASA GŁÓWNA S61 ( 77 300 m2 )	40%	Mon 17-07-03	Sat 17-08-26	07-03	[Progress bar]											
152	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia - warstwa poślizgowa	0%	Mon 17-09-04	Wed 17-09-20		[Progress bar]											
154	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-08-03</b>	<b>Wed 18-12-05</b>		[Progress bar]											
168	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 17-08-28</b>	<b>Sat 19-03-16</b>		[Progress bar]											

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



ID	Nazwa zadania	% Complete	Październik.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
245	odcinek próbny - nawierzchnia żwirowa C90/3	100%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08			09-08	09-08								
246	odcinek próbny - podbudowa z betonu asfaltowego	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-07		08-07	08-07									
247	odcinek próbny - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	100%	Tue 17-08-08	Wed 17-08-09		08-08	08-09									
248	odcinek próbny - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-20			09-09	09-20								
249	odcinek próbny - warstwa ściernalna SMA	100%	Thu 17-09-07	Thu 17-09-07			09-07	09-07								
250	odbiory techniczne przez IK Odcinek B	100%	Mon 17-09-11	Thu 17-09-21			09-11	09-21								
251	odbiór techniczne przez IK Odcinek A	0%	Thu 18-11-29	Fri 18-12-14												
252	<b>CZAS NA UKOŃCZENIE ODCINEK B</b>	100%	Thu 17-02-02	Thu 17-09-21				09-21								
253	<b>CZAS NA UKOŃCZENIE ODCINEK A</b>	43%	Thu 17-02-02	Fri 18-12-14												
254	<b>BRANŻE - ODCINEK B</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-12-14	07-03						12-14					
255	<b>KOLIZJE ENERGETYCZNE</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-12-14	07-03						12-14					
257	<b>ZASILANIE</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03				10-05							
258	Znaki aktywne (km 12+480-12+580 OŚ)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03		08-31									
259	KSZR 6 (km 13+080 L (DD15A, WE-13))	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03		08-31									
260	Zasilanie SO 4 (rondo DK8)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03		08-31									
261	Zasilanie ZK (znaki na wyspach Z1, Z2, Z3) (rondo DK8)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03		08-31									
262	Rozruch próbny, pomiary (zestaw prądowłóczy BX)	100%	Fri 17-09-01	Thu 17-10-05			09-01	10-05								
263	<b>OŚWIETLENIE</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03				10-05							
264	12+400-13+100 P	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03		08-31									
265	0+600-1+100 P	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03		08-31									
266	Rozruch próbny, pomiary (zestaw prądowłóczy BX)	100%	Fri 17-09-01	Thu 17-10-05			09-01	10-05								
267	<b>KANAŁ TELETECHNICZNY</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03				10-05							
271	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>	100%	Thu 17-08-24	Sat 17-09-09			08-24	09-09								
272	wpust z wylotem do rowu	100%	Thu 17-08-24	Thu 17-08-31			08-24	08-31								
273	kanały 55, 56, 57	100%	Fri 17-08-25	Sat 17-09-09			08-25	09-09								
274	<b>BRANŻE - ODCINEK A</b>	25%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03											
275	<b>KOLIZJE ENERGETYCZNE WN 110 kV</b>	12%	Mon 17-07-03	Sun 17-12-31	07-03						12-31					
277	0 WN - przystosowanie do 3 st (km 5+800-6+400 S61)	0%	Mon 17-07-03	Tue 17-10-31	07-03				10-31							
278	1 WN (km 9+000 S61)	0%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03			09-19	11-03								

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
279	2 WN (km 9+100 S61)	0%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03												
280	3 WN (km 10+200 S61)	65%	Fri 17-08-25	Mon 17-09-18												
281	4 WN (km 11+900 S61)	85%	Tue 17-08-01	Thu 17-08-24												
282	Przekazanie na stan PGE	0%	Sat 17-11-04	Sun 17-12-31												
283	<b>KOLIZJE ENERGETYCZNE nn 0.4 kV</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sun 17-12-31</b>	<b>07-03</b>											
291	<b>KOLIZJE ENERGETYCZNE SN 20 kV</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sun 17-12-31</b>	<b>07-03</b>											
327	<b>ZASILANIE</b>	<b>29%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Wed 18-08-29</b>												
328	KSZR 1 (węzeł "Lotnisko")	0%	Mon 17-09-04	Fri 17-09-08												
329	KSZR 2 (DG 102026 B (WD-2))	0%	Sat 17-09-30	Mon 17-10-16												
330	Zasilanie ST 2 (km 3+570-4+580 L (WE-3 WD-4))	90%	Mon 17-09-18	Wed 17-11-08												
331	KSZR 3 (km 4+580 L)	0%	Thu 17-11-30	Thu 18-03-15												
332	Zasilanie SO 2 (wzdłuż DW (WD-4))	0%	Thu 18-06-07	Sat 18-06-30												
333	Zasilanie SO 1 (wzdłuż DW (WD-4))	0%	Thu 18-06-07	Sat 18-06-30												
334	KSZR 4 (km 6+250 P)	0%	Mon 18-07-02	Tue 18-07-17												
335	Zasilanie SO 3 (6+250-6+700 P (WD-5))	65%	Mon 18-07-02	Wed 18-07-25												
336	Zasilanie P1 (km 7+320-7+800 P)	50%	Mon 17-09-04	Sat 17-10-07												
337	KSZR 5 (km 7+780 P)	0%	Wed 18-04-11	Wed 18-04-18												
338	Zasilanie stacji ZK-M (km 7+780-8+200 P)	0%	Wed 18-05-16	Thu 18-05-31												
339	Podpisanie umowy z PGE na świadczenie usług dystrybucyjnych (1 m-c od	0%	Thu 18-07-26	Wed 18-08-29												
340	<b>OŚWIETLENIE</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-03-17</b>	<b>Fri 18-12-14</b>												
354	<b>KANAŁ TELETECHNICZNY</b>	<b>2%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Sat 18-12-08</b>												
363	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>	<b>29%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sat 18-11-10</b>	<b>07-03</b>											
390	<b>DRENAŻ</b>	<b>9%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Mon 18-10-08</b>												
405	<b>STACJA METEO</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-06-01</b>	<b>Fri 18-06-29</b>												
407	<b>Obiekty odcinek A</b>	<b>21%</b>	<b>Tue 17-07-18</b>	<b>Thu 19-01-03</b>	<b>07-18</b>											
408	<b>WE 1</b>	<b>46%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Fri 18-11-16</b>	<b>07-19</b>											
477	<b>Korpusy filary</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Mon 17-10-02</b>	<b>07-19</b>											
485	<b>Korpus podpor P1 P</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Tue 17-08-08</b>	<b>07-19</b>											
508	<b>Filary P2 P</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-07-24</b>	<b>Mon 17-09-11</b>	<b>07-24</b>											

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart																															
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1																								
					07-20	07-27	07-31	08-28	09-05	09-04	09-02	09-21	09-22	10-02	10-09	10-10	10-20	10-21	10-31	11-03	11-01	11-04	12-02	12-09	01-04	03-28	04-04	03-03	03-16	03-30	10-03	10-19	11-18	12-02	03-21	04-10
524	Filary P3 L	100%	Thu 17-07-20	Mon 17-09-04																																
540	Filary P3 P	100%	Thu 17-07-27	Mon 17-10-02																																
556	Korpus podpor P4L	100%	Mon 17-07-31	Sat 17-09-02																																
563	Korpus podpor P4 P	100%	Mon 17-08-28	Sat 17-09-30																																
570	Montaż łożysk	100%	Tue 17-09-05	Wed 17-10-04																																
573	Ścianka zapleczna	0%	Wed 18-03-28	Tue 18-04-10																																
576	Płyty przejściowe	0%	Thu 18-04-19	Fri 18-06-15																																
587	Ustrójże nośne	60%	Tue 17-09-05	Thu 18-03-15																																
588	Ustroj jezdni L	60%	Tue 17-09-05	Thu 18-03-15																																
589	Przygotowanie podłoża pod ustrój	100%	Tue 17-09-05	Thu 17-09-21																																
592	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Fri 17-09-22	Fri 17-10-20																																
593	Ustawienie wież rusztowania	100%	Fri 17-09-22	Mon 17-10-09																																
594	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Tue 17-10-10	Fri 17-10-20																																
595	Zbrojenie ustroju nośnego	17%	Sat 17-10-21	Fri 17-11-03																																
596	Zbrojenie	20%	Sat 17-10-21	Fri 17-11-03																																
597	Montaż osłonek wpychanie kabli	0%	Tue 17-10-31	Wed 17-11-01																																
598	Betonowanie ustroju nośnego	0%	Sat 17-11-04	Sat 17-12-02																																
602	Dobetonowanie dźwigara	0%	Sat 17-12-09	Thu 18-03-15																																
606	izolacja ustroju	0%	Thu 18-03-29	Fri 18-05-11																																
609	Montaż dylatacji	0%	Fri 18-03-16	Tue 18-03-20																																
612	Kapy chodnikowe	0%	Fri 18-03-30	Fri 18-05-04																																
619	Jezdnia	0%	Fri 18-08-10	Mon 18-08-27																																
625	Ustroj jezdni P	21%	Tue 17-10-03	Tue 18-03-27																																
626	Przygotowanie podłoża pod ustrój	100%	Tue 17-10-03	Thu 17-10-19																																
629	Deskowanie ustroju nośnego	0%	Sat 17-10-21	Sat 17-11-18																																
632	Zbrojenie ustroju nośnego	0%	Mon 17-11-20	Sat 17-12-02																																
635	Betonowanie ustroju nośnego	0%	Mon 17-12-04	Thu 18-01-04																																
639	Dobetonowanie dźwigara	0%	Wed 18-03-21	Tue 18-03-27																																
643	izolacja ustroju	0%	Tue 18-04-10	Wed 18-05-09																																

Krytyczne	Tylko z zakończeniem		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny	Plan bazowy		Podział według planu bazowego		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny	Punkt kontrolny według planu bazowego		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadania zewnętrzne	
Zadanie	Punkt kontrolny		Postęp sumaryczny		Zadanie nieaktywne	
Podział	Podsumowanie		Tylko z rozpoczęciem		Nieaktywny punkt kontrolny	
Postęp zadania					Podsumowanie nieaktywne	
Zadanie ręczne					Termin ostateczny	
Tylko z rozpoczęciem						




Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
646	<b>Montaż dylatacji</b>	0%	Wed 18-03-28	Sat 18-03-31												03-28
649	<b>Kapy chodnikowe</b>	0%	Thu 18-03-15	Mon 18-05-07												03-15
656	<b>Jezdnia</b>	0%	Thu 18-08-16	Mon 18-08-27												
662	<b>Mur oporowy P1</b>	72%	Wed 17-08-02	Wed 18-04-18	08-02											
663	<b>Mur P1 L</b>	69%	Wed 17-08-02	Fri 18-04-06	08-02											
664	Fundament muru P1 L	100%	Wed 17-08-02	Sat 17-08-05	08-02	08-05										
665	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	67%	Mon 17-08-07	Fri 18-04-06	08-07											
666	Lico muru 0,4 H	100%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21	08-07	09-21										
667	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 18-03-15	Fri 18-04-06												03-15
668	<b>Mur P1 P</b>	69%	Wed 17-08-02	Fri 18-04-06	08-02											
669	Fundament muru P1 L	100%	Wed 17-08-02	Sat 17-08-05	08-02	08-05										
670	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	67%	Mon 17-08-07	Fri 18-04-06	08-07											
671	Lico muru 0,4 H	100%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21	08-07	09-21										
672	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 18-03-15	Fri 18-04-06												03-15
673	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	100%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21	08-07	09-21										
674	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Sat 18-04-07	Wed 18-04-18												04-07
675	<b>Mur oporowy P4</b>	54%	Mon 17-09-25	Wed 18-05-23												
676	<b>Mur P4 L</b>	56%	Mon 17-09-25	Fri 18-05-11												
677	Fundament muru P2 L	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28												
678	<b>Mur oprowowy + zasyпка P2 L</b>	53%	Fri 17-09-29	Fri 18-05-11												
679	Lico muru 0,4 H	80%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14												
680	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 18-04-19	Fri 18-05-11												04
681	<b>Mur P4 P</b>	56%	Mon 17-09-25	Fri 18-05-11												
682	Fundament muru	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28												
683	<b>Mur oprowowy + zasyпка P2 P</b>	53%	Fri 17-09-29	Fri 18-05-11												
684	Lico muru 0,4 H	80%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14												
685	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 18-04-19	Fri 18-05-11												04
686	Zasyпка korpusu 0-0,4 H	60%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14												
687	Zasyпка korpusu 0,4H - 1 H	0%	Sat 18-05-12	Wed 18-05-23												

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
688	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Thu 18-05-24	Fri 18-09-07										
691	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 1	0%	Sat 18-09-08	Fri 18-11-16										
692	<b>WD 1 A</b>	0%	Mon 17-11-06	Thu 18-12-27										
811	<b>WD 2</b>	19%	Wed 17-07-26	Thu 18-07-19										
831	<b>Korpusy</b>	100%	Wed 17-07-26	Sat 17-08-26										
832	<b>Korpus podpor P1</b>	100%	Wed 17-07-26	Sat 17-07-29										
836	Rozdeskowanie podpory P1	100%	Wed 17-07-26	Thu 17-07-27										
837	Izolacja podpory P1	100%	Fri 17-07-28	Fri 17-07-28										
838	Ciosy podłożyskowe	100%	Fri 17-07-28	Sat 17-07-29										
839	<b>Korpus podpor P2</b>	100%	Fri 17-07-28	Sat 17-08-26										
841	Deskowanie podpory P2	100%	Fri 17-07-28	Tue 17-08-08										
842	Betonowanie P2	100%	Wed 17-08-09	Wed 17-08-09										
843	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Fri 17-08-18	Sat 17-08-19										
844	Izolacja podpory P2	100%	Sat 17-08-26	Sat 17-08-26										
845	Ciosy podłożyskowe	100%	Mon 17-08-21	Tue 17-08-22										
846	Montaż łożysk	100%	Thu 17-08-31	Thu 17-08-31										
847	<b>Ścianka zapleczna</b>	0%	Tue 17-12-12	Fri 18-03-16										
850	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	Tue 17-12-05	Thu 18-04-19										
861	<b>Ustrój nośny</b>	88%	Thu 17-08-10	Tue 17-12-05										
862	<b>Ustroj</b>	88%	Thu 17-08-10	Tue 17-12-05										
863	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój</b>	100%	Thu 17-08-10	Wed 17-08-30										
866	<b>Deskowanie ustroju nośnego</b>	100%	Thu 17-08-31	Thu 17-09-28										
869	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-10-10										
870	Zbrojenie	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-10-10										
871	Montaż osłonek wypchanie kabli	100%	Sat 17-10-07	Tue 17-10-10										
872	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	100%	Wed 17-10-11	Mon 17-11-13										
873	Ustrój	100%	Wed 17-10-11	Wed 17-10-11										
874	sprężenie	100%	Mon 17-11-06	Mon 17-11-06										
875	Rozdeskowanie	100%	Tue 17-11-07	Mon 17-11-13										

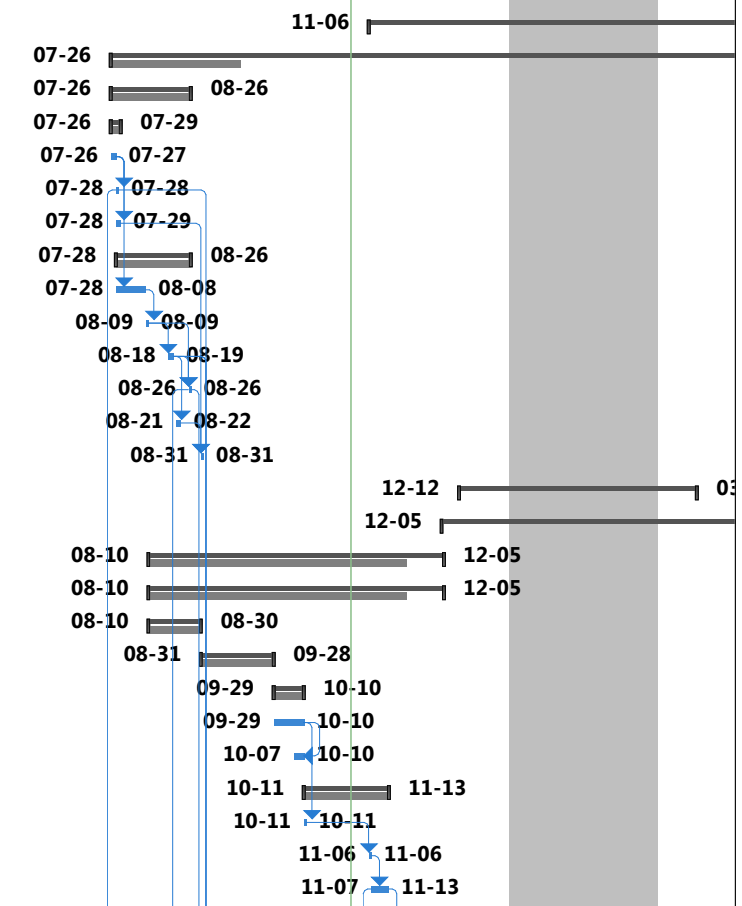

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Październik.mpp											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
876	<b>Dobetonowanie dzwigara</b>	0%	Sat 17-11-25	Tue 17-12-05					11-25	12-05						
880	<b>izolacja ustroju</b>	0%	Fri 18-03-30	Tue 18-04-03									03-30			
883	<b>Montaż dylatacji</b>	0%	Sat 18-03-17	Fri 18-03-23									03-17			
886	<b>Kapy chodnikowe</b>	0%	Sat 18-03-31	Tue 18-05-08									03-31			
893	<b>Jezdnia</b>	0%	Wed 18-04-04	Thu 18-06-21									04-04			
899	<b>Mur oporowy P1</b>	9%	Sat 17-08-26	Wed 17-12-06			08-26				12-06					
900	<b>Mur P1 L</b>	14%	Mon 17-08-28	Wed 17-12-06			08-28				12-06					
901	Fundament muru P1 L	100%	Mon 17-08-28	Fri 17-09-01			08-28	09-01								
902	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	7%	Sat 17-09-02	Wed 17-12-06			09-02				12-06					
903	Lico muru 0,4 H	10%	Sat 17-09-02	Wed 17-10-18			09-02		10-18							
904	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Tue 17-11-14	Wed 17-12-06					11-14		12-06					
905	<b>Mur P1 P</b>	8%	Sat 17-08-26	Wed 17-12-06			08-26				12-06					
906	Fundament muru P1 L	100%	Sat 17-08-26	Thu 17-08-31			08-26	08-31								
907	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	0%	Fri 17-09-01	Wed 17-12-06			09-01				12-06					
910	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	10%	Thu 17-10-19	Mon 17-10-30				10-19	10-30							
911	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Tue 17-11-14	Wed 17-12-06					11-14		12-06					
912	<b>Mur oporowy P2</b>	9%	Sat 17-09-02	Thu 18-03-29			09-02									
913	<b>Mur P2 L</b>	14%	Sat 17-09-02	Thu 18-03-29			09-02									
914	Fundament muru P2 L	100%	Sat 17-09-02	Thu 17-09-07			09-02	09-07								
915	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	7%	Fri 17-09-08	Thu 18-03-29			09-08									
916	Lico muru 0,4 H	10%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24			09-08		10-24							
917	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 17-12-07	Thu 18-03-29					12-07							
918	<b>Mur P2 P</b>	8%	Sat 17-09-02	Thu 18-03-29			09-02									
919	Fundament muru P2 P	100%	Sat 17-09-02	Thu 17-09-07			09-02	09-07								
920	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 P</b>	0%	Fri 17-09-08	Thu 18-03-29			09-08									
923	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	10%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24			09-08		10-24							
924	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Thu 17-12-07	Thu 18-03-29					12-07							
925	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Fri 18-03-30	Sat 18-06-30									03-30			
928	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	0%	Fri 18-06-15	Thu 18-07-19												

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart														
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1							
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar					
929	<b>WE 3</b>	37%	Fri 17-07-21	Thu 18-12-13	07-21	[Gantt bar]													
969	<b>Korpusy</b>	100%	Fri 17-07-21	Thu 17-10-19	07-21	[Gantt bar]													
994	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	Fri 18-05-18	Fri 18-07-06		[Gantt bar]													
1005	<b>Ustrój nośny</b>	100%	Fri 17-09-01	Tue 18-04-24	09-01	[Gantt bar]													
1006	<b>Ustroj jezdni L</b>	100%	Fri 17-09-01	Fri 17-12-01	09-01	[Gantt bar]													
1007	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój L</b>	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-12	09-01	[Gantt bar]													
1010	<b>Deskowanie ustroju nośnego L</b>	100%	Thu 17-10-12	Mon 17-10-23		[Gantt bar]													
1013	<b>Zbrojenie ustroju nośnego L</b>	100%	Tue 17-10-24	Tue 17-10-31		[Gantt bar]													
1014	Zbrojenie	100%	Tue 17-10-24	Tue 17-10-31		[Gantt bar]													
1015	<b>Betonowanie ustroju nośnego L</b>	100%	Wed 17-11-01	Fri 17-12-01		[Gantt bar]													
1018	<b>Ustroj jezdni P</b>	100%	Fri 17-10-13	Tue 18-04-24	10-13	[Gantt bar]													
1030	<b>izolacja ustroju</b>	0%	Thu 18-04-19	Fri 18-10-19		[Gantt bar]													
1036	<b>Kapy chodnikowe</b>	0%	Sat 18-04-21	Mon 18-05-28		[Gantt bar]													
1043	<b>Jezdni</b>	0%	Wed 18-10-17	Tue 18-10-23		[Gantt bar]													
1048	<b>Mur oporowy P1</b>	31%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17	09-08	[Gantt bar]													
1049	<b>Mur P1 L</b>	33%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17	09-08	[Gantt bar]													
1051	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	33%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17	09-08	[Gantt bar]													
1052	Lico muru 0,4 H	50%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24	09-08	[Gantt bar]													
1053	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Wed 18-04-25	Thu 18-05-17		[Gantt bar]													
1054	<b>Mur P1 P</b>	7%	Fri 17-10-20	Thu 18-05-17	10-20	[Gantt bar]													
1056	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	7%	Fri 17-10-20	Thu 18-05-17	10-20	[Gantt bar]													
1059	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	80%	Wed 17-12-06	Fri 18-04-20		[Gantt bar]													
1060	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Wed 18-04-25	Thu 18-05-17		[Gantt bar]													
1061	<b>Mur oporowy P2</b>	38%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09	09-29	[Gantt bar]													
1062	<b>Mur P2 L</b>	53%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09	09-29	[Gantt bar]													
1064	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	53%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09	09-29	[Gantt bar]													
1065	Lico muru 0,4 H	80%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14	09-29	[Gantt bar]													
1066	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Fri 18-05-18	Sat 18-06-09		[Gantt bar]													
1067	<b>Mur P2 P</b>	7%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09	09-29	[Gantt bar]													

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Październik.mpp											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
1069	<b>Mur oporowy + zasypka P2 P</b>	7%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09				09-29								
1072	Zasypka korpusu P2 0-0,4 H	80%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14			09-29		11-14							
1073	Zasypka korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Fri 18-05-18	Sat 18-06-09												
1074	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Mon 18-06-11	Sat 18-09-22												
1076	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 3	0%	Tue 18-10-23	Thu 18-12-13												
1077	<b>WD 4</b>	17%	Fri 17-07-21	Fri 18-08-03	07-21											
1098	<b>Korpusy</b>	46%	Fri 17-07-21	Sat 18-03-17	07-21									01		
1099	<b>Korpus podpor P1</b>	100%	Fri 17-07-21	Fri 17-08-11	07-21		08-11									
1104	Izolacja podpory P1	100%	Thu 17-08-10	Fri 17-08-11		08-10	08-11									
1105	Ciosy podłożyskowe	100%	Fri 17-07-21	Sat 17-07-22	07-21	07-22										
1106	<b>Korpus podpor P2</b>	100%	Fri 17-07-21	Wed 17-08-09	07-21		08-09									
1109	Betonowanie P2	100%	Fri 17-07-21	Fri 17-07-21	07-21	07-21										
1110	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Mon 17-07-31	Tue 17-08-01	07-31	08-01										
1111	Izolacja podpory P2	100%	Tue 17-08-08	Wed 17-08-09	08-08	08-09										
1112	Ciosy podłożyskowe	100%	Wed 17-08-02	Thu 17-08-03	08-02	08-03										
1113	Montaż łożysk	0%	Sat 17-09-23	Wed 17-09-27			09-23	09-27								
1114	<b>Ścianka zapleczna</b>	0%	Fri 17-12-08	Sat 18-03-17						12-08				01		
1117	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	Sat 18-03-17	Fri 18-05-04								03-17		01		
1128	<b>Ustrój nośny</b>	100%	Wed 17-08-02	Thu 17-12-07	08-02					12-07						
1129	<b>Ustroj</b>	100%	Wed 17-08-02	Thu 17-12-07	08-02					12-07						
1130	<b>Przygotowanie podłoża pod montaż konstrukcji stalowej</b>	100%	Wed 17-08-02	Sat 17-09-02	08-02		09-02									
1131	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Wed 17-08-02	Mon 17-08-07	08-02	08-07										
1132	Przygotowanie fundamentów podpór	100%	Tue 17-08-08	Wed 17-08-16	08-08	08-16										
1133	Montaż podpór tymczasowych	100%	Wed 17-08-23	Sat 17-09-02	08-23	09-02										
1134	<b>Montaż konstrukcji stalowej</b>	100%	Mon 17-09-04	Mon 17-10-02	09-04		10-02									
1135	Montaż konstrukcji stalowej	100%	Mon 17-09-04	Wed 17-09-20	09-04	09-20										
1136	Scalanie konstrukcji stalowej	100%	Thu 17-09-21	Mon 17-10-02	09-21	10-02										
1137	<b>Deskowanie ustroju nośnego</b>	100%	Tue 17-10-03	Thu 17-10-19		10-03	10-19									
1138	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Tue 17-10-03	Thu 17-10-19		10-03	10-19									

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	




Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			Mar	
1214	<b>Korpusy</b>	100%	Mon 17-07-24	Wed 17-09-27												
1229	Montaż łożysk	100%	Tue 17-10-10	Tue 17-10-10												
1230	<b>Ścianka zapleczna</b>	0%	Wed 18-04-11	Mon 18-04-16												
1233	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	Mon 18-04-16	Sat 18-06-02												
1244	<b>Ustrój nośny</b>	19%	Thu 17-09-21	Wed 18-04-04												
1245	<b>Ustroj</b>	19%	Thu 17-09-21	Wed 18-04-04												
1246	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój</b>	81%	Thu 17-09-21	Mon 17-10-09												
1247	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Thu 17-09-21	Mon 17-10-02												
1248	Ułożenie płyt drogowych	50%	Tue 17-10-03	Mon 17-10-09												
1249	<b>Deskowanie ustroju nośnego</b>	0%	Tue 17-10-10	Sat 17-11-04												
1250	Ustawienie wież rusztowania	0%	Tue 17-10-10	Thu 17-10-26												
1251	Deskowanie ustroju nośnego	0%	Fri 17-10-27	Sat 17-11-04												
1252	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	0%	Mon 17-11-06	Thu 17-11-16												
1253	Zbrojenie	0%	Mon 17-11-06	Thu 17-11-16												
1254	Montaż osłonek wypychanie kabli	0%	Tue 17-11-14	Thu 17-11-16												
1255	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	0%	Fri 17-11-17	Tue 18-03-20												
1256	Ustrój	0%	Fri 17-11-17	Fri 17-11-17												
1257	sprężenie	0%	Wed 17-12-13	Wed 17-12-13												
1258	Rozdeskowanie	0%	Thu 17-12-14	Tue 18-03-20												
1259	<b>Dobetonowanie dźwigara</b>	0%	Tue 18-03-27	Wed 18-04-04												
1260	Deskowanie	0%	Fri 18-03-30	Tue 18-04-03												
1261	Zbrojenie	0%	Tue 18-03-27	Thu 18-03-29												
1262	Betonowanie	0%	Wed 18-04-04	Wed 18-04-04												
1263	<b>izolacja ustroju</b>	0%	Fri 18-04-13	Sat 18-05-05												
1266	<b>Montaż dylatacji</b>	0%	Tue 18-04-17	Mon 18-04-23												
1269	<b>Kapy chodnikowe</b>	0%	Sat 18-04-14	Tue 18-05-15												
1276	<b>Jezdnia</b>	0%	Fri 18-06-22	Mon 18-07-02												
1282	<b>Mur oporowy P1</b>	0%	Tue 17-09-26	Tue 18-04-17												
1295	<b>Mur oporowy P2</b>	0%	Thu 17-09-21	Thu 18-05-10												

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1308	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-05-11</b>	<b>Thu 18-07-19</b>											
1311	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WD 5	0%	Tue 18-05-29	Mon 18-08-06											
1312	<b>PZ 6</b>	<b>26%</b>	<b>Mon 17-07-24</b>	<b>Fri 18-12-28</b>											
1315	<b>Roboty fundamentowe</b>	<b>82%</b>	<b>Mon 17-07-24</b>	<b>Mon 17-11-20</b>											
1316	<b>Fundament P1L</b>	<b>82%</b>	<b>Mon 17-09-25</b>	<b>Mon 17-11-20</b>											
1317	Wykop	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28											
1318	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-29	Thu 17-10-05											
1319	Chudy beton	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06											
1320	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Sat 17-10-07	Thu 17-10-12											
1321	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Fri 17-10-13	Sat 17-10-14											
1322	rozdeskowanie	100%	Thu 17-10-19	Fri 17-10-20											
1323	Izolacja P1	50%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01											
1324	Zasyпка P1	0%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20											
1325	<b>Fundament P1P</b>	<b>82%</b>	<b>Mon 17-09-25</b>	<b>Mon 17-11-20</b>											
1326	Wykop	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28											
1327	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-29	Thu 17-10-05											
1328	Chudy beton	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06											
1329	Zbrojenie fundamentu P1	100%	Sat 17-10-21	Thu 17-10-26											
1330	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-10-28											
1331	rozdeskowanie	100%	Thu 17-11-02	Fri 17-11-03											
1332	Izolacja P1	50%	Wed 17-11-15	Wed 17-11-15											
1333	Zasyпка P1	0%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20											
1334	<b>Fundament P2 L</b>	<b>81%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Mon 17-10-16</b>											
1335	Wykop	100%	Mon 17-09-04	Thu 17-09-07											
1336	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-08	Thu 17-09-14											
1337	Chudy beton	100%	Fri 17-09-15	Fri 17-09-15											
1338	Zbrojenie fundamentu P2 L	100%	Sat 17-09-16	Thu 17-09-21											
1339	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Fri 17-09-22	Sat 17-09-23											
1340	rozdeskowanie	100%	Thu 17-09-28	Thu 17-09-28											

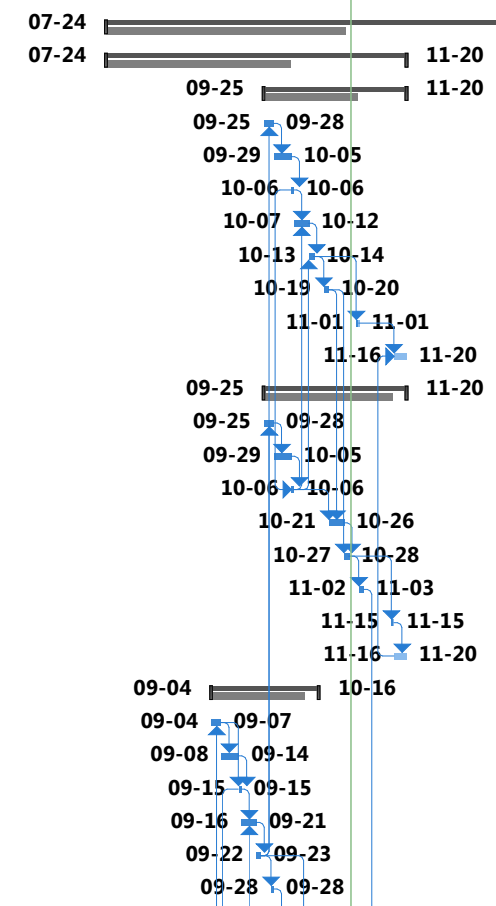

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	





Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1370	<b>Fundament P4 L</b>	<b>82%</b>	<b>Mon 17-07-24</b>	<b>Sat 17-08-26</b>										
1371	Wykop	100%	Mon 17-07-24	Thu 17-07-27										
1372	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-07-28	Thu 17-08-03										
1373	Chudy beton	100%	Fri 17-08-04	Fri 17-08-04										
1374	Zbrojenie fundamentu	100%	Sat 17-08-05	Thu 17-08-10										
1375	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-08-11	Sat 17-08-12										
1376	rozdeskowanie	100%	Thu 17-08-17	Fri 17-08-18										
1377	Izolacja	50%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22										
1378	Zasyпка	0%	Wed 17-08-23	Sat 17-08-26										
1379	<b>Fundament P4 P</b>	<b>81%</b>	<b>Mon 17-07-24</b>	<b>Mon 17-09-04</b>										
1380	Wykop	100%	Mon 17-07-24	Thu 17-07-27										
1381	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-07-28	Thu 17-08-03										
1382	Chudy beton	100%	Fri 17-08-04	Fri 17-08-04										
1383	Zbrojenie funadmentu	100%	Fri 17-08-11	Wed 17-08-16										
1384	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Sat 17-08-19	Mon 17-08-21										
1385	rozdeskowanie	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-08-25										
1386	Izolacja	50%	Wed 17-08-30	Wed 17-08-30										
1387	Zasyпка	0%	Thu 17-08-31	Mon 17-09-04										
1388	<b>Korpusy filary</b>	<b>51%</b>	<b>Sat 17-08-26</b>	<b>Thu 18-04-19</b>										
1389	<b>Korpus podpor P1L</b>	<b>61%</b>	<b>Sat 17-11-04</b>	<b>Mon 18-03-19</b>										
1390	Zbrojenie podpory	100%	Sat 17-11-04	Wed 17-11-08										
1391	Deskowanie podpory	100%	Mon 17-11-06	Sat 17-11-18										
1392	Betonowanie	100%	Mon 17-11-20	Mon 17-11-20										
1393	Rozdeskowanie podpory	0%	Mon 17-11-27	Tue 17-11-28										
1394	Izolacja podpory	0%	Thu 17-12-07	Thu 17-12-07										
1395	Ciosy podłozyskowe	0%	Fri 17-12-08	Sat 17-12-09										
1396	<b>Podparcie belki</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 17-12-13</b>	<b>Mon 18-03-19</b>										
1397	Deskowanie poprzeczncy etap 1	0%	Wed 17-12-13	Thu 18-03-15										
1398	Zbrojenie poprzeczncy etap 1	0%	Fri 18-03-16	Sat 18-03-17										

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
1399	Betonowanie poprzeczniczy	0%	Mon 18-03-19	Mon 18-03-19												
1400	<b>Korpus podpor P1 P</b>	<b>65%</b>	<b>Mon 17-10-30</b>	<b>Mon 18-04-02</b>					10-30							
1401	Zbrojenie podpory	100%	Sat 17-11-25	Sat 17-12-02						11-25	12-02					
1402	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-11-29	Tue 17-12-12						11-29	12-12					
1403	Betonowanie	100%	Wed 17-12-13	Wed 17-12-13							12-13	12-13				
1404	Rozdeskowanie podpory	0%	Sat 18-03-17	Mon 18-03-19										03-17		
1405	Izolacja podpory	0%	Fri 18-03-30	Fri 18-03-30										03-30		
1406	Ciosy podłozyskowe	0%	Sat 18-03-31	Mon 18-04-02										03-31		
1407	<b>Podparcie belki</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 17-10-30</b>	<b>Sat 17-11-04</b>					10-30		11-04					
1408	Deskowanie poprzeczniczy etap 1	0%	Mon 17-10-30	Wed 17-11-01					10-30		11-01					
1409	Zbrojenie poprzeczniczy etap 1	0%	Thu 17-11-02	Fri 17-11-03						11-02	11-03					
1410	Betonowanie poprzeczniczy	0%	Sat 17-11-04	Sat 17-11-04						11-04	11-04					
1411	<b>Filary P2 L</b>	<b>68%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Wed 17-11-08</b>					09-14			11-08				
1412	Zbrojenie filary	100%	Fri 17-09-29	Thu 17-10-05						09-29	10-05					
1413	<b>P2 L1</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Wed 17-09-27</b>					09-14		09-27					
1414	Deskowanie podpory	100%	Thu 17-09-14	Mon 17-09-18					09-14		09-18					
1415	Betonowanie	100%	Tue 17-09-19	Tue 17-09-19						09-19	09-19					
1416	Rozdeskowanie podpory	100%	Tue 17-09-26	Wed 17-09-27						09-26	09-27					
1417	<b>P2 L2</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-09-28</b>	<b>Wed 17-10-11</b>					09-28		10-11					
1418	Deskowanie podpory	100%	Thu 17-09-28	Mon 17-10-02					09-28		10-02					
1419	Betonowanie	100%	Tue 17-10-03	Tue 17-10-03						10-03	10-03					
1420	Rozdeskowanie podpory	100%	Tue 17-10-10	Wed 17-10-11						10-10	10-11					
1421	<b>P2 L3</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-10-12</b>	<b>Wed 17-10-25</b>						10-12		10-25				
1422	Deskowanie podpory	100%	Thu 17-10-12	Mon 17-10-16						10-12	10-16					
1423	Betonowanie	100%	Tue 17-10-17	Tue 17-10-17						10-17	10-17					
1424	Rozdeskowanie podpory	100%	Tue 17-10-24	Wed 17-10-25						10-24	10-25					
1425	Izolacja podpory	0%	Fri 17-11-03	Fri 17-11-03						11-03	11-03					
1426	Zasyпка podpory	0%	Sat 17-11-04	Wed 17-11-08						11-04	11-08					
1427	<b>Oczep P2L</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 17-10-26</b>	<b>Fri 17-11-03</b>						10-26		11-03				

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	




Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1457	<b>P3 L2</b>	100%	Wed 17-10-11	Tue 17-10-24				10-11	10-24						
1458	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-10-11	Sat 17-10-14				10-11	10-14						
1459	Betonowanie	100%	Mon 17-10-16	Mon 17-10-16				10-16	10-16						
1460	Rozdeskowanie podpory	100%	Mon 17-10-23	Tue 17-10-24				10-23	10-24						
1461	<b>P3 L3</b>	100%	Mon 17-10-16	Sat 17-10-28				10-16	10-28						
1462	Deskowanie podpory	100%	Mon 17-10-16	Thu 17-10-19				10-16	10-19						
1463	Betonowanie	100%	Fri 17-10-20	Fri 17-10-20				10-20	10-20						
1464	Rozdeskowanie podpory	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-10-28				10-27	10-28						
1465	Izolacja podpory	0%	Tue 17-11-07	Tue 17-11-07				11-07	11-07						
1466	Zasyпка podpory	0%	Wed 17-11-08	Sat 17-11-11				11-08	11-11						
1467	<b>Oczep P3L</b>	29%	Mon 17-10-30	Wed 17-11-08				10-30	11-08						
1468	Deskowanie oczepu	50%	Mon 17-10-30	Thu 17-11-02				10-30	11-02						
1469	Zbrojenie oczepu	20%	Fri 17-11-03	Mon 17-11-06				11-03	11-06						
1470	Beton oczepu	0%	Tue 17-11-07	Wed 17-11-08				11-07	11-08						
1471	<b>Filary P3 P</b>	51%	Fri 17-10-06	Thu 18-04-19				10-06							
1472	Zbrojenie podpory	100%	Fri 17-10-06	Thu 17-10-12				10-06	10-12						
1473	<b>P3 P4</b>	71%	Wed 17-11-29	Tue 17-12-12						11-29	12-12				
1474	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-11-29	Sat 17-12-02						11-29	12-02				
1475	Betonowanie	100%	Mon 17-12-04	Mon 17-12-04						12-04	12-04				
1476	Rozdeskowanie podpory	0%	Mon 17-12-11	Tue 17-12-12						12-11	12-12				
1477	<b>P3 P5</b>	71%	Wed 17-12-13	Mon 18-03-26						12-13					
1478	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-12-13	Fri 18-03-16						12-13					03
1479	Betonowanie	100%	Sat 18-03-17	Sat 18-03-17											03-17
1480	Rozdeskowanie podpory	0%	Sat 18-03-24	Mon 18-03-26											03-24
1481	<b>P3 P6</b>	71%	Tue 18-03-27	Mon 18-04-09											03-27
1482	Deskowanie podpory	100%	Tue 18-03-27	Fri 18-03-30											03-27
1483	Betonowanie	100%	Sat 18-03-31	Sat 18-03-31											03-31
1484	Rozdeskowanie podpory	0%	Sat 18-04-07	Mon 18-04-09											04-07
1485	Izolacja podpory	0%	Tue 18-04-10	Tue 18-04-10											04-10

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Październik.mpp											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
1486	Zasyпка podpory	0%	Wed 18-04-11	Sat 18-04-14										04-1		
1487	<b>Oczep P3P</b>	0%	<b>Tue 18-04-10</b>	<b>Thu 18-04-19</b>										04-10		
1488	Deskowanie oczepu	0%	Tue 18-04-10	Fri 18-04-13										04-1		
1489	Zbrojenie oczepu	0%	Sat 18-04-14	Tue 18-04-17										04-1		
1490	Beton oczepu	0%	Wed 18-04-18	Thu 18-04-19										04-		
1491	<b>Korpus podpor P4L</b>	70%	<b>Sat 17-08-26</b>	<b>Mon 18-03-19</b>										0		
1492	Zbrojenie podpory	100%	Sat 17-08-26	Fri 17-09-01												
1493	Deskowanie podpory	100%	Sat 17-09-02	Fri 17-09-15												
1494	Betonowanie	100%	Sat 17-09-16	Sat 17-09-16												
1495	Rozdeskowanie podpory	100%	Tue 17-09-26	Wed 17-09-27												
1496	Izolacja podpory	0%	Wed 17-10-04	Wed 17-10-04												
1497	Ciosy podłożyskowe	0%	Thu 17-10-05	Fri 17-10-06												
1498	<b>Podparcie belki</b>	0%	<b>Wed 17-12-13</b>	<b>Mon 18-03-19</b>										0		
1499	Deskowanie poprzecznicę etap 1	0%	Wed 17-12-13	Thu 18-03-15												
1500	Zbrojenie poprzecznicę etap 1	0%	Fri 18-03-16	Sat 18-03-17												
1501	Betonowanie poprzecznicę	0%	Mon 18-03-19	Mon 18-03-19												
1502	<b>Korpus podpor P4 P</b>	14%	<b>Thu 17-09-28</b>	<b>Sat 17-11-04</b>												
1503	Zbrojenie podpory	70%	Thu 17-09-28	Wed 17-10-04												
1504	Deskowanie podpory	0%	Sat 17-09-30	Fri 17-10-13												
1505	Betonowanie	0%	Sat 17-10-14	Sat 17-10-14												
1506	Rozdeskowanie podpory	0%	Tue 17-10-24	Wed 17-10-25												
1507	Izolacja podpory	0%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01												
1508	Ciosy podłożyskowe	0%	Thu 17-10-26	Fri 17-10-27												
1509	<b>Podparcie belki</b>	0%	<b>Mon 17-10-30</b>	<b>Sat 17-11-04</b>												
1513	<b>Montaż łożysk</b>	0%	<b>Sat 17-10-28</b>	<b>Tue 17-12-12</b>												
1516	<b>Ścianka zapleczna</b>	0%	<b>Tue 18-07-17</b>	<b>Mon 18-07-30</b>												
1519	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	<b>Thu 18-08-09</b>	<b>Thu 18-09-27</b>												
1530	<b>Ustrójce nośne</b>	0%	<b>Thu 18-04-05</b>	<b>Thu 18-11-01</b>										04-05		
1587	<b>Mur oporowy P1</b>	4%	<b>Fri 17-12-08</b>	<b>Wed 18-08-08</b>												

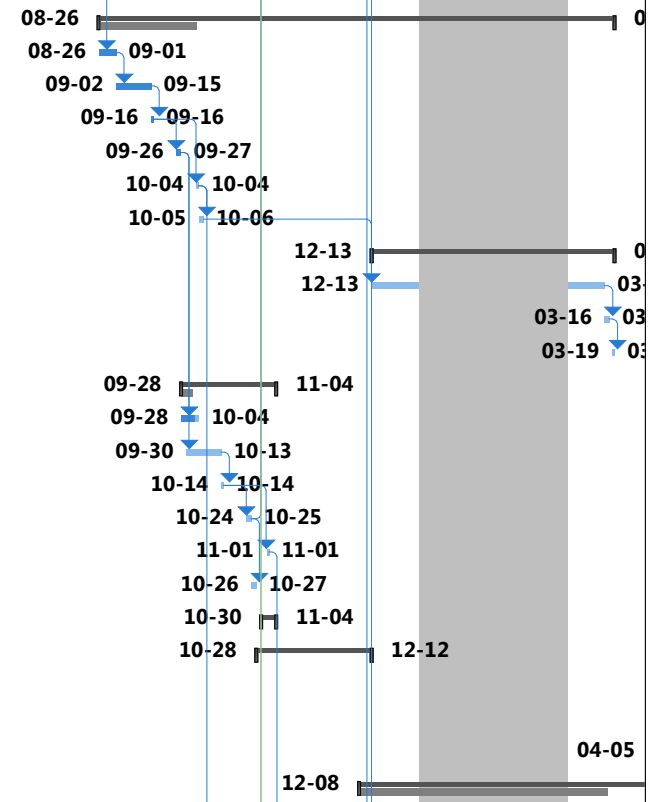

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			Mar	
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Mar		
1588	<b>Mur P1 L</b>	5%	Fri 17-12-08	Wed 18-08-08						12-08						
1589	Fundament muru P1 L	100%	Fri 17-12-08	Tue 17-12-12						12-08	12-12					
1590	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	0%	Wed 17-12-13	Wed 18-08-08						12-13						
1591	Lico muru 0,4 H	0%	Wed 17-12-13	Wed 18-05-09						12-13						
1592	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Tue 18-07-17	Wed 18-08-08												
1593	<b>Mur P1 P</b>	5%	Sat 18-03-31	Wed 18-08-08										03-31		
1594	Fundament muru P1 L	100%	Sat 18-03-31	Wed 18-04-04										03-31		
1595	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	0%	Thu 18-04-05	Wed 18-08-08										04-05		
1596	Lico muru 0,4 H	0%	Thu 18-04-05	Fri 18-06-01										04-05		
1597	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Tue 18-07-17	Wed 18-08-08										04-05		
1598	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Thu 18-04-05	Fri 18-06-01										04-05		
1599	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Tue 18-07-17	Wed 18-08-08										04-05		
1600	<b>Mur oporowy P4</b>	4%	Thu 17-10-05	Fri 18-08-31					10-05							
1601	<b>Mur P4 L</b>	5%	Thu 17-10-05	Fri 18-08-31					10-05							
1602	Fundament muru P2 L	100%	Thu 17-10-05	Mon 17-10-09					10-05	10-09						
1603	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	0%	Tue 17-10-10	Fri 18-08-31					10-10							
1606	<b>Mur P4 P</b>	5%	Thu 17-11-02	Fri 18-08-31					11-02							
1607	Fundament muru	100%	Thu 17-11-02	Mon 17-11-06					11-02	11-06						
1608	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 P</b>	0%	Tue 17-11-07	Fri 18-08-31					11-07							
1611	Zasyпка korpusu 0-0,4 H	0%	Tue 17-11-07	Tue 18-04-03					11-07							
1612	Zasyпка korpusu 0,4H - 1 H	0%	Thu 18-08-09	Fri 18-08-31												
1613	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Sat 18-09-01	Fri 18-11-09												
1616	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie PZ6	0%	Fri 18-10-05	Fri 18-12-28												
1617	<b>WE 7.1</b>	9%	Mon 17-08-14	Fri 18-12-07					08-14							
1657	<b>Korpusy</b>	73%	Mon 17-08-14	Thu 17-11-23					08-14				11-23			
1658	<b>Korpus podpor P1L</b>	82%	Mon 17-08-14	Thu 17-09-21					08-14	09-21						
1659	Zbrojenie podpory P1	100%	Mon 17-08-14	Fri 17-08-18					08-14	08-18						
1660	Deskowanie podpory P1	100%	Fri 17-08-25	Sat 17-09-02					08-25	09-02						
1661	Betonowanie P1	100%	Mon 17-09-04	Mon 17-09-04					09-04	09-04						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Październik.mpp											
					Jun	2017 Qtr 3		Aug	Sep	2017 Qtr 4		Nov	Dec	2018 Qtr 1		
						Jul				Oct			Jan	Feb	Mar	
1662	Rozdeskowanie podpory P1	0%	Wed 17-09-13	Thu 17-09-14					09-13	09-14						
1663	Izolacja podpory P1	0%	Thu 17-09-21	Thu 17-09-21					09-21	09-21						
1664	<b>Korpus podpor P1P</b>	<b>94%</b>	<b>Wed 17-09-13</b>	<b>Thu 17-10-12</b>					09-13	10-12						
1665	Zbrojenie podpory P1	100%	Wed 17-09-13	Mon 17-09-18					09-13	09-18						
1666	Deskowanie podpory P1	100%	Fri 17-09-15	Sat 17-09-23					09-15	09-23						
1667	Betonowanie P1	100%	Mon 17-09-25	Mon 17-09-25					09-25	09-25						
1668	Rozdeskowanie podpory P1	100%	Wed 17-10-04	Thu 17-10-05					10-04	10-05						
1669	Izolacja podpory P1	0%	Thu 17-10-12	Thu 17-10-12					10-12	10-12						
1670	<b>Korpus podpor P2 L</b>	<b>21%</b>	<b>Tue 17-09-19</b>	<b>Thu 17-11-02</b>					09-19	11-02						
1671	Zbrojenie podpory P2	70%	Tue 17-09-19	Sat 17-09-23					09-19	09-23						
1672	Deskowanie podpory P2	0%	Fri 17-10-06	Sat 17-10-14					10-06	10-14						
1673	Betonowanie P2	0%	Mon 17-10-16	Mon 17-10-16					10-16	10-16						
1674	Rozdeskowanie podpory P2	0%	Wed 17-10-25	Thu 17-10-26					10-25	10-26						
1675	Izolacja podpory P2	0%	Thu 17-11-02	Thu 17-11-02					11-02	11-02						
1676	<b>Korpus podpor P2 P</b>	<b>94%</b>	<b>Wed 17-10-25</b>	<b>Thu 17-11-23</b>					10-25	11-23						
1677	Zbrojenie podpory P2	100%	Wed 17-10-25	Mon 17-10-30					10-25	10-30						
1678	Deskowanie podpory P2	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-11-04					10-27	11-04						
1679	Betonowanie P2	100%	Mon 17-11-06	Mon 17-11-06					11-06	11-06						
1680	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Wed 17-11-15	Thu 17-11-16					11-15	11-16						
1681	Izolacja podpory P2	0%	Thu 17-11-23	Thu 17-11-23					11-23	11-23						
1682	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-05-12</b>	<b>Thu 18-08-30</b>												
1693	<b>Ustrój nośny</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-10-27</b>	<b>Fri 18-05-04</b>					10-27							
1718	<b>izolacja ustroju</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-05-02</b>	<b>Tue 18-05-22</b>												
1721	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-05-02</b>	<b>Thu 18-08-30</b>												
1724	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-05-03</b>	<b>Mon 18-05-21</b>												
1730	<b>Jezdnia</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-08-28</b>	<b>Thu 18-09-13</b>												
1735	<b>Mur oporowy P1</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-09-15</b>	<b>Fri 18-05-11</b>					09-15							
1748	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-05-12</b>	<b>Fri 18-08-24</b>												
1750	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 7.1	0%	Sat 18-08-25	Fri 18-12-07												

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1751	<b>Mur oporowy WE 7.1 _M7.2</b>	14%	Tue 17-07-25	Fri 18-12-07	07-25								
1752	Wymiana gruntu	100%	Tue 17-07-25	Thu 17-09-14	07-25			09-14					
1753	<b>Mur oporowy</b>	0%	Fri 17-09-29	Fri 18-12-07				09-29					
1758	<b>M 7.2</b>	22%	Tue 17-07-25	Mon 18-12-10	07-25								
1759	<b>Roboty przygotowawcze</b>	100%	Mon 17-07-31	Wed 17-09-20	07-31			09-20					
1764	Montaż mostu tymczasowego	100%	Mon 17-07-31	Wed 17-09-20	07-31			09-20					
1765	<b>Roboty fundamentowe</b>	82%	Tue 17-07-25	Fri 17-10-20	07-25				10-20				
1766	<b>Fundament P1L</b>	88%	Tue 17-07-25	Wed 17-09-20	07-25			09-20					
1767	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Tue 17-07-25	Fri 17-07-28	07-25			07-28					
1768	Wymiana gruntu	100%	Sat 17-07-29	Fri 17-08-04	07-29			08-04					
1769	Chudy beton	100%	Sat 17-08-05	Sat 17-08-05	08-05			08-05					
1770	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-14	08-07			08-14					
1771	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Tue 17-08-15	Fri 17-08-18	08-15			08-18					
1772	rozdeskowanie	100%	Wed 17-08-23	Thu 17-08-24	08-23			08-24					
1773	Izolacja P1	30%	Mon 17-08-28	Mon 17-08-28	08-28			08-28					
1774	Zasyпка P1	30%	Sat 17-09-16	Wed 17-09-20				09-16					
1775	<b>Fundament P1P</b>	88%	Tue 17-07-25	Wed 17-09-20	07-25				09-20				
1776	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Tue 17-07-25	Fri 17-07-28	07-25			07-28					
1777	Wymiana gruntu	100%	Tue 17-07-25	Mon 17-07-31	07-25			07-31					
1778	Chudy beton	100%	Sat 17-08-05	Sat 17-08-05	08-05			08-05					
1779	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-09-01				08-25					
1780	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Sat 17-09-02	Wed 17-09-06				09-02					
1781	rozdeskowanie	100%	Mon 17-09-11	Tue 17-09-12				09-11					
1782	Izolacja P1	30%	Fri 17-09-15	Fri 17-09-15				09-15					
1783	Zasyпка P1	30%	Sat 17-09-16	Wed 17-09-20				09-16					
1784	<b>Fundament F2 L</b>	71%	Sat 17-07-29	Wed 17-09-13	07-29				09-13				
1787	Chudy beton	100%	Sat 17-07-29	Sat 17-07-29	07-29			07-29					
1788	Zbrojenie funadmentu P2 L	100%	Fri 17-08-11	Fri 17-08-18				08-11					
1789	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Sat 17-08-19	Tue 17-08-22				08-19					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
1790	rozdeskowanie	100%	Sat 17-08-26	Sat 17-08-26			08-26	08-26								
1791	Izolacja P2 L	0%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08			09-08	09-08								
1792	Zasyпка P2 L	0%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-13			09-09	09-13								
1793	<b>Fundament F2 P</b>	<b>81%</b>	<b>Sat 17-07-29</b>	<b>Fri 17-09-29</b>		07-29		09-29								
1794	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Sat 17-07-29	Wed 17-08-02		07-29	08-02									
1795	Wymiana gruntu	100%	Thu 17-08-03	Wed 17-08-09		08-03	08-09									
1796	Chudy beton	100%	Thu 17-08-10	Thu 17-08-10		08-10	08-10									
1797	Zbrojenie funadmentu P2 L	100%	Mon 17-08-28	Mon 17-09-04			08-28	09-04								
1798	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Tue 17-09-05	Thu 17-09-07			09-05	09-07								
1799	rozdeskowanie	100%	Tue 17-09-12	Tue 17-09-12			09-12	09-12								
1800	Izolacja P2 L	0%	Mon 17-09-25	Mon 17-09-25			09-25	09-25								
1801	Zasyпка P2 L	0%	Tue 17-09-26	Fri 17-09-29			09-26	09-29								
1802	<b>Fundament P3 L</b>	<b>80%</b>	<b>Mon 17-08-28</b>	<b>Fri 17-10-06</b>		08-28		10-06								
1803	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Mon 17-08-28	Thu 17-08-31		08-28	08-31									
1804	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-01	Thu 17-09-07			09-01	09-07								
1805	Chudy beton	100%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08			09-08	09-08								
1806	Zbrojenie fundamentu	100%	Thu 17-09-14	Thu 17-09-21			09-14	09-21								
1807	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-09-22	Fri 17-09-22			09-22	09-22								
1808	rozdeskowanie	100%	Wed 17-09-27	Wed 17-09-27			09-27	09-27								
1809	Izolacja	0%	Mon 17-10-02	Mon 17-10-02			10-02	10-02								
1810	Zasyпка	0%	Tue 17-10-03	Fri 17-10-06			10-03	10-06								
1811	<b>Fundament P3 P</b>	<b>79%</b>	<b>Fri 17-09-01</b>	<b>Fri 17-10-20</b>		09-01		10-20								
1812	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-05		09-01	09-05									
1813	Wymiana gruntu	100%	Wed 17-09-06	Tue 17-09-12			09-06	09-12								
1814	Chudy beton	100%	Wed 17-09-13	Wed 17-09-13			09-13	09-13								
1815	Zbrojenie funadmentu	100%	Thu 17-09-28	Thu 17-10-05			09-28	10-05								
1816	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06			10-06	10-06								
1817	Izolacja	0%	Mon 17-10-16	Mon 17-10-16			10-16	10-16								
1818	Zasyпка	0%	Tue 17-10-17	Fri 17-10-20			10-17	10-20								

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	









Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
2171	Deskowanie + Beton fundamentu P1	0%	Sat 17-10-14	Wed 17-10-18				10-14	10-18							
2172	Rozdeskowanie	0%	Mon 17-10-23	Mon 17-10-23				10-23	10-23							
2173	Izolacja P1	0%	Sat 17-11-04	Mon 17-11-06				11-04	11-06							
2174	Zasyпка P1	0%	Tue 17-11-07	Fri 17-11-10				11-07	11-10							
2175	<b>Fundament P1 P</b>	<b>24%</b>	<b>Tue 17-08-08</b>	<b>Mon 17-11-20</b>												
2176	Wykop	100%	Tue 17-08-08	Fri 17-08-11				08-08	08-11							
2177	Wymiana pod fundamentem	50%	Wed 17-10-04	Sat 17-10-07				10-04	10-07							
2178	Chudy beton	0%	Mon 17-10-09	Mon 17-10-09				10-09	10-09							
2179	Zbrojenie funadmentu P1	0%	Sat 17-10-21	Thu 17-10-26				10-21	10-26							
2180	Deskowanie + Beton fundamentu P1	0%	Tue 17-10-24	Fri 17-10-27				10-24	10-27							
2181	Rozdeskowanie	0%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01				11-01	11-01							
2182	Izolacja P1	0%	Tue 17-11-14	Wed 17-11-15				11-14	11-15							
2183	Zasyпка P1	0%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20				11-16	11-20							
2184	<b>Fundament P2 L</b>	<b>24%</b>	<b>Sat 17-08-12</b>	<b>Fri 17-11-17</b>												
2185	Wykop	100%	Sat 17-08-12	Wed 17-08-16				08-12	08-16							
2186	Wymiana pod fundamentem	50%	Thu 17-08-17	Mon 17-08-21				08-17	08-21							
2187	Chudy beton	0%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22				08-22	08-22							
2188	Zbrojenie funadmentu P2 L	0%	Mon 17-10-16	Fri 17-10-20				10-16	10-20							
2189	Deskowanie + Beton fundamentu P2 L	0%	Sat 17-10-21	Wed 17-10-25				10-21	10-25							
2190	Rozdeskowanie	0%	Mon 17-10-30	Mon 17-10-30				10-30	10-30							
2191	Izolacja P2 L	0%	Sat 17-11-11	Mon 17-11-13				11-11	11-13							
2192	Zasyпка P2 L	0%	Tue 17-11-14	Fri 17-11-17				11-14	11-17							
2193	<b>Fundament P2 P</b>	<b>24%</b>	<b>Sat 17-08-12</b>	<b>Tue 17-11-28</b>												
2194	Wykop	100%	Sat 17-08-12	Wed 17-08-16				08-12	08-16							
2195	Wymiana pod fundamentem	50%	Thu 17-08-17	Mon 17-08-21				08-17	08-21							
2196	Chudy beton	0%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22				08-22	08-22							
2197	Zbrojenie funadmentu P2	0%	Fri 17-10-27	Wed 17-11-01				10-27	11-01							
2198	Deskowanie +Beton fundamentu P2	0%	Wed 17-11-01	Sat 17-11-04				11-01	11-04							
2199	Rozdeskowanie	0%	Thu 17-11-09	Thu 17-11-09				11-09	11-09							

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
2200	Izolacja P2	0%	Wed 17-11-22	Thu 17-11-23						11-22	11-23					
2201	Zasyпка P2	0%	Fri 17-11-24	Tue 17-11-28						11-24	11-28					
2202	<b>Korpusy</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 17-11-11</b>	<b>Thu 18-04-05</b>						11-11						
2227	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-07-14</b>	<b>Mon 18-08-06</b>												
2238	<b>Ustrój nośny</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-03-30</b>	<b>Tue 18-07-17</b>										03-30		
2263	izolacja ustroju	0%	Sat 18-07-14	Fri 18-08-24												
2266	Montaż dylatacji	0%	Sat 18-07-14	Wed 18-09-19												
2269	Kapy chodnikowe	0%	Mon 18-07-16	Tue 18-07-31												
2276	Jezdnia	0%	Sat 18-09-15	Thu 18-09-20												
2281	Mur oporowy P1	0%	Fri 18-03-30	Thu 18-07-12										03-30		
2294	Mur oporowy P2	0%	Fri 18-03-30	Thu 18-07-12										03-30		
2307	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-07-13</b>	<b>Thu 18-09-20</b>												
2309	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie PZ 9	0%	Thu 18-09-20	Thu 18-12-13												
2310	<b>WE 10</b>	<b>35%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Fri 18-11-30</b>	07-19											
2350	<b>Korpusy</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Thu 17-08-31</b>	07-19			08-31								
2375	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-06-04</b>	<b>Thu 18-07-19</b>												
2386	<b>Ustrój nośny</b>	<b>57%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Thu 18-05-10</b>				08-25								
2387	<b>Ustroj jezdni L</b>	<b>35%</b>	<b>Fri 17-09-29</b>	<b>Tue 17-12-12</b>				09-29			12-12					
2388	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój L</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-09-29</b>	<b>Mon 17-10-16</b>				09-29		10-16						
2389	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-10-10				09-29		10-10						
2390	Ułożenie płyt drogowych	100%	Wed 17-10-11	Mon 17-10-16				10-11		10-16						
2391	<b>Deskowanie ustroju nośnego L</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 17-10-17</b>	<b>Wed 17-11-01</b>				10-17		11-01						
2392	Ustawienie wież rusztowania	0%	Tue 17-10-17	Wed 17-10-25				10-17		10-25						
2393	Deskowanie ustroju nośnego	0%	Thu 17-10-26	Wed 17-11-01				10-26		11-01						
2394	<b>Zbrojenie ustroju nośnego L</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 17-11-02</b>	<b>Mon 17-11-13</b>				11-02		11-13						
2395	Zbrojenie	0%	Thu 17-11-02	Mon 17-11-13				11-02		11-13						
2396	<b>Betonowanie ustroju nośnego L</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 17-11-14</b>	<b>Tue 17-12-12</b>				11-14		12-12						
2397	Ustrój	0%	Tue 17-11-14	Tue 17-11-14				11-14		11-14						
2398	Rozdeskowanie	0%	Sat 17-12-09	Tue 17-12-12						12-09		12-12				

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
2399	<b>Ustrój jezdni P</b>	79%	Fri 17-08-25	Thu 18-05-10	08-25 [Progress bar]											
2400	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój P</b>	100%	Fri 17-08-25	Sat 17-10-21	08-25 [Completed bar]											
2401	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-09-05	08-25 [Completed bar]											
2402	Ułożenie płyt drogowych	100%	Tue 17-10-17	Sat 17-10-21	10-17 [Completed bar]											
2403	<b>Deskowanie ustroju nośnego P</b>	100%	Thu 18-03-15	Fri 18-03-30	03-15 [Completed bar]											
2404	Ustawienie wież rusztowania	100%	Thu 18-03-15	Fri 18-03-23	03-15 [Completed bar]											
2405	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Sat 18-03-24	Fri 18-03-30	03-24 [Completed bar]											
2406	<b>Zbrojenie ustroju nośnego P</b>	50%	Sat 18-03-31	Wed 18-04-11	03-31 [Progress bar]											
2407	Zbrojenie	50%	Sat 18-03-31	Wed 18-04-11	03-31 [Progress bar]											
2408	<b>Betonowanie ustroju nośnego P</b>	0%	Thu 18-04-12	Thu 18-05-10	04-12 [Progress bar]											
2409	Ustrój	0%	Thu 18-04-12	Thu 18-04-12	04-12 [Progress bar]											
2410	Rozdeskowanie	0%	Tue 18-05-08	Thu 18-05-10	05-08 [Progress bar]											
2411	<b>izolacja ustroju</b>	0%	Tue 18-05-08	Wed 18-09-26	05-08 [Progress bar]											
2414	<b>Montaż dylatacji</b>	0%	Tue 18-05-08	Mon 18-10-01	05-08 [Progress bar]											
2417	<b>Kapy chodnikowe</b>	0%	Wed 18-05-09	Thu 18-05-31	05-09 [Progress bar]											
2424	<b>Jezdni</b>	0%	Thu 18-09-27	Tue 18-10-02	09-27 [Progress bar]											
2429	<b>Mur oporowy P1</b>	43%	Fri 17-08-25	Sat 18-06-02	08-25 [Progress bar]											
2430	<b>Mur P1 L</b>	63%	Fri 17-08-25	Sat 18-06-02	08-25 [Progress bar]											
2431	Fundament muru P1 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29	08-25 [Completed bar]											
2432	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	60%	Fri 17-09-01	Sat 18-06-02	09-01 [Progress bar]											
2433	Lico muru 0,4 H	90%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17	09-01 [Progress bar]											
2434	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02	05-11 [Progress bar]											
2435	<b>Mur P1 P</b>	63%	Fri 17-08-25	Sat 18-06-02	08-25 [Progress bar]											
2436	Fundament muru P1 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29	08-25 [Completed bar]											
2437	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	60%	Wed 17-08-30	Sat 18-06-02	08-30 [Progress bar]											
2438	Lico muru 0,4 H	90%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14	08-30 [Progress bar]											
2439	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02	05-11 [Progress bar]											
2440	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17	09-01 [Progress bar]											
2441	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02	05-11 [Progress bar]											

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
2442	<b>Mur oporowy P2</b>	43%	Fri 17-08-25	Tue 18-06-26	08-25											
2443	<b>Mur P2 L</b>	63%	Fri 17-08-25	Tue 18-06-26	08-25											
2444	Fundament muru P2 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29	08-25 08-29											
2445	<b>Mur oporowy + zasypka P2 L</b>	60%	Wed 17-08-30	Tue 18-06-26	08-30											
2446	Lico muru 0,4 H	90%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14	08-30 10-14											
2447	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26												
2448	<b>Mur P2 P</b>	63%	Fri 17-08-25	Tue 18-06-26	08-25											
2449	Fundament muru P2 P	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29	08-25 08-29											
2450	<b>Mur oporowy + zasypka P2 P</b>	60%	Wed 17-08-30	Tue 18-06-26	08-30											
2451	Lico muru 0,4 H	90%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14	08-30 10-14											
2452	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26												
2453	Zasypka korpusu P2 0-0,4 H	0%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14	08-30 10-14											
2454	Zasypka korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26												
2455	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Wed 18-06-27	Tue 18-10-09												
2457	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 10	0%	Wed 18-10-10	Fri 18-11-30												
2458	<b>WD 11</b>	14%	Sat 17-07-22	Tue 18-09-11	07-22											
2476	<b>Korpusy</b>	100%	Sat 17-07-22	Wed 17-09-06	07-22 09-06											
2477	<b>Korpus podpor P1</b>	100%	Sat 17-07-22	Wed 17-08-09	07-22 08-09											
2484	<b>Korpus podpor P2</b>	100%	Fri 17-07-28	Wed 17-09-06	07-28 09-06											
2491	Montaż łożysk	100%	Sat 17-09-09	Sat 17-09-09	09-09 09-09											
2492	<b>Ścianka zapleczna</b>	0%	Wed 17-12-13	Sat 18-03-17	12-13											
2495	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	Fri 17-12-08	Mon 18-04-23	12-08											
2506	<b>Ustrój nośny</b>	77%	Tue 17-08-29	Thu 17-11-30	08-29 11-30											
2507	<b>Ustroj</b>	77%	Tue 17-08-29	Thu 17-11-30	08-29 11-30											
2508	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój</b>	100%	Tue 17-08-29	Fri 17-09-08	08-29 09-08											
2509	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Tue 17-08-29	Sat 17-09-02	08-29 09-02											
2510	Ułożenie płyt drogowych	100%	Mon 17-09-04	Fri 17-09-08	09-04 09-08											
2511	<b>Deskowanie ustroju nośnego</b>	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-27	09-09 09-27											
2512	Ustawienie wież rusztowania	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-20	09-09 09-20											

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
2513	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Thu 17-09-21	Wed 17-09-27				09-21	09-27							
2514	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-09-28</b>	<b>Mon 17-10-09</b>				09-28	10-09							
2515	Zbrojenie	100%	Thu 17-09-28	Mon 17-10-09				09-28	10-09							
2516	Montaż osłonek wpychanie kabli	100%	Thu 17-10-05	Sat 17-10-07				10-05	10-07							
2517	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	<b>25%</b>	<b>Tue 17-10-10</b>	<b>Sat 17-11-11</b>				10-10	11-11							
2518	Ustrój	100%	Tue 17-10-10	Tue 17-10-10				10-10	10-10							
2519	sprężenie	100%	Sat 17-11-04	Sat 17-11-04				11-04	11-04							
2520	Rozdeskowanie	0%	Mon 17-11-06	Sat 17-11-11				11-06	11-11							
2521	<b>Dobetonowanie dźwigara</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-11-24</b>	<b>Thu 17-11-30</b>				11-24	11-30							
2525	<b>izolacja ustroju</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-03-17</b>	<b>Thu 18-06-21</b>									03-17			
2528	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-03-19</b>	<b>Sat 18-03-24</b>									03-19			
2531	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-03-19</b>	<b>Fri 18-04-27</b>									03-19			
2538	<b>Jezdnia</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-06-22</b>	<b>Wed 18-08-08</b>												
2544	<b>Mur oporowy P1</b>	<b>4%</b>	<b>Sat 17-09-09</b>	<b>Sat 17-12-09</b>				09-09	12-09							
2545	<b>Mur P1 L</b>	<b>6%</b>	<b>Sat 17-09-09</b>	<b>Sat 17-12-09</b>				09-09	12-09							
2546	Fundament muru P1 L	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-13				09-09	09-13							
2547	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Sat 17-12-09</b>				09-14	12-09							
2548	Lico muru 0,4 H	0%	Thu 17-09-14	Mon 17-10-30				09-14	10-30							
2549	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Fri 17-11-17	Sat 17-12-09					11-17	12-09						
2550	<b>Mur P1 P</b>	<b>6%</b>	<b>Sat 17-09-09</b>	<b>Sat 17-12-09</b>				09-09	12-09							
2551	Fundament muru P1 L	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-13				09-09	09-13							
2552	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Sat 17-12-09</b>				09-14	12-09							
2553	Lico muru 0,4 H	0%	Thu 17-09-14	Mon 17-10-30				09-14	10-30							
2554	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Fri 17-11-17	Sat 17-12-09					11-17	12-09						
2555	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Thu 17-09-14	Mon 17-10-30				09-14	10-30							
2556	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Fri 17-11-17	Sat 17-12-09					11-17	12-09						
2557	<b>Mur oporowy P2</b>	<b>4%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Mon 18-04-02</b>				09-14	18-04-02							
2558	<b>Mur P2 L</b>	<b>6%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Mon 18-04-02</b>				09-14	18-04-02							
2559	Fundament muru P2 L	100%	Thu 17-09-14	Mon 17-09-18				09-14	09-18							

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



Październik.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
2597	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17												
2599	<b>Przepust 10+246</b>	0%	Tue 17-09-19	Sat 18-11-17												
2611	<b>Przepust 10+346</b>	29%	Thu 17-09-14	Sat 18-11-17												
2616	<b>Konstrukcja przepustu</b>	100%	Thu 17-09-14	Thu 17-11-09												
2618	Zasyпка przepustu	100%	Thu 17-09-14	Fri 17-09-29												
2619	Wykonanie płyty zespalającej	100%	Sat 17-09-30	Wed 17-10-11												
2620	Wykonanie wlotu wylotu przepustu	100%	Thu 17-10-12	Thu 17-11-09												
2621	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17												
2623	<b>Przepust 10+546</b>	25%	Fri 17-09-08	Sat 18-11-17												
2628	<b>Konstrukcja przepustu</b>	100%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24												
2633	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17												
2634	schody , umocnienia, pomosty dla zwierząt	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17												
2635	<b>Obiekty odcinek B</b>	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17												
2636	<b>PZ 12</b>	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17												
2758	<b>WE 13</b>	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17												

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	
