

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3				2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
1	Budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i	100%	Thu 17-02-02	Sat 19-03-16												
2	PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY	100%	Thu 17-02-02	Thu 17-02-02												
3	1. ROBOTY PODSTAWOWE SEKCJA 1 i 2	85%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03											
4	NADZÓR PRZYRODNICZY - STAN ZEROWY + PŁOTKI DLA PŁAZÓW	100%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03											
5	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	70%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03											
6	2. ROBOTY DROGOWE SEKCJA 1 i 2	40%	Mon 17-07-03	Sat 19-03-16	07-03											
7	SEKCJA 1 - KM 0+000 DO 8+400	81%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03											
8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	81%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03											
9	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	75%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03											
10	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	100%	Mon 17-07-03	Tue 17-10-03	07-03					10-03						
11	ROBOTY	38%	Mon 17-07-03	Sat 19-03-16	07-03											
12	A1 0+000 - 3+075	40%	Mon 17-07-03	Tue 18-12-11	07-03											
13	WYKOPY (180 000 m3)	75%	Mon 17-07-03	Fri 17-11-10	07-03						11-10					
14	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	70%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03											
15	WZMOCNIENIE PODŁOŻA (9000 m2)	100%	Fri 17-07-07	Mon 17-07-31	07-07						07-31					
16	NASYPY (280 000 m3)	45%	Sat 17-07-08	Thu 18-05-17	07-08											
17	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	45%	Sat 17-07-08	Thu 18-09-20	07-08											
18	GWN 0,5 m (30 000 m3)	15%	Mon 17-07-24	Wed 18-05-30	07-24											
19	WYKONANIE ZBIORNIKÓW 3 szt.	20%	Tue 17-07-18	Fri 18-09-14	07-18											
20	Podbudowa z betonu C 5/6 (63 000 m2)	10%	Tue 17-08-01	Mon 18-06-04	08-01											
21	Podbudowa c 8/10 (61 000 m2)	0%	Thu 17-08-10	Sat 18-06-09	08-10											
22	Drogi serwisowe i technologiczne	80%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-21	07-03											
23	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (30 000 m2)	0%	Mon 18-07-16	Wed 18-08-01												
24	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (30 000 m2)	0%	Tue 18-10-30	Thu 18-11-15												
25	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Wed 18-07-25	Tue 18-12-11												
26	A2 3+075 - 3+975	44%	Thu 17-07-06	Fri 18-11-30	07-06											
27	NASYPY (35 000 m3)	85%	Thu 17-07-06	Tue 17-10-17	07-06						10-17					
28	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Thu 17-07-06	Sat 18-09-29	07-06											
29	GWN 0,5 m (13 200 m3)	0%	Thu 17-10-05	Thu 17-10-26						10-05		10-26				

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
30	WYKONANIE ZBIORNIKÓW 2 szt.	10%	Fri 17-09-01	Thu 18-05-31			09-01									
31	Podbudowa z betonu C 5/6 (20 500 m2)	0%	Mon 17-10-23	Thu 18-07-05					10-23							
32	Podbudowa c 8/10 (20 000 m2)	0%	Tue 17-10-31	Fri 18-07-20					10-31							
33	Drogi serwisowe i technologiczne	80%	Tue 17-07-18	Wed 18-05-30	07-18											
34	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (9 500 m2)	0%	Thu 18-08-02	Mon 18-08-06												
35	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (9 500 m2)	0%	Thu 18-10-25	Mon 18-10-29												
36	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Tue 18-08-07	Fri 18-11-30												
37	A3 3+975 - 5+050	43%	Mon 17-07-17	Wed 18-11-14	07-17											
38	WYKOPY (35 000 m3)	100%	Mon 17-07-17	Sat 17-09-30	07-17				09-30							
39	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Tue 17-07-25	Sat 18-10-06	07-25											
40	NASYPY (35 000 m3)	95%	Wed 17-07-19	Fri 18-04-20	07-19											
41	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Tue 17-07-25	Sat 18-10-06	07-25											
42	GWN 0,5 m (5 000 m3)	40%	Wed 17-08-23	Fri 18-03-16			08-23							03		
43	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 2	5%	Thu 17-07-20	Sat 18-08-04	07-20											
44	Podbudowa z betonu C 5/6 (23 000 m2)	0%	Wed 17-10-25	Mon 18-06-25					10-25							
45	Podbudowa c 8/10 (22 500 m2)	0%	Thu 17-11-02	Thu 18-07-12					11-02							
46	Drogi serwisowe i technologiczne	0%	Tue 17-07-25	Sat 18-09-29	07-25											
47	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (11 100 m2)	0%	Tue 18-08-07	Mon 18-08-13												
48	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (11 100 m2)	0%	Thu 18-10-18	Wed 18-10-24												
49	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Tue 18-08-14	Wed 18-11-14												
50	A4 5+050 - 6+150	70%	Fri 17-07-14	Thu 18-11-29	07-14											
51	WYKOPY (10 000 m3)	100%	Fri 17-07-14	Wed 17-08-23	07-14		08-23									
52	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	100%	Fri 17-07-14	Mon 18-07-30	07-14											
53	NASYPY (2 000 m3)	100%	Mon 17-07-17	Mon 17-09-11	07-17		09-11									
54	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	95%	Mon 17-07-17	Wed 18-08-01	07-17											
55	GWN 0,5 m (500 m3)	90%	Sat 17-07-22	Mon 17-09-11	07-22		09-11									
56	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 1	0%	Fri 17-09-22	Fri 18-08-10			09-22									
57	Podbudowa z betonu C 5/6 (8 000 m2)	70%	Tue 17-08-01	Mon 17-10-02	08-01				10-02							
58	Podbudowa c 8/10 (7 500m2)	50%	Thu 17-10-12	Thu 17-10-19					10-12		10-19					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3	2017 Qtr 4	2018 Qtr 1								
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
59	Drogi serwisowe i technologiczne	85%	Wed 17-07-26	Fri 18-09-28	07-26											
60	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (11 000 m2)	0%	Tue 18-08-14	Sat 18-08-18												
61	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (11 000 m2)	0%	Fri 18-10-12	Wed 18-10-17												
62	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Mon 18-08-20	Thu 18-11-29												
63	A5 6+150 - 8+400	34%	Mon 17-07-10	Mon 18-11-26	07-10											
64	WYKOPY (30 000 m3)	70%	Mon 17-07-10	Mon 18-04-30	07-10											
65	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	95%	Mon 17-07-10	Wed 18-07-25	07-10											
66	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	85%	Mon 17-07-10	Mon 18-04-02	07-10											
67	NASYP PRZECIĄŻAJĄCY 6+250 - 6+400 STR. L	0%	Wed 17-10-11	Tue 17-11-14	10-11 11-14											
68	ROZBIÓRKA NASYPU PRZECIĄŻAJĄCEGO 6+250 - 6+400 STR. L	0%	Fri 18-03-16	Thu 18-04-19	03-16											
69	NASYPY POZOSTAŁE (35 000 m3)	65%	Mon 17-07-10	Wed 18-05-30	07-10											
70	GWN 0,5 m (23 000 m3)	25%	Fri 17-07-28	Mon 18-06-11	07-28											
71	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 2	0%	Sat 17-07-15	Sat 18-09-29	07-15											
72	Podbudowa z betonu C 5/6 (46 500 m2)	0%	Thu 17-10-12	Fri 18-06-15	10-12											
73	Podbudowa c 8/10 (46 000 m2)	0%	Mon 17-10-30	Tue 18-07-03	10-30											
74	Drogi serwisowe i technologiczne	0%	Fri 17-07-28	Mon 18-09-03	07-28											
75	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (22 500 m2)	0%	Tue 18-08-14	Fri 18-08-24												
76	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (22 500 m2)	0%	Mon 18-10-01	Thu 18-10-11												
77	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Sat 18-08-25	Mon 18-11-26												
78	PODBUDOWY	0%	Fri 17-09-01	Fri 18-11-16	09-01											
79	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30	0%	Fri 17-09-01	Fri 18-11-16	09-01											
85	Podbudowa z betonu asfaltowego	0%	Mon 17-09-04	Sat 18-10-13	09-04											
91	NAWIERZCHNIE	0%	Tue 18-05-29	Tue 18-11-20												
92	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	0%	Wed 18-06-13	Mon 18-11-12												
98	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego	0%	Tue 18-05-29	Tue 18-11-20												
106	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA	0%	Wed 18-08-08	Wed 18-11-14												
108	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Mon 18-08-13	Sat 19-03-16												
114	SEKCJA 2 - KM 8+400 DO 12+221,45	35%	Mon 17-07-03	Sat 19-03-16	07-03											
115	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	80%	Mon 17-07-03	Wed 18-06-13	07-03											

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
116	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	80%	Mon 17-07-03	Wed 18-06-13	07-03								
117	ROBOTY ZIEMNE	36%	Mon 17-07-03	Tue 18-09-18	07-03								
118	WYKOPY TRASA GŁÓWNA, DD, DG, DP, DW	61%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03								
119	WYKOPY 8+400 DO 9+700 - (195 000 m3)	40%	Mon 17-07-03	Fri 18-04-27	07-03								
120	WYKOPY 9+700 DO 10+800 - (150 000 m3)	40%	Mon 17-07-03	Fri 18-04-27	07-03								
121	WYKOPY 10+800 DO 12+221 - (10 000 m3)	90%	Mon 17-07-03	Wed 18-06-13	07-03								
122	WYKOPY DD,DW,DP	65%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03								
123	NASYPY TRASA GŁÓWNA, DD, DG, DP, DW	22%	Mon 17-07-03	Tue 18-09-18	07-03								
124	NASYPY 8+400 DO 9+250 - (135 000 m3)	20%	Mon 17-07-03	Thu 18-08-16	07-03								
125	NASYPY 10+200 DO 10+800 - (99 600 m3)	30%	Mon 17-07-03	Fri 18-04-27	07-03								
126	NASYPY DD,DW,DP	25%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03								
127	GWN	14%	Sat 18-03-24	Tue 18-09-18									03-24
128	TRASA GŁÓWNA (26 950 m3)	30%	Sat 18-03-24	Wed 18-08-22									03-24
129	DD, DG, DP, DW (3 300 m3)	0%	Sat 18-03-24	Tue 18-09-18									03-24
130	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	22%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03								
131	TRASA GŁÓWNA, DD, DG, DP, DW	40%	Fri 17-07-21	Mon 18-05-28	07-21								
132	WYKONANIE ZBIORNIKÓW	10%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03								
133	PODBUDOWY	12%	Mon 17-07-03	Sat 18-11-24	07-03								
134	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,5	0%	Sat 18-03-31	Fri 18-06-08									03-31
137	Warstwa mrozoochronna	0%	Mon 17-09-04	Fri 18-05-25			09-04						
140	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30	0%	Mon 18-04-16	Tue 18-10-02									04-1
144	Podbudowa z betonu asfaltowego	0%	Wed 18-08-01	Sat 18-11-24									
148	Podbudowa z betonu C 5/6	35%	Tue 17-07-04	Fri 18-08-24	07-04								
149	TRASA GŁÓWNA S61 (79 900 m2)	35%	Tue 17-07-04	Fri 18-08-24	07-04								
150	Podbudowa c 8/10	30%	Mon 17-07-03	Sat 17-08-26	07-03			08-26					
151	TRASA GŁÓWNA S61 (77 300 m2)	30%	Mon 17-07-03	Sat 17-08-26	07-03			08-26					
152	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia - warstwa poślizgowa	0%	Mon 17-09-04	Wed 17-09-20			09-04		09-20				
154	NAWIERZCHNIE	0%	Fri 18-08-03	Wed 18-12-05									
168	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Mon 17-08-28	Sat 19-03-16			08-28						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		2017 Qtr 3				2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
			Start	Finish	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
176	SEKCJA 2 - ODCINEK B - 12+221,45 DO 12+830 , P1 i RONDO R4 (DK8)	99%	Mon 17-07-03	Fri 17-09-22	07-03				09-22					
177	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	100%	Mon 17-07-03	Tue 17-09-05	07-03				09-05					
198	PODBUDOWY	100%	Mon 17-07-03	Fri 17-09-22	07-03				09-22					
199	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30	100%	Mon 17-07-03	Fri 17-08-04	07-03			08-04						
202	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,5 (1	100%	Wed 17-07-05	Fri 17-09-22	07-05				09-22					
206	Podbudowa z betonu asfaltowego	100%	Wed 17-08-16	Thu 17-08-31			08-16	08-31						
208	Podbudowa z betonu C 5/6 (5 000,00 m2)	100%	Mon 17-07-03	Mon 17-07-31	07-03			07-31						
210	Ułożenie geowłókniny - warstwa poślizgowa (13 595,00 m2)	100%	Tue 17-07-11	Thu 17-07-27	07-11			07-27						
212	NAWIERZCHNIE	100%	Wed 17-07-12	Sat 17-09-16	07-12				09-16					
222	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	96%	Mon 17-07-03	Thu 17-09-21	07-03				09-21					
223	oznakowanie poziome	100%	Fri 17-09-15	Thu 17-09-21				09-15	09-21					
224	oznakowanie pionowe	100%	Wed 17-08-30	Thu 17-09-21				08-30	09-21					
225	bariery energochłonne	100%	Tue 17-09-05	Thu 17-09-21				09-05	09-21					
226	ekrany akustyczne	100%	Wed 17-08-09	Thu 17-09-21				08-09	09-21					
227	Elementy brukarki - krawężniki, obrzeża, kostka kamienna i betonowa łącznik,	85%	Mon 17-07-03	Mon 17-09-11	07-03				09-11					
228	Korytka Monolityczna - S61, łącznik	100%	Wed 17-08-16	Wed 17-08-23				08-16	08-23					
229	Zahumusowanie S61, łącznik, DK8, DD i DG	100%	Thu 17-07-20	Thu 17-09-21	07-20				09-21					
230	Ogrodzenie	100%	Thu 17-08-24	Thu 17-09-21				08-24	09-21					
231	PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE RUCHU NA DK8	100%	Wed 17-09-20	Wed 17-09-20				09-20	09-20					
232	Uzyskanie decyzji o PnU dla odcinka B	85%	Thu 17-09-21	Tue 17-10-17				09-21	10-17					
233	WYMAGANIA FORMALNE	52%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03									
234	Okres na przeglądy Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie inne	50%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03									
235	zatwierdzenie recept	100%	Tue 17-07-25	Thu 17-08-17	07-25			08-17						
239	zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy	46%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03									
240	zatwierdzenie Programu Budowy - Rewizja	100%	Wed 17-07-26	Wed 17-08-02	07-26			08-02						
241	projekt organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i	45%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03									
242	Kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w	69%	Wed 17-07-12	Fri 18-12-14	07-12									
243	odcinek próbny - nawierzchnia betonowa C 35/45 - S61 odc. B str. Lewa km	100%	Wed 17-07-12	Sat 17-07-22	07-12			07-22						
244	odcinek próbny - podbudowa C50/30	100%	Thu 17-07-20	Thu 17-07-20	07-20			07-20						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
245	odcinek próbny - nawierzchnia żwirowa C90/3	100%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08				09-08	09-08							
246	odcinek próbny - podbudowa z betonu asfaltowego	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-07		08-07	08-07									
247	odcinek próbny - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	100%	Tue 17-08-08	Wed 17-08-09		08-08	08-09									
248	odcinek próbny - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-20				09-09	09-20							
249	odcinek próbny - warstwa ściernalna SMA	100%	Thu 17-09-07	Thu 17-09-07				09-07	09-07							
250	odbiory techniczne przez IK Odcinek B	85%	Mon 17-09-11	Thu 17-09-21				09-11	09-21							
251	odbiór techniczne przez IK Odcinek A	0%	Thu 18-11-29	Fri 18-12-14												
252	CZAS NA UKOŃCZENIE ODCINEK B	99%	Thu 17-02-02	Thu 17-09-21					09-21							
253	CZAS NA UKOŃCZENIE ODCINEK A	39%	Thu 17-02-02	Fri 18-12-14												
254	BRANŻE - ODCINEK B	98%	Mon 17-07-03	Thu 17-12-14	07-03							12-14				
255	KOLIZJE ENERGETYCZNE	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-12-14	07-03							12-14				
257	ZASILANIE	97%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03							10-05				
258	Znaki aktywne (km 12+480-12+580 OŚ)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31								
259	KSZR 6 (km 13+080 L (DD15A, WE-13))	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31								
260	Zasilanie SO 4 (rondo DK8)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31								
261	Zasilanie ZK (znaki na wyspach Z1, Z2, Z3) (rondo DK8)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31								
262	Rozruch próbny, pomiary (zestaw prądowłóczy BX)	80%	Fri 17-09-01	Thu 17-10-05				09-01	10-05							
263	OŚWIETLENIE	95%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03							10-05				
264	12+400-13+100 P	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31								
265	0+600-1+100 P	95%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31								
266	Rozruch próbny, pomiary (zestaw prądowłóczy BX)	85%	Fri 17-09-01	Thu 17-10-05				09-01	10-05							
267	KANAŁ TELETECHNICZNY	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03							10-05				
271	KANALIZACJA DESZCZOWA	92%	Thu 17-08-24	Sat 17-09-09				08-24	09-09							
272	wpust z wylotem do rowu	100%	Thu 17-08-24	Thu 17-08-31				08-24	08-31							
273	kanały 55, 56, 57	88%	Fri 17-08-25	Sat 17-09-09				08-25	09-09							
274	BRANŻE - ODCINEK A	20%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03											
275	KOLIZJE ENERGETYCZNE WN 110 kV	11%	Mon 17-07-03	Sun 17-12-31	07-03							12-31				
277	0 WN - przystosowanie do 3 st (km 5+800-6+400 S61)	0%	Mon 17-07-03	Tue 17-10-31	07-03							10-31				
278	1 WN (km 9+000 S61)	0%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03				09-19	11-03							

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart								
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3	2017 Qtr 4	2018 Qtr 1	Mar				
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
279	2 WN (km 9+100 S61)	0%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03			09-19		11-03				
280	3 WN (km 10+200 S61)	65%	Fri 17-08-25	Mon 17-09-18		08-25	09-18						
281	4 WN (km 11+900 S61)	70%	Tue 17-08-01	Thu 17-08-24		08-01	08-24						
282	Przekazanie na stan PGE	0%	Sat 17-11-04	Sun 17-12-31				11-04			12-31		
283	KOLIZJE ENERGETYCZNE nn 0.4 kV	100%	Mon 17-07-03	Sun 17-12-31	07-03						12-31		
291	KOLIZJE ENERGETYCZNE SN 20 kV	100%	Mon 17-07-03	Sun 17-12-31	07-03						12-31		
327	ZASILANIE	17%	Mon 17-09-04	Wed 18-08-29		09-04							
328	KSZR 1 (węzeł "Lotnisko")	0%	Mon 17-09-04	Fri 17-09-08		09-04	09-08						
329	KSZR 2 (DG 102026 B (WD-2))	0%	Sat 17-09-30	Mon 17-10-16			09-30	10-16					
330	Zasilanie ST 2 (km 3+570-4+580 L (WE-3 WD-4))	90%	Mon 17-09-18	Wed 17-11-08			09-18	11-08					
331	KSZR 3 (km 4+580 L)	0%	Thu 17-11-30	Thu 18-03-15					11-30				03-15
332	Zasilanie SO 2 (wzdłuż DW (WD-4))	0%	Thu 18-06-07	Sat 18-06-30									
333	Zasilanie SO 1 (wzdłuż DW (WD-4))	0%	Thu 18-06-07	Sat 18-06-30									
334	KSZR 4 (km 6+250 P)	0%	Mon 18-07-02	Tue 18-07-17									
335	Zasilanie SO 3 (6+250-6+700 P (WD-5))	0%	Mon 18-07-02	Wed 18-07-25									
336	Zasilanie P1 (km 7+320-7+800 P)	0%	Mon 17-09-04	Sat 17-10-07		09-04	10-07						
337	KSZR 5 (km 7+780 P)	0%	Wed 18-04-11	Wed 18-04-18									04-18
338	Zasilanie stacji ZK-M (km 7+780-8+200 P)	0%	Wed 18-05-16	Thu 18-05-31									
339	Podpisanie umowy z PGE na świadczenie usług dystrybucyjnych (1 m-c od	0%	Thu 18-07-26	Wed 18-08-29									
340	OŚWIETLENIE	0%	Sat 18-03-17	Fri 18-12-14								03-17	
354	KANAŁ TELETECHNICZNY	2%	Mon 17-09-04	Sat 18-12-08		09-04							
363	KANALIZACJA DESZCZOWA	21%	Mon 17-07-03	Sat 18-11-10	07-03								
390	DRENAŻ	7%	Mon 17-09-04	Mon 18-10-08		09-04							
405	STACJA METEO	0%	Fri 18-06-01	Fri 18-06-29									
407	Obiekty odcinek A	14%	Tue 17-07-18	Thu 19-01-03	07-18								
408	WE 1	31%	Wed 17-07-19	Fri 18-11-16	07-19								
477	Korpusy filary	100%	Wed 17-07-19	Mon 17-10-02	07-19			10-02					
485	Korpus podpor P1 P	100%	Wed 17-07-19	Tue 17-08-08	07-19		08-08						
508	Filary P2 P	100%	Mon 17-07-24	Mon 17-09-11	07-24		09-11						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
524	Filary P3 L	100%	Thu 17-07-20	Mon 17-09-04	07-20			09-04					
540	Filary P3 P	100%	Thu 17-07-27	Mon 17-10-02	07-27				10-02				
556	Korpus podpor P4L	100%	Mon 17-07-31	Sat 17-09-02	07-31			09-02					
563	Korpus podpor P4 P	100%	Mon 17-08-28	Sat 17-09-30		08-28		09-30					
570	Montaż łożysk	100%	Tue 17-09-05	Wed 17-10-04		09-05		10-04					
573	Ścianka zapleczna	0%	Wed 18-03-28	Tue 18-04-10									03-28
576	Płyty przejściowe	0%	Thu 18-04-19	Fri 18-06-15									04-15
587	Ustrójje nośne	39%	Tue 17-09-05	Thu 18-03-15		09-05							03-15
588	Ustroj jezdni L	39%	Tue 17-09-05	Thu 18-03-15		09-05							03-15
589	Przygotowanie podłoża pod ustrój	100%	Tue 17-09-05	Thu 17-09-21		09-05		09-21					
592	Deskowanie ustroju nośnego	50%	Fri 17-09-22	Fri 17-10-20		09-22		10-20					
593	Ustawienie wież rusztowania	50%	Fri 17-09-22	Mon 17-10-09		09-22		10-09					
594	Deskowanie ustroju nośnego	50%	Tue 17-10-10	Fri 17-10-20		10-10		10-20					
595	Zbrojenie ustroju nośnego	0%	Sat 17-10-21	Fri 17-11-03		10-21		11-03					
598	Betonowanie ustroju nośnego	0%	Sat 17-11-04	Sat 17-12-02		11-04		12-02					
602	Dobetonowanie dźwigara	0%	Sat 17-12-09	Thu 18-03-15				12-09					03-15
606	izolacja ustroju	0%	Thu 18-03-29	Fri 18-05-11									03-29
609	Montaż dylatacji	0%	Fri 18-03-16	Tue 18-03-20									03-16
612	Kapy chodnikowe	0%	Fri 18-03-30	Fri 18-05-04									03-30
619	Jezdnia	0%	Fri 18-08-10	Mon 18-08-27									
625	Ustroj jezdni P	21%	Tue 17-10-03	Tue 18-03-27		10-03							
626	Przygotowanie podłoża pod ustrój	100%	Tue 17-10-03	Thu 17-10-19		10-03		10-19					
627	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Tue 17-10-03	Fri 17-10-13		10-03		10-13					
628	Ułożenie płyt drogowych	100%	Sat 17-10-14	Thu 17-10-19		10-14		10-19					
629	Deskowanie ustroju nośnego	0%	Sat 17-10-21	Sat 17-11-18		10-21		11-18					
632	Zbrojenie ustroju nośnego	0%	Mon 17-11-20	Sat 17-12-02				11-20		12-02			
635	Betonowanie ustroju nośnego	0%	Mon 17-12-04	Thu 18-01-04				12-04		01-04			
639	Dobetonowanie dźwigara	0%	Wed 18-03-21	Tue 18-03-27									03-21
643	izolacja ustroju	0%	Tue 18-04-10	Wed 18-05-09									04-10

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
646	Montaż dylatacji	0%	Wed 18-03-28	Sat 18-03-31										03-28		
649	Kapy chodnikowe	0%	Thu 18-03-15	Mon 18-05-07										03-15		
656	Jezdnia	0%	Thu 18-08-16	Mon 18-08-27												
662	Mur oporowy P1	58%	Wed 17-08-02	Wed 18-04-18	08-02											
663	Mur P1 L	56%	Wed 17-08-02	Fri 18-04-06	08-02											
664	Fundament muru P1 L	100%	Wed 17-08-02	Sat 17-08-05	08-02		08-05									
665	Mur oporowy +zasyпка	53%	Mon 17-08-07	Fri 18-04-06	08-07											
666	Lico muru 0,4 H	80%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21	08-07			09-21								
667	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 18-03-15	Fri 18-04-06									03-15			
668	Mur P1 P	56%	Wed 17-08-02	Fri 18-04-06	08-02											
669	Fundament muru P1 L	100%	Wed 17-08-02	Sat 17-08-05	08-02		08-05									
670	Mur oporowy +zasyпка	53%	Mon 17-08-07	Fri 18-04-06	08-07											
671	Lico muru 0,4 H	80%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21	08-07			09-21								
672	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 18-03-15	Fri 18-04-06									03-15			
673	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	80%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21	08-07			09-21								
674	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Sat 18-04-07	Wed 18-04-18										04-07		
675	Mur oporowy P4	0%	Mon 17-09-25	Wed 18-05-23				09-25								
688	Roboty wykończeniowe	0%	Thu 18-05-24	Fri 18-09-07												
691	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 1	0%	Sat 18-09-08	Fri 18-11-16												
692	WD 1 A	0%	Mon 17-11-06	Thu 18-12-27					11-06							
811	WD 2	12%	Wed 17-07-26	Thu 18-07-19	07-26											
831	Korpusy	0%	Wed 17-07-26	Sat 17-08-26	07-26		08-26									
846	Montaż łożysk	100%	Thu 17-08-31	Thu 17-08-31			08-31	08-31								
847	Ścianka zapleczna	0%	Tue 17-12-12	Fri 18-03-16						12-12				03-16		
850	Płyty przejściowe	0%	Tue 17-12-05	Thu 18-04-19						12-05						
861	Ustrój nośny	73%	Thu 17-08-10	Tue 17-12-05	08-10						12-05					
862	Ustroj	73%	Thu 17-08-10	Tue 17-12-05	08-10						12-05					
863	Przygotowanie podłoża pod ustrój	100%	Thu 17-08-10	Wed 17-08-30	08-10		08-30									
866	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Thu 17-08-31	Thu 17-09-28			08-31	09-28								


Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
869	Zbrojenie ustroju nośnego	81%	Fri 17-09-29	Tue 17-10-10				09-29	10-10							
870	Zbrojenie	90%	Fri 17-09-29	Tue 17-10-10				09-29	10-10							
871	Montaż osłonek wpychanie kabli	50%	Sat 17-10-07	Tue 17-10-10				10-07	10-10							
872	Betonowanie ustroju nośnego	0%	Wed 17-10-11	Mon 17-11-13				10-11	11-13							
876	Dobetonowanie dzwigara	0%	Sat 17-11-25	Tue 17-12-05					11-25	12-05						
880	izolacja ustroju	0%	Fri 18-03-30	Tue 18-04-03										03-30		
883	Montaż dylatacji	0%	Sat 18-03-17	Fri 18-03-23										03-17		
886	Kapy chodnikowe	0%	Sat 18-03-31	Tue 18-05-08										03-31		
893	Jezdnia	0%	Wed 18-04-04	Thu 18-06-21										04-04		
899	Mur oporowy P1	6%	Sat 17-08-26	Wed 17-12-06				08-26	12-06							
900	Mur P1 L	8%	Mon 17-08-28	Wed 17-12-06				08-28	12-06							
901	Fundament muru P1 L	100%	Mon 17-08-28	Fri 17-09-01				08-28	09-01							
902	Mur oporowy +zasyпка	0%	Sat 17-09-02	Wed 17-12-06				09-02	12-06							
905	Mur P1 P	8%	Sat 17-08-26	Wed 17-12-06				08-26	12-06							
906	Fundament muru P1 L	100%	Sat 17-08-26	Thu 17-08-31				08-26	08-31							
907	Mur oporowy +zasyпка	0%	Fri 17-09-01	Wed 17-12-06				09-01	12-06							
910	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Thu 17-10-19	Mon 17-10-30				10-19	10-30							
911	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Tue 17-11-14	Wed 17-12-06				11-14	12-06							
912	Mur oporowy P2	5%	Sat 17-09-02	Thu 18-03-29				09-02	18-03-29							
913	Mur P2 L	8%	Sat 17-09-02	Thu 18-03-29				09-02	18-03-29							
914	Fundament muru P2 L	100%	Sat 17-09-02	Thu 17-09-07				09-02	09-07							
915	Mur oporowy + zasyпка P2 L	0%	Fri 17-09-08	Thu 18-03-29				09-08	18-03-29							
918	Mur P2 P	8%	Sat 17-09-02	Thu 18-03-29				09-02	18-03-29							
919	Fundament muru P2 P	100%	Sat 17-09-02	Thu 17-09-07				09-02	09-07							
920	Mur oporowy + zasyпка P2 P	0%	Fri 17-09-08	Thu 18-03-29				09-08	18-03-29							
923	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	0%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24				09-08	10-24							
924	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Thu 17-12-07	Thu 18-03-29					12-07	18-03-29						
925	Roboty wykończeniowe	0%	Fri 18-03-30	Sat 18-06-30										03-30		
926	Schody , umocnienie , zab. Antyk. Kap , nadbudowa murow oporowych	0%	Fri 18-03-30	Sat 18-06-30										03-30		

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	


Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
927	Probne obciążenie obiektu	0%	Wed 18-06-13	Thu 18-06-14										
928	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	0%	Fri 18-06-15	Thu 18-07-19										
929	WE 3	16%	Fri 17-07-21	Thu 18-12-13										
969	Korpusy	100%	Fri 17-07-21	Thu 17-10-19										
994	Płyty przejściowe	0%	Fri 18-05-18	Fri 18-07-06										
1005	Ustrój nośny	36%	Fri 17-09-01	Tue 18-04-24										
1006	Ustroj jezdni L	71%	Fri 17-09-01	Fri 17-12-01										
1007	Przygotowanie podłoża pod ustrój L	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-12										
1010	Deskowanie ustroju nośnego L	100%	Thu 17-10-12	Mon 17-10-23										
1013	Zbrojenie ustroju nośnego L	50%	Tue 17-10-24	Tue 17-10-31										
1014	Zbrojenie	50%	Tue 17-10-24	Tue 17-10-31										
1015	Betonowanie ustroju nośnego L	0%	Wed 17-11-01	Fri 17-12-01										
1018	Ustroj jezdni P	0%	Fri 17-10-13	Tue 18-04-24										
1030	izolacja ustroju	0%	Thu 18-04-19	Fri 18-10-19										
1036	Kapy chodnikowe	0%	Sat 18-04-21	Mon 18-05-28										
1043	Jezdnia	0%	Wed 18-10-17	Tue 18-10-23										
1048	Mur oporowy P1	4%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17										
1049	Mur P1 L	7%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17										
1051	Mur oporowy +zasyпка	7%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17										
1054	Mur P1 P	7%	Fri 17-10-20	Thu 18-05-17										
1056	Mur oporowy +zasyпка	7%	Fri 17-10-20	Thu 18-05-17										
1059	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Wed 17-12-06	Fri 18-04-20										
1060	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Wed 18-04-25	Thu 18-05-17										
1061	Mur oporowy P2	4%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09										
1062	Mur P2 L	7%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09										
1064	Mur oporowy + zasyпка P2 L	7%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09										
1067	Mur P2 P	7%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09										
1069	Mur oporowy + zasyпка P2 P	7%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09										
1072	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	0%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14										

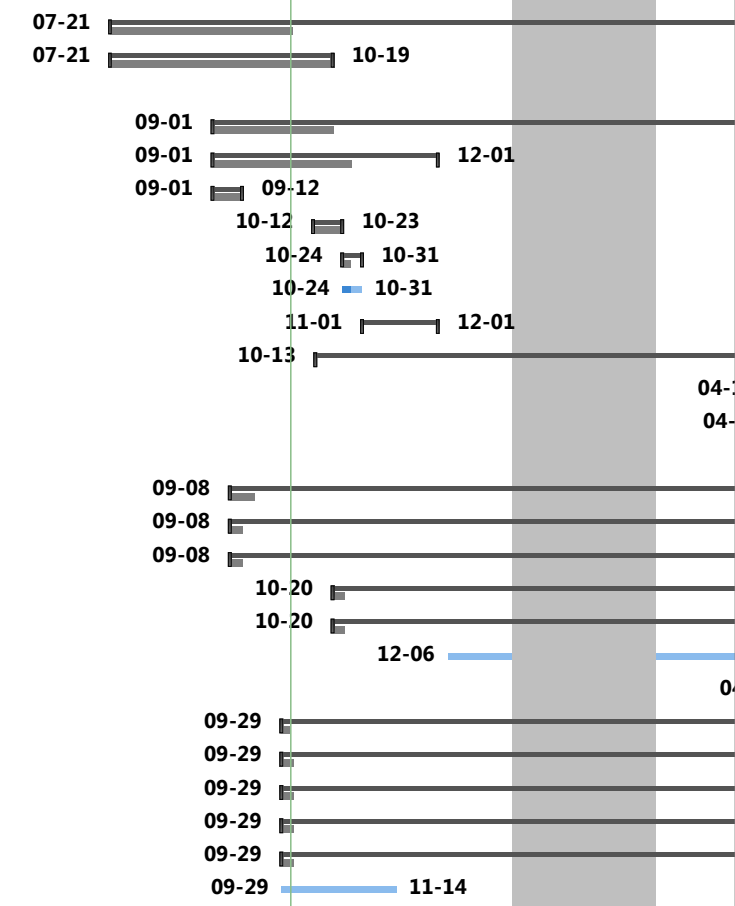

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1073	Zасыпка корпуса P2 0,4H - 1 H	0%	Fri 18-05-18	Sat 18-06-09										
1074	Roboty wykończeniowe	0%	Mon 18-06-11	Sat 18-09-22										
1076	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 3	0%	Tue 18-10-23	Thu 18-12-13										
1077	WD 4	13%	Fri 17-07-21	Fri 18-08-03										
1098	Korpusy	63%	Fri 17-07-21	Sat 18-03-17										
1099	Korpus podpor P1	100%	Fri 17-07-21	Fri 17-08-11										
1104	Izolacja podpory P1	100%	Thu 17-08-10	Fri 17-08-11										
1105	Ciosy podłozyskowe	100%	Fri 17-07-21	Sat 17-07-22										
1106	Korpus podpor P2	100%	Fri 17-07-21	Wed 17-08-09										
1109	Betonowanie P2	100%	Fri 17-07-21	Fri 17-07-21										
1110	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Mon 17-07-31	Tue 17-08-01										
1111	Izolacja podpory P2	100%	Tue 17-08-08	Wed 17-08-09										
1112	Ciosy podłozyskowe	100%	Wed 17-08-02	Thu 17-08-03										
1113	Montaż łożysk	100%	Sat 17-09-23	Wed 17-09-27										
1114	Ścianka zapleczna	0%	Fri 17-12-08	Sat 18-03-17										
1117	Płyty przejściowe	0%	Sat 18-03-17	Fri 18-05-04										
1128	Ustrój nośny	66%	Wed 17-08-02	Thu 17-12-07										
1129	Ustroj	66%	Wed 17-08-02	Thu 17-12-07										
1130	Przygotowanie podłoża pod montaż konstrukcji stalowej	100%	Wed 17-08-02	Sat 17-09-02										
1131	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Wed 17-08-02	Mon 17-08-07										
1132	Przygotowanie fundamentów podpór	100%	Tue 17-08-08	Wed 17-08-16										
1133	Montaż podpór tymczasowych	100%	Wed 17-08-23	Sat 17-09-02										
1134	Montaż konstrukcji stalowej	100%	Mon 17-09-04	Mon 17-10-02										
1135	Montaż konstrukcji stalowej	100%	Mon 17-09-04	Wed 17-09-20										
1136	Scalanie konstrukcji stalowej	100%	Thu 17-09-21	Mon 17-10-02										
1137	Deskowanie ustroju nośnego	50%	Tue 17-10-03	Thu 17-10-19										
1138	Deskowanie ustroju nośnego	50%	Tue 17-10-03	Thu 17-10-19										
1139	Zbrojenie ustroju nośnego	0%	Fri 17-10-20	Tue 17-10-31										
1141	Betonowanie ustroju nośnego	0%	Wed 17-11-01	Thu 17-12-07										

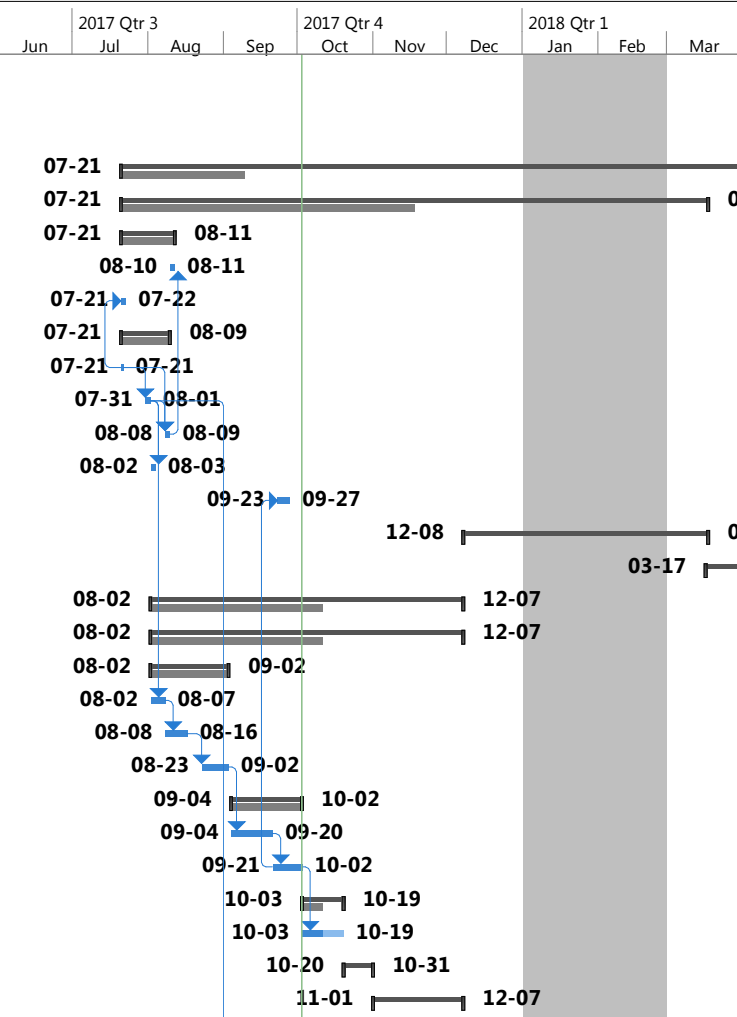

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
1144	izolacja ustroju	0%	Mon 17-11-27	Mon 18-06-11												
1147	Montaż dylatacji	0%	Mon 18-03-19	Sat 18-03-24												
1150	Kapy chodnikowe	0%	Tue 17-11-28	Fri 18-03-30												
1157	Jezdnia	0%	Tue 18-06-19	Sat 18-06-30												
1163	Mur oporowy P1	4%	Mon 17-08-28	Mon 18-03-19												
1164	Mur P1 L	6%	Mon 17-08-28	Mon 18-03-19												
1165	Fundament muru P1 L	100%	Mon 17-08-28	Thu 17-08-31												
1166	Mur oporowy +zasyпка	0%	Fri 17-09-01	Mon 18-03-19												
1169	Mur P1 P	6%	Mon 17-08-28	Mon 18-03-19												
1170	Fundament muru P1 P	100%	Mon 17-08-28	Thu 17-08-31												
1171	Mur oporowy +zasyпка	0%	Fri 17-09-01	Mon 18-03-19												
1174	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17												
1175	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Mon 17-11-27	Mon 18-03-19												
1176	Mur oporowy P2	4%	Fri 17-09-01	Wed 18-04-11												
1177	Mur P2 L	6%	Fri 17-09-01	Wed 18-04-11												
1178	Fundament muru P2 L	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-05												
1179	Mur oporowy + zasyпка P2 L	0%	Wed 17-09-06	Wed 18-04-11												
1182	Mur P2 P	6%	Fri 17-09-01	Wed 18-04-11												
1183	Fundament muru P2 P	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-05												
1184	Mur oporowy + zasyпка P2 P	0%	Wed 17-09-06	Wed 18-04-11												
1187	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	0%	Wed 17-09-06	Sat 17-10-21												
1188	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Tue 18-03-20	Wed 18-04-11												
1189	Roboty wykończeniowe	0%	Thu 18-04-12	Sat 18-06-30												
1192	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WD 4	0%	Sat 18-06-30	Fri 18-08-03												
1193	WD 5	8%	Mon 17-07-24	Mon 18-08-06												
1214	Korpusy	100%	Mon 17-07-24	Wed 17-09-27												
1229	Montaż łożysk	0%	Tue 17-10-10	Tue 17-10-10												
1230	Ścianka zaplecza	0%	Wed 18-04-11	Mon 18-04-16												
1233	Płyty przejściowe	0%	Mon 18-04-16	Sat 18-06-02												

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
1244	Ustrój nośny	0%	Thu 17-09-21	Wed 18-04-04				09-21								
1263	izolacja ustroju	0%	Fri 18-04-13	Sat 18-05-05											04-13	
1266	Montaż dylatacji	0%	Tue 18-04-17	Mon 18-04-23											04-17	
1269	Kapy chodnikowe	0%	Sat 18-04-14	Tue 18-05-15											04-14	
1276	Jezdnia	0%	Fri 18-06-22	Mon 18-07-02												
1282	Mur oporowy P1	0%	Tue 17-09-26	Tue 18-04-17				09-26								
1295	Mur oporowy P2	0%	Thu 17-09-21	Thu 18-05-10				09-21								
1308	Roboty wykończeniowe	0%	Fri 18-05-11	Thu 18-07-19												
1311	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WD 5	0%	Tue 18-05-29	Mon 18-08-06												
1312	PZ 6	17%	Mon 17-07-24	Fri 18-12-28	07-24											
1315	Roboty fundamentowe	79%	Mon 17-07-24	Mon 17-11-20	07-24											
1316	Fundament P1L	80%	Mon 17-09-25	Mon 17-11-20				09-25								
1317	Wykop	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28				09-25	09-28							
1318	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-29	Thu 17-10-05				09-29	10-05							
1319	Chudy beton	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06				10-06	10-06							
1320	Zbrojenie fundamentu P1	100%	Sat 17-10-07	Thu 17-10-12				10-07	10-12							
1321	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Fri 17-10-13	Sat 17-10-14				10-13	10-14							
1322	rozdeskowanie	100%	Thu 17-10-19	Fri 17-10-20				10-19	10-20							
1323	Izolacja P1	0%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01				11-01	11-01							
1324	Zasyпка P1	0%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20				11-16	11-20							
1325	Fundament P1P	80%	Mon 17-09-25	Mon 17-11-20				09-25								
1326	Wykop	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28				09-25	09-28							
1327	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-29	Thu 17-10-05				09-29	10-05							
1328	Chudy beton	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06				10-06	10-06							
1329	Zbrojenie fundamentu P1	100%	Sat 17-10-21	Thu 17-10-26				10-21	10-26							
1330	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-10-28				10-27	10-28							
1331	rozdeskowanie	100%	Thu 17-11-02	Fri 17-11-03				11-02	11-03							
1332	Izolacja P1	0%	Wed 17-11-15	Wed 17-11-15				11-15	11-15							
1333	Zasyпка P1	0%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20				11-16	11-20							

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3							2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar					
1334	Fundament P2 L	79%	Mon 17-09-04	Mon 17-10-16			09-04						10-16						
1335	Wykop	100%	Mon 17-09-04	Thu 17-09-07			09-04		09-07										
1336	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-08	Thu 17-09-14			09-08		09-14										
1337	Chudy beton	100%	Fri 17-09-15	Fri 17-09-15			09-15		09-15										
1338	Zbrojenie fundamentu P2 L	100%	Sat 17-09-16	Thu 17-09-21			09-16		09-21										
1339	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Fri 17-09-22	Sat 17-09-23			09-22		09-23										
1340	rozdeskowanie	100%	Thu 17-09-28	Thu 17-09-28			09-28		09-28										
1341	Izolacja P2 L	0%	Wed 17-10-11	Wed 17-10-11					10-11										
1342	Zasyпка P2 L	0%	Thu 17-10-12	Mon 17-10-16					10-12										
1343	Fundament P2 P	79%	Fri 17-09-01	Sat 17-09-30			09-01						09-30						
1344	Wykop	100%	Mon 17-09-04	Thu 17-09-07			09-04		09-07										
1345	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-08	Thu 17-09-14			09-08		09-14										
1346	Chudy beton	100%	Fri 17-09-15	Fri 17-09-15			09-15		09-15										
1347	Zbrojenie funadmentu P2 L	100%	Fri 17-09-01	Wed 17-09-06			09-01		09-06										
1348	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Thu 17-09-07	Fri 17-09-08			09-07		09-08										
1349	rozdeskowanie	100%	Wed 17-09-13	Wed 17-09-13			09-13		09-13										
1350	Izolacja P2 L	0%	Tue 17-09-26	Tue 17-09-26					09-26										
1351	Zasyпка P2 L	0%	Wed 17-09-27	Sat 17-09-30					09-27										
1352	Fundament P3 L	79%	Mon 17-08-14	Sat 17-09-16			08-14						09-16						
1353	Wykop	100%	Mon 17-08-14	Thu 17-08-17			08-14		08-17										
1354	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-08-18	Thu 17-08-24			08-18		08-24										
1355	Chudy beton	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-08-25			08-25		08-25										
1356	Zbrojenie fundamentu	100%	Sat 17-08-26	Thu 17-08-31			08-26		08-31										
1357	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-09-01	Sat 17-09-02			09-01		09-02										
1358	rozbiorka	100%	Thu 17-09-07	Thu 17-09-07			09-07		09-07										
1359	Izolacja	0%	Tue 17-09-12	Tue 17-09-12					09-12										
1360	Zasyпка	0%	Wed 17-09-13	Sat 17-09-16					09-13										
1361	Fundament P3 P	79%	Mon 17-08-14	Thu 17-09-28			08-14						09-28						
1362	Wykop	100%	Mon 17-08-14	Thu 17-08-17			08-14		08-17										

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		2017 Qtr 3							2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
			Start	Finish	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
1363	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-08-18	Thu 17-08-24			08-18	08-24									
1364	Chudy beton	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-08-25			08-25	08-25									
1365	Zbrojenie fundamentu	100%	Thu 17-09-07	Tue 17-09-12				09-07	09-12								
1366	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Wed 17-09-13	Thu 17-09-14				09-13	09-14								
1367	rozdeskowanie	100%	Tue 17-09-19	Tue 17-09-19				09-19	09-19								
1368	Izolacja	0%	Sat 17-09-23	Sat 17-09-23				09-23	09-23								
1369	Zasyпка	0%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28				09-25	09-28								
1370	Fundament P4 L	80%	Mon 17-07-24	Sat 17-08-26			07-24	08-26									
1371	Wykop	100%	Mon 17-07-24	Thu 17-07-27			07-24	07-27									
1372	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-07-28	Thu 17-08-03			07-28	08-03									
1373	Chudy beton	100%	Fri 17-08-04	Fri 17-08-04			08-04	08-04									
1374	Zbrojenie fundamentu	100%	Sat 17-08-05	Thu 17-08-10			08-05	08-10									
1375	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-08-11	Sat 17-08-12			08-11	08-12									
1376	rozdeskowanie	100%	Thu 17-08-17	Fri 17-08-18			08-17	08-18									
1377	Izolacja	0%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22			08-22	08-22									
1378	Zasyпка	0%	Wed 17-08-23	Sat 17-08-26			08-23	08-26									
1379	Fundament P4 P	79%	Mon 17-07-24	Mon 17-09-04			07-24	09-04									
1380	Wykop	100%	Mon 17-07-24	Thu 17-07-27			07-24	07-27									
1381	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-07-28	Thu 17-08-03			07-28	08-03									
1382	Chudy beton	100%	Fri 17-08-04	Fri 17-08-04			08-04	08-04									
1383	Zbrojenie fundadmentu	100%	Fri 17-08-11	Wed 17-08-16			08-11	08-16									
1384	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Sat 17-08-19	Mon 17-08-21			08-19	08-21									
1385	rozdeskowanie	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-08-25			08-25	08-25									
1386	Izolacja	0%	Wed 17-08-30	Wed 17-08-30			08-30	08-30									
1387	Zasyпка	0%	Thu 17-08-31	Mon 17-09-04			08-31	09-04									
1388	Korpusy filary	18%	Sat 17-08-26	Thu 18-04-19			08-26										
1389	Korpus podpor P1L	0%	Sat 17-11-04	Mon 18-03-19					11-04							0	
1400	Korpus podpor P1 P	0%	Mon 17-10-30	Mon 18-04-02					10-30								
1411	Filary P2 L	0%	Thu 17-09-14	Wed 17-11-08					09-14			11-08					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1431	Filary P2 P	0%	Fri 17-10-06	Tue 17-12-12				10-06				12-12		
1451	Filary P3 L	51%	Wed 17-09-20	Sat 17-11-11				09-20				11-11		
1452	Zbrojenie podpory	100%	Wed 17-09-20	Tue 17-09-26				09-20				09-26		
1453	P3 L1	71%	Wed 17-09-27	Tue 17-10-10				09-27				10-10		
1454	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-09-27	Sat 17-09-30				09-27				09-30		
1455	Betonowanie	100%	Mon 17-10-02	Mon 17-10-02				10-02				10-02		
1456	Rozdeskowanie podpory	0%	Mon 17-10-09	Tue 17-10-10				10-09				10-10		
1457	P3 L2	71%	Wed 17-10-11	Tue 17-10-24				10-11				10-24		
1458	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-10-11	Sat 17-10-14				10-11				10-14		
1459	Betonowanie	100%	Mon 17-10-16	Mon 17-10-16				10-16				10-16		
1460	Rozdeskowanie podpory	0%	Mon 17-10-23	Tue 17-10-24				10-23				10-24		
1461	P3 L3	71%	Mon 17-10-16	Sat 17-10-28				10-16				10-28		
1462	Deskowanie podpory	100%	Mon 17-10-16	Thu 17-10-19				10-16				10-19		
1463	Betonowanie	100%	Fri 17-10-20	Fri 17-10-20				10-20				10-20		
1464	Rozdeskowanie podpory	0%	Fri 17-10-27	Sat 17-10-28				10-27				10-28		
1465	Izolacja podpory	0%	Tue 17-11-07	Tue 17-11-07				11-07				11-07		
1466	Zasyпка podpory	0%	Wed 17-11-08	Sat 17-11-11				11-08				11-11		
1467	Oczep P3L	0%	Mon 17-10-30	Wed 17-11-08				10-30				11-08		
1471	Filary P3 P	0%	Fri 17-10-06	Thu 18-04-19				10-06						
1491	Korpus podpor P4L	83%	Sat 17-08-26	Mon 18-03-19				08-26						0
1492	Zbrojenie podpory	100%	Sat 17-08-26	Fri 17-09-01				08-26				09-01		
1493	Deskowanie podpory	100%	Sat 17-09-02	Fri 17-09-15				09-02				09-15		
1494	Betonowanie	100%	Sat 17-09-16	Sat 17-09-16				09-16				09-16		
1495	Rozdeskowanie podpory	0%	Tue 17-09-26	Wed 17-09-27				09-26				09-27		
1496	Izolacja podpory	0%	Wed 17-10-04	Wed 17-10-04				10-04				10-04		
1497	Ciosy podłozyskowe	0%	Thu 17-10-05	Fri 17-10-06				10-05				10-06		
1498	Podparcie belki	100%	Wed 17-12-13	Mon 18-03-19								12-13		0
1502	Korpus podpor P4 P	14%	Thu 17-09-28	Sat 17-11-04				09-28				11-04		
1503	Zbrojenie podpory	70%	Thu 17-09-28	Wed 17-10-04				09-28				10-04		

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
1504	Deskowanie podpory	0%	Sat 17-09-30	Fri 17-10-13				09-30	10-13							
1505	Betonowanie	0%	Sat 17-10-14	Sat 17-10-14				10-14	10-14							
1506	Rozdeskowanie podpory	0%	Tue 17-10-24	Wed 17-10-25				10-24	10-25							
1507	Izolacja podpory	0%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01				11-01	11-01							
1508	Ciosy podłozyskowe	0%	Thu 17-10-26	Fri 17-10-27				10-26	10-27							
1509	Podparcie belki	0%	Mon 17-10-30	Sat 17-11-04				10-30	11-04							
1513	Montaż łożysk	0%	Sat 17-10-28	Tue 17-12-12				10-28	12-12							
1516	Ścianka zaplecza	0%	Tue 18-07-17	Mon 18-07-30												
1519	Płyty przejściowe	0%	Thu 18-08-09	Thu 18-09-27												
1530	Ustrójce nośne	0%	Thu 18-04-05	Thu 18-11-01										04-05		
1587	Mur oporowy P1	0%	Fri 17-12-08	Wed 18-08-08						12-08						
1600	Mur oporowy P4	0%	Thu 17-10-05	Fri 18-08-31				10-05								
1613	Roboty wykończeniowe	0%	Sat 18-09-01	Fri 18-11-09												
1616	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie PZ6	0%	Fri 18-10-05	Fri 18-12-28												
1617	WE 7.1	6%	Mon 17-08-14	Fri 18-12-07				08-14								
1657	Korpusy	49%	Mon 17-08-14	Thu 17-11-23				08-14			11-23					
1658	Korpus podpor P1L	21%	Mon 17-08-14	Thu 17-09-21				08-14		09-21						
1659	Zbrojenie podpory P1	70%	Mon 17-08-14	Fri 17-08-18				08-14	08-18							
1660	Deskowanie podpory P1	0%	Fri 17-08-25	Sat 17-09-02				08-25	09-02							
1661	Betonowanie P1	0%	Mon 17-09-04	Mon 17-09-04				09-04	09-04							
1662	Rozdeskowanie podpory P1	0%	Wed 17-09-13	Thu 17-09-14				09-13	09-14							
1663	Izolacja podpory P1	0%	Thu 17-09-21	Thu 17-09-21				09-21	09-21							
1664	Korpus podpor P1P	94%	Wed 17-09-13	Thu 17-10-12				09-13	10-12							
1665	Zbrojenie podpory P1	100%	Wed 17-09-13	Mon 17-09-18				09-13	09-18							
1666	Deskowanie podpory P1	100%	Fri 17-09-15	Sat 17-09-23				09-15	09-23							
1667	Betonowanie P1	100%	Mon 17-09-25	Mon 17-09-25				09-25	09-25							
1668	Rozdeskowanie podpory P1	100%	Wed 17-10-04	Thu 17-10-05				10-04	10-05							
1669	Izolacja podpory P1	0%	Thu 17-10-12	Thu 17-10-12				10-12	10-12							
1670	Korpus podpor P2 L	0%	Tue 17-09-19	Thu 17-11-02				09-19	11-02							

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1676	Korpus podpor P2 P	82%	Wed 17-10-25	Thu 17-11-23					10-25		11-23		
1677	Zbrojenie podpory P2	100%	Wed 17-10-25	Mon 17-10-30					10-25	10-30			
1678	Deskowanie podpory P2	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-11-04					10-27	11-04			
1679	Betonowanie P2	100%	Mon 17-11-06	Mon 17-11-06					11-06	11-06			
1680	Rozdeskowanie podpory P2	0%	Wed 17-11-15	Thu 17-11-16					11-15	11-16			
1681	Izolacja podpory P2	0%	Thu 17-11-23	Thu 17-11-23					11-23	11-23			
1682	Płyty przejściowe	0%	Sat 18-05-12	Thu 18-08-30									
1693	Ustrój nośny	0%	Fri 17-10-27	Fri 18-05-04					10-27				
1718	izolacja ustroju	0%	Wed 18-05-02	Tue 18-05-22									
1721	Montaż dylatacji	0%	Wed 18-05-02	Thu 18-08-30									
1724	Kapy chodnikowe	0%	Thu 18-05-03	Mon 18-05-21									
1730	Jezdnia	0%	Tue 18-08-28	Thu 18-09-13									
1735	Mur oporowy P1	0%	Fri 17-09-15	Fri 18-05-11					09-15				
1748	Roboty wykończeniowe	0%	Sat 18-05-12	Fri 18-08-24									
1750	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 7.1	0%	Sat 18-08-25	Fri 18-12-07									
1751	Mur oporowy WE 7.1 _M7.2	14%	Tue 17-07-25	Fri 18-12-07					07-25				
1752	Wymiana gruntu	100%	Tue 17-07-25	Thu 17-09-14					07-25	09-14			
1753	Mur oporowy	0%	Fri 17-09-29	Fri 18-12-07						09-29			
1758	M 7.2	17%	Tue 17-07-25	Mon 18-12-10					07-25				
1759	Roboty przygotowawcze	100%	Mon 17-07-31	Wed 17-09-20					07-31	09-20			
1764	Montaż mostu tymczasowego	100%	Mon 17-07-31	Wed 17-09-20					07-31	09-20			
1765	Roboty fundamentowe	82%	Tue 17-07-25	Fri 17-10-20					07-25	10-20			
1766	Fundament P1L	88%	Tue 17-07-25	Wed 17-09-20					07-25	09-20			
1767	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Tue 17-07-25	Fri 17-07-28					07-25	07-28			
1768	Wymiana gruntu	100%	Sat 17-07-29	Fri 17-08-04					07-29	08-04			
1769	Chudy beton	100%	Sat 17-08-05	Sat 17-08-05					08-05	08-05			
1770	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-14					08-07	08-14			
1771	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Tue 17-08-15	Fri 17-08-18					08-15	08-18			
1772	rozdeskowanie	100%	Wed 17-08-23	Thu 17-08-24					08-23	08-24			

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1773	Izolacja P1	30%	Mon 17-08-28	Mon 17-08-28			08-28	08-28						
1774	Zasyпка P1	30%	Sat 17-09-16	Wed 17-09-20				09-16	09-20					
1775	Fundament P1P	88%	Tue 17-07-25	Wed 17-09-20										
1776	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Tue 17-07-25	Fri 17-07-28			07-25	07-28						
1777	Wymiana gruntu	100%	Tue 17-07-25	Mon 17-07-31			07-25	07-31						
1778	Chudy beton	100%	Sat 17-08-05	Sat 17-08-05			08-05	08-05						
1779	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-09-01			08-25	09-01						
1780	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Sat 17-09-02	Wed 17-09-06				09-02	09-06					
1781	rozdeskowanie	100%	Mon 17-09-11	Tue 17-09-12				09-11	09-12					
1782	Izolacja P1	30%	Fri 17-09-15	Fri 17-09-15				09-15	09-15					
1783	Zasyпка P1	30%	Sat 17-09-16	Wed 17-09-20				09-16	09-20					
1784	Fundament F2 L	71%	Sat 17-07-29	Wed 17-09-13										
1787	Chudy beton	100%	Sat 17-07-29	Sat 17-07-29			07-29	07-29						
1788	Zbrojenie funadmentu P2 L	100%	Fri 17-08-11	Fri 17-08-18			08-11	08-18						
1789	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Sat 17-08-19	Tue 17-08-22			08-19	08-22						
1790	rozdeskowanie	100%	Sat 17-08-26	Sat 17-08-26			08-26	08-26						
1791	Izolacja P2 L	0%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08				09-08	09-08					
1792	Zasyпка P2 L	0%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-13				09-09	09-13					
1793	Fundament F2 P	81%	Sat 17-07-29	Fri 17-09-29										
1794	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Sat 17-07-29	Wed 17-08-02			07-29	08-02						
1795	Wymiana gruntu	100%	Thu 17-08-03	Wed 17-08-09			08-03	08-09						
1796	Chudy beton	100%	Thu 17-08-10	Thu 17-08-10			08-10	08-10						
1797	Zbrojenie funadmentu P2 L	100%	Mon 17-08-28	Mon 17-09-04			08-28	09-04						
1798	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Tue 17-09-05	Thu 17-09-07				09-05	09-07					
1799	rozdeskowanie	100%	Tue 17-09-12	Tue 17-09-12				09-12	09-12					
1800	Izolacja P2 L	0%	Mon 17-09-25	Mon 17-09-25				09-25	09-25					
1801	Zasyпка P2 L	0%	Tue 17-09-26	Fri 17-09-29				09-26	09-29					
1802	Fundament P3 L	80%	Mon 17-08-28	Fri 17-10-06										
1803	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Mon 17-08-28	Thu 17-08-31			08-28	08-31						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1804	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-01	Thu 17-09-07			09-01	09-07						
1805	Chudy beton	100%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08			09-08	09-08						
1806	Zbrojenie fundamentu	100%	Thu 17-09-14	Thu 17-09-21			09-14	09-21						
1807	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-09-22	Fri 17-09-22			09-22	09-22						
1808	rozdeskowanie	100%	Wed 17-09-27	Wed 17-09-27			09-27	09-27						
1809	Izolacja	0%	Mon 17-10-02	Mon 17-10-02				10-02	10-02					
1810	Zasyпка	0%	Tue 17-10-03	Fri 17-10-06				10-03	10-06					
1811	Fundament P3 P	79%	Fri 17-09-01	Fri 17-10-20			09-01	10-20						
1812	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-05			09-01	09-05						
1813	Wymiana gruntu	100%	Wed 17-09-06	Tue 17-09-12			09-06	09-12						
1814	Chudy beton	100%	Wed 17-09-13	Wed 17-09-13			09-13	09-13						
1815	Zbrojenie fundadmentu	100%	Thu 17-09-28	Thu 17-10-05			09-28	10-05						
1816	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06			10-06	10-06						
1817	Izolacja	0%	Mon 17-10-16	Mon 17-10-16				10-16	10-16					
1818	Zasyпка	0%	Tue 17-10-17	Fri 17-10-20				10-17	10-20					
1819	Korpusy filary	11%	Thu 17-09-14	Mon 18-03-19			09-14							0
1820	Korpus podpor P1L	0%	Thu 17-09-21	Wed 17-11-29			09-21		11-29					
1837	Korpus podpor P1 P	0%	Wed 17-10-18	Mon 18-03-19				10-18						0
1854	Filary P2 L	62%	Thu 17-09-14	Mon 17-11-20			09-14		11-20					
1855	Zbrojenie filary	100%	Thu 17-09-14	Wed 17-09-20			09-14	09-20						
1856	P2 L1	100%	Thu 17-09-21	Tue 17-09-26			09-21	09-26						
1859	P2 L2	100%	Mon 17-10-09	Fri 17-10-13				10-09	10-13					
1862	P2 L3	100%	Wed 17-09-27	Mon 17-10-02				09-27	10-02					
1865	Izolacja podpory	0%	Wed 17-11-15	Wed 17-11-15					11-15	11-15				
1866	Zasyпка podpory	0%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20					11-16	11-20				
1867	Oczep P2L	0%	Fri 17-10-20	Sat 17-10-28				10-20	10-28					
1871	Filary P2 P	14%	Thu 17-09-21	Fri 17-12-08			09-21		12-08					
1872	Zbrojenie filary	80%	Thu 17-09-21	Wed 17-09-27			09-21	09-27						
1873	P2 P4	0%	Tue 17-10-03	Sat 17-10-07				10-03	10-07					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1876	P2 P5	0%	Thu 17-10-26	Tue 17-10-31					10-26	10-31			
1879	P2 P6	0%	Sat 17-10-14	Thu 17-10-19					10-14	10-19			
1882	Izolacja podpory	0%	Mon 17-12-04	Mon 17-12-04						12-04	12-04		
1883	Zasyпка podpory	0%	Tue 17-12-05	Fri 17-12-08						12-05	12-08		
1884	Oczep P2P	0%	Tue 17-11-07	Thu 17-11-16						11-07	11-16		
1888	Korpus podpor P3L	0%	Sat 17-10-14	Wed 17-11-29						10-14	11-29		
1899	Korpus podpor P3 P	0%	Sat 17-11-11	Mon 18-03-19						11-11			0
1910	Montaż łożysk	0%	Tue 17-11-21	Tue 17-12-12						11-21	12-12		
1913	Ścianka zapleczna	0%	Thu 18-07-26	Wed 18-08-08									
1916	Płyty przejściowe	0%	Fri 18-08-17	Fri 18-09-21									
1927	Ustrójce nośne	0%	Sat 18-03-24	Mon 18-10-01									03-24
1984	Mur oporowy P3	0%	Tue 17-10-03	Fri 18-10-12					10-03				
1998	Roboty wykończeniowe	0%	Wed 18-07-04	Thu 18-10-18									
2001	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie M 7.2	0%	Fri 18-10-19	Mon 18-12-10									
2002	WE 8	11%	Tue 17-07-18	Thu 19-01-03					07-18				
2005	Roboty fundamentowe	100%	Tue 17-07-18	Mon 17-08-28					07-18	08-28			
2026	Fundament P2 L	100%	Tue 17-07-18	Fri 17-08-18					07-18	08-18			
2035	Fundament P2 P	100%	Tue 17-07-18	Mon 17-08-28					07-18	08-28			
2044	Korpusy	52%	Mon 17-08-14	Sat 17-12-02					08-14	12-02			
2045	Korpus podpor P1L	88%	Mon 17-08-14	Sat 17-09-16					08-14	09-16			
2046	Zbrojenie podpory P1	100%	Mon 17-08-14	Sat 17-08-19					08-14	08-19			
2047	Deskowanie podpory P1	100%	Wed 17-08-16	Tue 17-08-29					08-16	08-29			
2048	Betonowanie P1	100%	Wed 17-08-30	Wed 17-08-30					08-30	08-30			
2049	Rozdeskowanie podpory P1	100%	Fri 17-09-08	Sat 17-09-09					09-08	09-09			
2050	Izolacja podpory P1	0%	Sat 17-09-16	Sat 17-09-16					09-16	09-16			
2051	Ciosy podłożyskowe	0%	Mon 17-09-11	Tue 17-09-12					09-11	09-12			
2052	Korpus podpor P1P	15%	Wed 17-10-04	Tue 17-11-07					10-04	11-07			
2053	Zbrojenie podpory P1	60%	Wed 17-10-04	Tue 17-10-10					10-04	10-10			
2054	Deskowanie podpory P1	0%	Fri 17-10-06	Thu 17-10-19					10-06	10-19			


Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
2055	Betonowanie P1	0%	Fri 17-10-20	Fri 17-10-20					10-20	10-20					
2056	Rozdeskowanie podpory P1	0%	Mon 17-10-30	Tue 17-10-31					10-30	10-31					
2057	Izolacja podpory P1	0%	Tue 17-11-07	Tue 17-11-07					11-07	11-07					
2058	ciosy podłożyskowe	0%	Wed 17-11-01	Thu 17-11-02					11-01	11-02					
2059	Korpus podpor P2 L	91%	Mon 17-08-21	Thu 17-10-12					08-21	10-12					
2060	Zbrojenie podpory P2	100%	Mon 17-08-21	Sat 17-08-26					08-21	08-26					
2061	Deskowanie podpory P2	100%	Mon 17-09-11	Sat 17-09-23					09-11	09-23					
2062	Betonowanie P2	100%	Mon 17-09-25	Mon 17-09-25					09-25	09-25					
2063	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Wed 17-10-04	Thu 17-10-05					10-04	10-05					
2064	Izolacja podpory P2	0%	Thu 17-10-12	Thu 17-10-12					10-12	10-12					
2065	ciosy podłożyskowe	0%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06					10-06	10-06					
2066	Korpus podpor P2 P	15%	Fri 17-10-27	Sat 17-12-02					10-27	12-02					
2067	Zbrojenie podpory P2	60%	Fri 17-10-27	Thu 17-11-02					10-27	11-02					
2068	Deskowanie podpory P2	0%	Wed 17-11-01	Tue 17-11-14					11-01	11-14					
2069	Betonowanie P2	0%	Wed 17-11-15	Wed 17-11-15					11-15	11-15					
2070	Rozdeskowanie podpory P2	0%	Fri 17-11-24	Sat 17-11-25					11-24	11-25					
2071	Izolacja podpory P2	0%	Sat 17-12-02	Sat 17-12-02					12-02	12-02					
2072	ciosy podłożyskowe	0%	Mon 17-11-27	Tue 17-11-28					11-27	11-28					
2073	Płyty przejściowe	0%	Tue 18-07-24	Fri 18-09-07											
2084	Ścianka zaplecza	0%	Sat 18-06-30	Fri 18-07-13											
2087	Montaż łożysk	0%	Sat 18-05-12	Sat 18-05-12											
2090	Ustrój nośny	0%	Mon 17-11-27	Fri 18-06-29											
2115	izolacja ustroju	0%	Wed 18-06-27	Sat 18-10-06											
2118	Montaż dylatacji	0%	Thu 18-07-26	Wed 18-08-01											
2121	Kapy chodnikowe	0%	Mon 18-07-02	Thu 18-07-26											
2128	Jezdnia	0%	Wed 18-10-03	Mon 18-10-08											
2133	Mur oporowy P1	0%	Mon 17-11-27	Mon 18-07-23											
2146	Mur oporowy P2	0%	Mon 17-11-27	Wed 18-08-15											
2159	Roboty wykończeniowe	0%	Thu 18-08-16	Wed 18-10-24											

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	


ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
2161	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 8	0%	Thu 18-10-25	Thu 19-01-03										
2162	PZ 9	1%	Mon 17-08-07	Thu 18-12-13										
2163	Roboty przygotowawcze	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-07										
2165	Roboty fundamentowe	8%	Tue 17-08-08	Tue 17-11-28										
2166	Fundament P1L	8%	Tue 17-08-08	Fri 17-11-10										
2167	Wykop	50%	Tue 17-08-08	Fri 17-08-11										
2168	Wymiana pod fundamentem	0%	Wed 17-10-04	Sat 17-10-07										
2169	Chudy beton	0%	Mon 17-10-09	Mon 17-10-09										
2170	Zbrojenie fundamentu P1	0%	Tue 17-10-10	Sat 17-10-14										
2171	Deskowanie + Beton fundamentu P1	0%	Sat 17-10-14	Wed 17-10-18										
2172	Rozdeskowanie	0%	Mon 17-10-23	Mon 17-10-23										
2173	Izolacja P1	0%	Sat 17-11-04	Mon 17-11-06										
2174	Zasyпка P1	0%	Tue 17-11-07	Fri 17-11-10										
2175	Fundament P1 P	8%	Tue 17-08-08	Mon 17-11-20										
2176	Wykop	50%	Tue 17-08-08	Fri 17-08-11										
2177	Wymiana pod fundamentem	0%	Wed 17-10-04	Sat 17-10-07										
2178	Chudy beton	0%	Mon 17-10-09	Mon 17-10-09										
2179	Zbrojenie funadmentu P1	0%	Sat 17-10-21	Thu 17-10-26										
2180	Deskowanie + Beton fundamentu P1	0%	Tue 17-10-24	Fri 17-10-27										
2181	Rozdeskowanie	0%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01										
2182	Izolacja P1	0%	Tue 17-11-14	Wed 17-11-15										
2183	Zasyпка P1	0%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20										
2184	Fundament P2 L	8%	Sat 17-08-12	Fri 17-11-17										
2185	Wykop	50%	Sat 17-08-12	Wed 17-08-16										
2186	Wymiana pod fundamentem	0%	Thu 17-08-17	Mon 17-08-21										
2187	Chudy beton	0%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22										
2188	Zbrojenie funadmentu P2 L	0%	Mon 17-10-16	Fri 17-10-20										
2189	Deskowanie + Beton fundamentu P2 L	0%	Sat 17-10-21	Wed 17-10-25										
2190	Rozdeskowanie	0%	Mon 17-10-30	Mon 17-10-30										

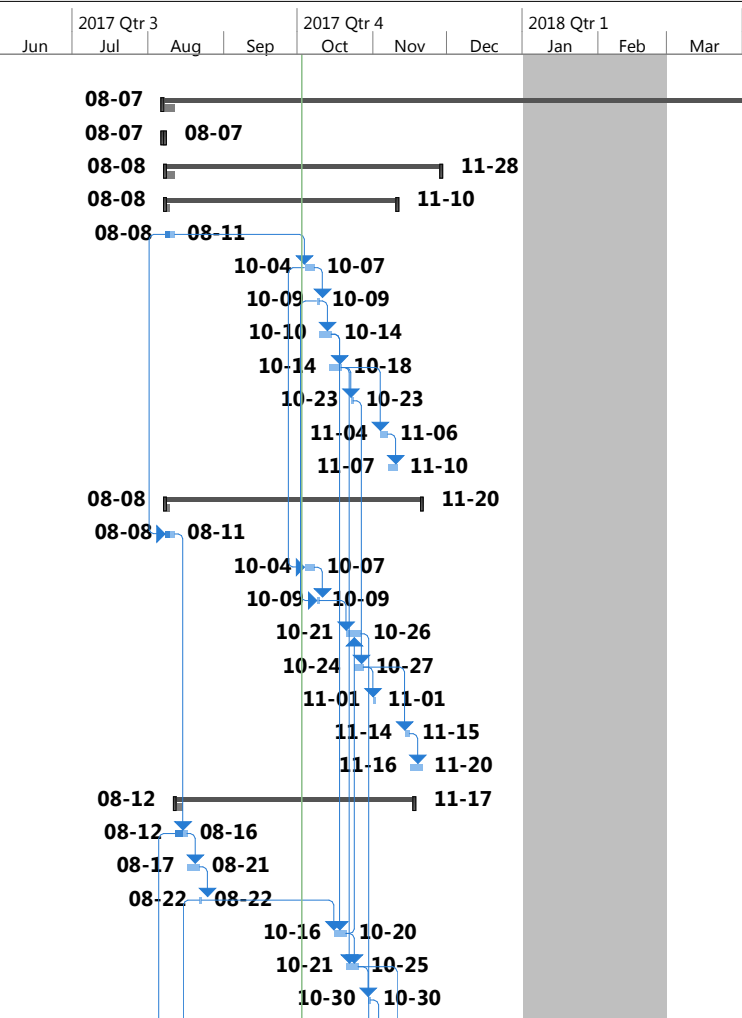

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
2191	Izolacja P2 L	0%	Sat 17-11-11	Mon 17-11-13					11-11	11-13			
2192	Zasyпка P2 L	0%	Tue 17-11-14	Fri 17-11-17					11-14	11-17			
2193	Fundament P2 P	8%	Sat 17-08-12	Tue 17-11-28									
2194	Wykop	50%	Sat 17-08-12	Wed 17-08-16									
2195	Wymiana pod fundamentem	0%	Thu 17-08-17	Mon 17-08-21									
2196	Chudy beton	0%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22									
2197	Zbrojenie funadmentu P2	0%	Fri 17-10-27	Wed 17-11-01									
2198	Deskowanie +Beton fundamentu P2	0%	Wed 17-11-01	Sat 17-11-04									
2199	Rozdeskowanie	0%	Thu 17-11-09	Thu 17-11-09									
2200	Izolacja P2	0%	Wed 17-11-22	Thu 17-11-23									
2201	Zasyпка P2	0%	Fri 17-11-24	Tue 17-11-28									
2202	Korpusy	0%	Sat 17-11-11	Thu 18-04-05									
2227	Płyty przejściowe	0%	Sat 18-07-14	Mon 18-08-06									
2238	Ustrój nośny	0%	Fri 18-03-30	Tue 18-07-17									03-30
2263	izolacja ustroju	0%	Sat 18-07-14	Fri 18-08-24									
2266	Montaż dylatacji	0%	Sat 18-07-14	Wed 18-09-19									
2269	Kapy chodnikowe	0%	Mon 18-07-16	Tue 18-07-31									
2276	Jezdnia	0%	Sat 18-09-15	Thu 18-09-20									
2281	Mur oporowy P1	0%	Fri 18-03-30	Thu 18-07-12									03-30
2294	Mur oporowy P2	0%	Fri 18-03-30	Thu 18-07-12									03-30
2307	Roboty wykończeniowe	0%	Fri 18-07-13	Thu 18-09-20									
2309	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie PZ 9	0%	Thu 18-09-20	Thu 18-12-13									
2310	WE 10	28%	Wed 17-07-19	Fri 18-11-30									
2350	Korpusy	100%	Wed 17-07-19	Thu 17-08-31									
2375	Płyty przejściowe	0%	Mon 18-06-04	Thu 18-07-19									
2386	Ustrój nośny	0%	Fri 17-08-25	Thu 18-05-10									
2411	izolacja ustroju	0%	Tue 18-05-08	Wed 18-09-26									
2414	Montaż dylatacji	0%	Tue 18-05-08	Mon 18-10-01									
2417	Kapy chodnikowe	0%	Wed 18-05-09	Thu 18-05-31									

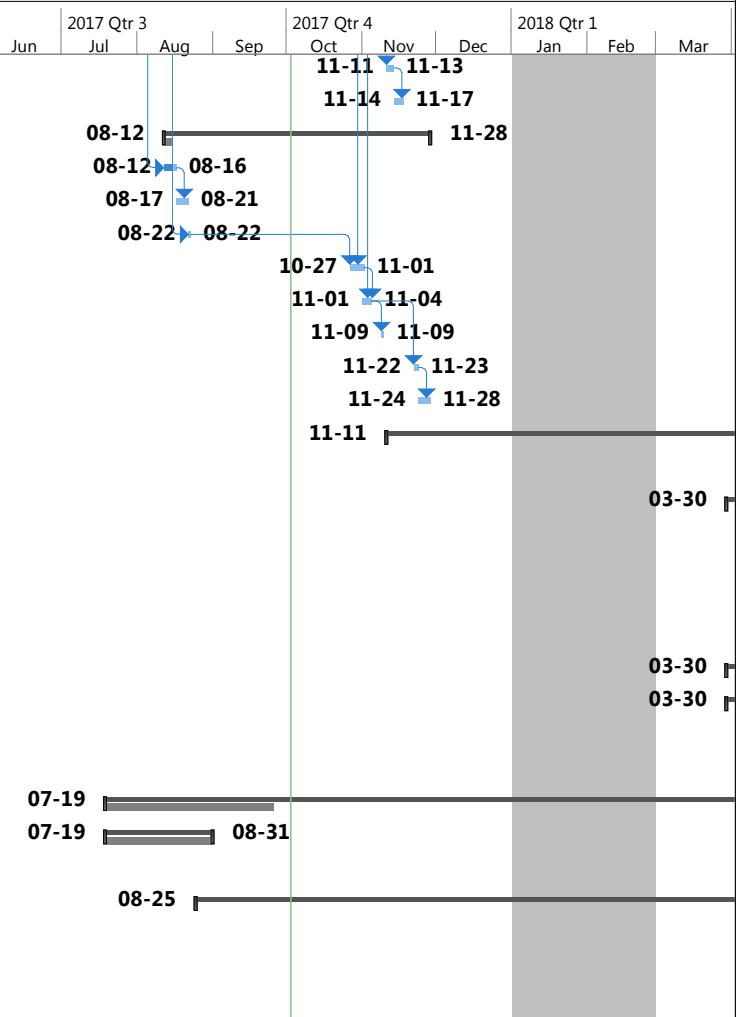


Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt Chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
2424	Jezdnia	0%	Thu 18-09-27	Tue 18-10-02												
2429	Mur oporowy P1	43%	Fri 17-08-25	Sat 18-06-02				08-25								
2430	Mur P1 L	63%	Fri 17-08-25	Sat 18-06-02				08-25								
2431	Fundament muru P1 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29				08-25	08-29							
2432	Mur oporowy +zasyпка	60%	Fri 17-09-01	Sat 18-06-02				09-01								
2433	Lico muru 0,4 H	90%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17				09-01	10-17							
2434	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02												
2435	Mur P1 P	63%	Fri 17-08-25	Sat 18-06-02				08-25								
2436	Fundament muru P1 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29				08-25	08-29							
2437	Mur oporowy +zasyпка	60%	Wed 17-08-30	Sat 18-06-02				08-30								
2438	Lico muru 0,4 H	90%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14				08-30	10-14							
2439	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02												
2440	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17				09-01	10-17							
2441	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02												
2442	Mur oporowy P2	43%	Fri 17-08-25	Tue 18-06-26				08-25								
2443	Mur P2 L	63%	Fri 17-08-25	Tue 18-06-26				08-25								
2444	Fundament muru P2 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29				08-25	08-29							
2445	Mur oporowy + zasyпка P2 L	60%	Wed 17-08-30	Tue 18-06-26				08-30								
2446	Lico muru 0,4 H	90%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14				08-30	10-14							
2447	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26												
2448	Mur P2 P	63%	Fri 17-08-25	Tue 18-06-26				08-25								
2449	Fundament muru P2 P	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29				08-25	08-29							
2450	Mur oporowy + zasyпка P2 P	60%	Wed 17-08-30	Tue 18-06-26				08-30								
2451	Lico muru 0,4 H	90%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14				08-30	10-14							
2452	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26												
2453	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	0%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14				08-30	10-14							
2454	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26												
2455	Roboty wykończeniowe	0%	Wed 18-06-27	Tue 18-10-09												
2456	schody , umocnienia , zab. Kap. Chodnikowych nadbudów murów	0%	Wed 18-06-27	Tue 18-10-09												

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

Wrzesień.mpp

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3				2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
2457	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 10	0%	Wed 18-10-10	Fri 18-11-30										
2458	WD 11	9%	Sat 17-07-22	Tue 18-09-11										
2476	Korpusy	100%	Sat 17-07-22	Wed 17-09-06										
2477	Korpus podpor P1	100%	Sat 17-07-22	Wed 17-08-09										
2484	Korpus podpor P2	100%	Fri 17-07-28	Wed 17-09-06										
2485	Zbrojenie podpory P2	100%	Fri 17-07-28	Fri 17-08-04										
2486	Deskowanie podpory P2	100%	Tue 17-08-08	Fri 17-08-18										
2487	Betonowanie P2	100%	Sat 17-08-19	Sat 17-08-19										
2488	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Sat 17-08-26	Mon 17-08-28										
2489	Izolacja podpory P2	100%	Wed 17-09-06	Wed 17-09-06										
2490	Ciosy podłożyskowe	100%	Sat 17-09-02	Mon 17-09-04										
2491	Montaż łożysk	0%	Sat 17-09-09	Sat 17-09-09										
2492	Ścianka zapleczna	0%	Wed 17-12-13	Sat 18-03-17										
2495	Płyty przejściowe	0%	Fri 17-12-08	Mon 18-04-23										
2506	Ustrój nośny	51%	Tue 17-08-29	Thu 17-11-30										
2507	Ustrój	51%	Tue 17-08-29	Thu 17-11-30										
2508	Przygotowanie podłoża pod ustrój	100%	Tue 17-08-29	Fri 17-09-08										
2509	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Tue 17-08-29	Sat 17-09-02										
2510	Ułożenie płyt drogowych	100%	Mon 17-09-04	Fri 17-09-08										
2511	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-27										
2512	Ustawienie wież rusztowania	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-20										
2513	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Thu 17-09-21	Wed 17-09-27										
2514	Zbrojenie ustroju nośnego	8%	Thu 17-09-28	Mon 17-10-09										
2515	Zbrojenie	10%	Thu 17-09-28	Mon 17-10-09										
2516	Montaż osłonek wpychanie kabli	0%	Thu 17-10-05	Sat 17-10-07										
2517	Betonowanie ustroju nośnego	0%	Tue 17-10-10	Sat 17-11-11										
2521	Dobetonowanie dźwigara	0%	Fri 17-11-24	Thu 17-11-30										
2525	izolacja ustroju	0%	Sat 18-03-17	Thu 18-06-21										
2528	Montaż dylatacji	0%	Mon 18-03-19	Sat 18-03-24										

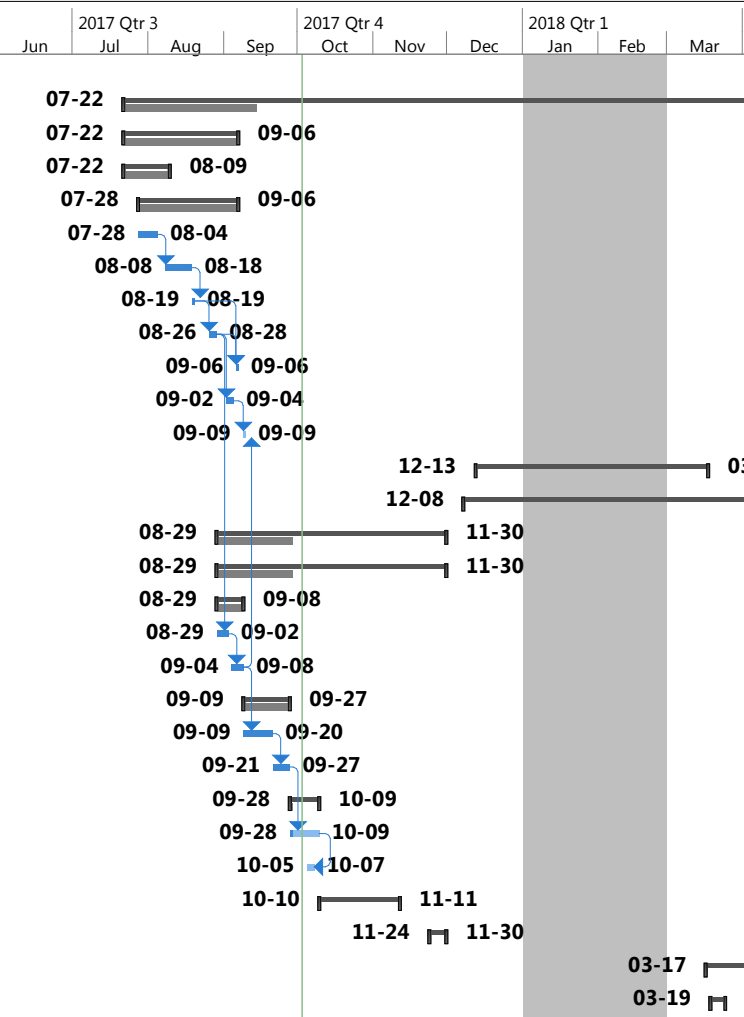

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Wrzesień.mpp		Gantt chart											
			Start	Finish	Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
2531	Kapy chodnikowe	0%	Mon 18-03-19	Fri 18-04-27												
2538	Jezdnia	0%	Fri 18-06-22	Wed 18-08-08												
2544	Mur oporowy P1	0%	Sat 17-09-09	Sat 17-12-09					09-09					12-09		
2557	Mur oporowy P2	0%	Thu 17-09-14	Mon 18-04-02					09-14							
2570	Roboty wykończeniowe	0%	Tue 18-04-03	Wed 18-08-08											04-03	
2573	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WD 11	0%	Wed 18-08-08	Tue 18-09-11												
2574	Przepusty	12%	Wed 17-07-19	Sat 18-11-17					07-19							
2575	Przepust 1+ 901	10%	Mon 17-08-21	Sat 18-11-17					08-21							
2576	Roboty fundamentowe	100%	Mon 17-08-21	Mon 17-09-11					08-21					09-11		
2577	Wykopy	100%	Mon 17-08-21	Mon 17-08-28					08-21					08-28		
2578	Wykonanie fundamentu kruszywowo piaskowego	100%	Tue 17-08-29	Fri 17-09-08					08-29					09-08		
2579	Wykonanie chudego betonu	100%	Sat 17-09-09	Mon 17-09-11					09-09					09-11		
2580	Konstrukcja przepustu	0%	Tue 17-09-12	Mon 17-11-13					09-12					11-13		
2585	Roboty wykończeniowe	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17												
2587	Przepust 3+330	29%	Wed 17-07-19	Sat 18-11-17					07-19							
2592	Konstrukcja przepustu	100%	Wed 17-07-19	Wed 17-09-13					07-19					09-13		
2594	Zasyпка przepustu	100%	Wed 17-07-19	Thu 17-08-03					07-19					08-03		
2595	Wykonanie płyty zespalającej	100%	Fri 17-08-04	Tue 17-08-15					08-04					08-15		
2596	Wykonanie wlotu wylotu przepustu	100%	Wed 17-08-16	Wed 17-09-13					08-16					09-13		
2597	Roboty wykończeniowe	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17												
2599	Przepust 10+246	0%	Tue 17-09-19	Sat 18-11-17										09-19		
2611	Przepust 10+346	0%	Thu 17-09-14	Sat 18-11-17										09-14		
2623	Przepust 10+546	25%	Fri 17-09-08	Sat 18-11-17					09-08							
2628	Konstrukcja przepustu	100%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24					09-08					10-24		
2633	Roboty wykończeniowe	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17												
2635	Obiekty odcinek B	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17					08-15					10-17		
2636	PZ 12	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17					08-15					10-17		
2758	WE 13	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17					08-15					10-17		

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	
