

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1	<b>Budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i</b>	100%	Thu 17-02-02	Sat 19-03-16										
2	<b>PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY</b>	100%	Thu 17-02-02	Thu 17-02-02										
3	<b>1. ROBOTY PODSTAWOWE SEKCJA 1 i 2</b>	85%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03									
4	NADZÓR PRZYRODNICZY - STAN ZEROWY + PŁOTKI DLA PŁAZÓW	100%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03									
5	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	70%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03									
6	<b>2. ROBOTY DROGOWE SEKCJA 1 i 2</b>	55%	Mon 17-07-03	Sat 19-03-16	07-03									
7	<b>SEKCJA 1 - KM 0+000 DO 8+400</b>	83%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03									
8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	83%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03									
9	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	80%	Mon 17-07-03	Tue 18-06-26	07-03									
10	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	90%	Mon 17-07-03	Tue 17-10-03	07-03				10-03					
11	<b>ROBOTY</b>	54%	Mon 17-07-03	Sat 19-03-16	07-03									
12	<b>A1 0+000 - 3+075</b>	52%	Mon 17-07-03	Tue 18-12-11	07-03									
13	WYKOPY (180 000 m3)	100%	Mon 17-07-03	Fri 17-11-10	07-03					11-10				
14	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	70%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-14	07-03									
15	WZMOCNIENIE PODŁOŻA (9000 m2)	100%	Fri 17-07-07	Mon 17-07-31	07-07			07-31						
16	NASYPY (280 000 m3)	60%	Sat 17-07-08	Thu 18-05-17	07-08									
17	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	50%	Sat 17-07-08	Thu 18-09-20	07-08									
18	GWN 0,5 m (30 000 m3)	45%	Mon 17-07-24	Wed 18-05-30	07-24									
19	WYKONANIE ZBIORNIKÓW 3 szt.	45%	Tue 17-07-18	Fri 18-09-14	07-18									
20	Podbudowa z betonu C 5/6 (63 000 m2)	20%	Tue 17-08-01	Mon 18-06-04	08-01									
21	Podbudowa c 8/10 (61 000 m2)	20%	Thu 17-08-10	Sat 18-06-09	08-10									
22	Drogi serwisowe i technologiczne	85%	Mon 17-07-03	Fri 18-09-21	07-03									
23	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (30 000 m2)	0%	Mon 18-07-16	Wed 18-08-01										
24	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (30 000 m2)	0%	Tue 18-10-30	Thu 18-11-15										
25	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Wed 18-07-25	Tue 18-12-11										
26	<b>A2 3+075 - 3+975</b>	62%	Thu 17-07-06	Fri 18-11-30	07-06									
27	NASYPY (35 000 m3)	90%	Thu 17-07-06	Tue 17-10-17	07-06				10-17					
28	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Thu 17-07-06	Sat 18-09-29	07-06									
29	GWN 0,5 m (13 200 m3)	65%	Thu 17-10-05	Thu 17-10-26				10-05	10-26					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
30	WYKONANIE ZBIORNIKÓW 2 szt.	45%	Fri 17-09-01	Thu 18-05-31	09-01											
31	Podbudowa z betonu C 5/6 (20 500 m2)	45%	Mon 17-10-23	Thu 18-07-05	10-23											
32	Podbudowa c 8/10 (20 000 m2)	45%	Tue 17-10-31	Fri 18-07-20	10-31											
33	Drogi serwisowe i technologiczne	85%	Tue 17-07-18	Wed 18-05-30	07-18											
34	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (9 500 m2)	0%	Thu 18-08-02	Mon 18-08-06												
35	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (9 500 m2)	0%	Thu 18-10-25	Mon 18-10-29												
36	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Tue 18-08-07	Fri 18-11-30												
37	<b>A3 3+975 - 5+050</b>	<b>70%</b>	<b>Mon 17-07-17</b>	<b>Wed 18-11-14</b>	<b>07-17</b>											
38	WYKOPY (35 000 m3)	100%	Mon 17-07-17	Sat 17-09-30	07-17 09-30											
39	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Tue 17-07-25	Sat 18-10-06	07-25											
40	NASYPY (35 000 m3)	100%	Wed 17-07-19	Fri 18-04-20	07-19											
41	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Tue 17-07-25	Sat 18-10-06	07-25											
42	GWN 0,5 m (5 000 m3)	65%	Wed 17-08-23	Fri 18-03-16	08-23 03											
43	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 2	10%	Thu 17-07-20	Sat 18-08-04	07-20											
44	Podbudowa z betonu C 5/6 (23 000 m2)	80%	Wed 17-10-25	Mon 18-06-25	10-25											
45	Podbudowa c 8/10 (22 500 m2)	80%	Thu 17-11-02	Thu 18-07-12	11-02											
46	Drogi serwisowe i technologiczne	80%	Tue 17-07-25	Sat 18-09-29	07-25											
47	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (11 100 m2)	0%	Tue 18-08-07	Mon 18-08-13												
48	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (11 100 m2)	0%	Thu 18-10-18	Wed 18-10-24												
49	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Tue 18-08-14	Wed 18-11-14												
50	<b>A4 5+050 - 6+150</b>	<b>73%</b>	<b>Fri 17-07-14</b>	<b>Thu 18-11-29</b>	<b>07-14</b>											
51	WYKOPY (10 000 m3)	100%	Fri 17-07-14	Wed 17-08-23	07-14 08-23											
52	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	100%	Fri 17-07-14	Mon 18-07-30	07-14											
53	NASYPY (2 000 m3)	100%	Mon 17-07-17	Mon 17-09-11	07-17 09-11											
54	NASYPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	85%	Mon 17-07-17	Wed 18-08-01	07-17											
55	GWN 0,5 m (500 m3)	85%	Sat 17-07-22	Mon 17-09-11	07-22 09-11											
56	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 1	25%	Fri 17-09-22	Fri 18-08-10	09-22											
57	Podbudowa z betonu C 5/6 (8 000 m2)	80%	Tue 17-08-01	Mon 17-10-02	08-01 10-02											
58	Podbudowa c 8/10 (7 500m2)	80%	Thu 17-10-12	Thu 17-10-19	10-12 10-19											

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
59	Drogi serwisowe i technologiczne	85%	Wed 17-07-26	Fri 18-09-28	07-26									
60	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (11 000 m2)	0%	Tue 18-08-14	Sat 18-08-18										
61	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (11 000 m2)	0%	Fri 18-10-12	Wed 18-10-17										
62	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Mon 18-08-20	Thu 18-11-29										
63	<b>A5 6+150 - 8+400</b>	<b>60%</b>	<b>Mon 17-07-10</b>	<b>Mon 18-11-26</b>	07-10									
64	WYKOPY (30 000 m3)	100%	Mon 17-07-10	Mon 18-04-30	07-10									
65	WYKOPY POZOSTAŁE DD,DP,DW	90%	Mon 17-07-10	Wed 18-07-25	07-10									
66	WZMOCNIENIE PODŁOŻA	90%	Mon 17-07-10	Mon 18-04-02	07-10									
67	NASYP PRZECIĄŻAJĄCY 6+250 - 6+400 STR. L	100%	Wed 17-10-11	Tue 17-11-14	10-11 11-14									
68	ROZBIÓRKA NASYPU PRZECIĄŻAJĄCEGO 6+250 - 6+400 STR. L	0%	Fri 18-03-16	Thu 18-04-19	03-16									
69	NASYPY POZOSTAŁE (35 000 m3)	65%	Mon 17-07-10	Wed 18-05-30	07-10									
70	GWN 0,5 m (23 000 m3)	35%	Fri 17-07-28	Mon 18-06-11	07-28									
71	WYKONANIE ZBIORNIKÓW szt. 2	30%	Sat 17-07-15	Sat 18-09-29	07-15									
72	Podbudowa z betonu C 5/6 (46 500 m2)	35%	Thu 17-10-12	Fri 18-06-15	10-12									
73	Podbudowa c 8/10 (46 000 m2)	35%	Mon 17-10-30	Tue 18-07-03	10-30									
74	Drogi serwisowe i technologiczne	85%	Fri 17-07-28	Mon 18-09-03	07-28									
75	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 L (22 500 m2)	0%	Tue 18-08-14	Fri 18-08-24										
76	Warstwa nawierzchni betonowej C35/45 P (22 500 m2)	0%	Mon 18-10-01	Thu 18-10-11										
77	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY	0%	Sat 18-08-25	Mon 18-11-26										
78	<b>PODBUDOWY</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-09-01</b>	<b>Fri 18-11-16</b>	09-01									
79	<b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-09-01</b>	<b>Fri 18-11-16</b>	09-01									
85	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Sat 18-10-13</b>	09-04									
91	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-05-29</b>	<b>Tue 18-11-20</b>										
108	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-08-13</b>	<b>Sat 19-03-16</b>										
114	<b>SEKCJA 2 - KM 8+400 DO 12+221,45</b>	<b>43%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sat 19-03-16</b>										
115	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>95%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Wed 18-06-13</b>	07-03									
116	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	95%	Mon 17-07-03	Wed 18-06-13	07-03									
117	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>51%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Tue 18-09-18</b>	07-03									
118	<b>WYKOPY TRASA GŁÓWNA, DD, DG, DP, DW</b>	<b>75%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Fri 18-09-14</b>	07-03									

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
177	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	100%	Mon 17-07-03	Tue 17-09-05	07-03	09-05							
198	<b>PODBUDOWY</b>	100%	Mon 17-07-03	Fri 17-09-22	07-03	09-22							
199	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 50/30	100%	Mon 17-07-03	Fri 17-08-04	07-03	08-04							
202	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,5 ( 1	100%	Wed 17-07-05	Fri 17-09-22	07-05	09-22							
206	Podbudowa z betonu asfaltowego	100%	Wed 17-08-16	Thu 17-08-31		08-16 08-31							
208	Podbudowa z betonu C 5/6 ( 5 000,00 m2 )	100%	Mon 17-07-03	Mon 17-07-31	07-03	07-31							
210	Ułożenie geowłókniny - warstwa poślizgowa ( 13 595,00 m2 )	100%	Tue 17-07-11	Thu 17-07-27	07-11	07-27							
212	<b>NAWIERZCHNIE</b>	100%	Wed 17-07-12	Sat 17-09-16	07-12	09-16							
222	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ROBOTY</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-09-21	07-03	09-21							
223	oznakowanie poziome	100%	Fri 17-09-15	Thu 17-09-21		09-15 09-21							
224	oznakowanie pionowe	100%	Wed 17-08-30	Thu 17-09-21		08-30 09-21							
225	bariery energochłonne	100%	Tue 17-09-05	Thu 17-09-21		09-05 09-21							
226	ekrany akustyczne	100%	Wed 17-08-09	Thu 17-09-21		08-09 09-21							
227	Elementy brukarki - krawężniki, obrzeża, kostka kamienna i betonowa łącznik,	100%	Mon 17-07-03	Mon 17-09-11	07-03	09-11							
228	Korytka Monolityczna - S61, łącznik	100%	Wed 17-08-16	Wed 17-08-23		08-16 08-23							
229	Zahumusowanie S61, łącznik, DK8, DD i DG	100%	Thu 17-07-20	Thu 17-09-21	07-20	09-21							
230	Ogrodzenie	100%	Thu 17-08-24	Thu 17-09-21		08-24 09-21							
231	PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE RUCHU NA DK8	100%	Wed 17-09-20	Wed 17-09-20		09-20 09-20							
232	Uzyskanie decyzji o PnU dla odcinka B	100%	Thu 17-09-21	Tue 17-10-17		09-21 10-17							
233	<b>WYMAGANIA FORMALNE</b>	64%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03								
234	<b>Okres na przeglądy Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie inne</b>	64%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03								
235	<b>zatwierdzenie recept</b>	100%	Tue 17-07-25	Thu 17-08-17	07-25	08-17							
239	<b>zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy</b>	61%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03								
240	zatwierdzenie Programu Budowy - Rewizja	100%	Wed 17-07-26	Wed 17-08-02	07-26	08-02							
241	projekt organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i	60%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03								
242	<b>Kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w</b>	72%	Wed 17-07-12	Fri 18-12-14	07-12								
243	odcinek próbny - nawierzchnia betonowa C 35/45 - S61 odc. B str. Lewa km	100%	Wed 17-07-12	Sat 17-07-22	07-12	07-22							
244	odcinek próbny - podbudowa C50/30	100%	Thu 17-07-20	Thu 17-07-20	07-20	07-20							
245	odcinek próbny - nawierzchnia żwirowa C90/3	100%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08		09-08 09-08							

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
246	odcinek próbny - podbudowa z betonu asfaltowego	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-07		08-07	08-07								
247	odcinek próbny - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	100%	Tue 17-08-08	Wed 17-08-09		08-08	08-09								
248	odcinek próbny - warstwa ścierna z betonu asfaltowego	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-20			09-09	09-20							
249	odcinek próbny - warstwa ścierna SMA	100%	Thu 17-09-07	Thu 17-09-07			09-07	09-07							
250	odbiory techniczne przez IK Odcinek B	100%	Mon 17-09-11	Thu 17-09-21			09-11	09-21							
251	odbiór techniczne przez IK Odcinek A	0%	Thu 18-11-29	Fri 18-12-14											
252	<b>CZAS NA UKOŃCZENIE ODCINEK B</b>	100%	Thu 17-02-02	Thu 17-09-21											
253	<b>CZAS NA UKOŃCZENIE ODCINEK A</b>	50%	Thu 17-02-02	Fri 18-12-14											
254	<b>BRANŻE - ODCINEK B</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-12-14	07-03								12-14		
255	<b>KOLIZJE ENERGETYCZNE</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-12-14	07-03								12-14		
257	<b>ZASILANIE</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03								10-05		
258	Znaki aktywne (km 12+480-12+580 OŚ)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31							
259	KSZR 6 (km 13+080 L (DD15A, WE-13))	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31							
260	Zasilanie SO 4 (rondo DK8)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31							
261	Zasilanie ZK (znaki na wyspach Z1, Z2, Z3) (rondo DK8)	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31							
262	Rozruch próbny, pomiary (zestaw prądowłórczy BX)	100%	Fri 17-09-01	Thu 17-10-05				09-01					10-05		
263	<b>OŚWIETLENIE</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03								10-05		
264	12+400-13+100 P	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31							
265	0+600-1+100 P	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-08-31	07-03			08-31							
266	Rozruch próbny, pomiary (zestaw prądowłórczy BX)	100%	Fri 17-09-01	Thu 17-10-05				09-01					10-05		
267	<b>KANAŁ TELETECHNICZNY</b>	100%	Mon 17-07-03	Thu 17-10-05	07-03								10-05		
271	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>	100%	Thu 17-08-24	Sat 17-09-09				08-24					09-09		
272	wpust z wylotem do rowu	100%	Thu 17-08-24	Thu 17-08-31				08-24					08-31		
273	kanały 55, 56, 57	100%	Fri 17-08-25	Sat 17-09-09				08-25					09-09		
274	<b>BRANŻE - ODCINEK A</b>	31%	Mon 17-07-03	Fri 18-12-14	07-03										
275	<b>KOLIZJE ENERGETYCZNE WN 110 kV</b>	32%	Mon 17-07-03	Sun 17-12-31	07-03								12-31		
277	0 WN - przystosowanie do 3 st (km 5+800-6+400 S61)	0%	Mon 17-07-03	Tue 17-10-31	07-03								10-31		
278	1 WN (km 9+000 S61)	15%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03				09-19					11-03		
279	2 WN (km 9+100 S61)	100%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03				09-19					11-03		

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
280	3 WN (km 10+200 S61)	90%	Fri 17-08-25	Mon 17-09-18			08-25	09-18								
281	4 WN (km 11+900 S61)	85%	Tue 17-08-01	Thu 17-08-24		08-01	08-24									
282	Przekazanie na stan PGE	0%	Sat 17-11-04	Sun 17-12-31					11-04						12-31	
283	<b>KOLIZJE ENERGETYCZNE nn 0.4 kV</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sun 17-12-31</b>	07-03										12-31	
291	<b>KOLIZJE ENERGETYCZNE SN 20 kV</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sun 17-12-31</b>	07-03										12-31	
327	<b>ZASILANIE</b>	<b>29%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Wed 18-08-29</b>			09-04									
328	KSZR 1 (węzeł "Lotnisko")	0%	Mon 17-09-04	Fri 17-09-08			09-04	09-08								
329	KSZR 2 (DG 102026 B (WD-2))	0%	Sat 17-09-30	Mon 17-10-16				09-30	10-16							
330	Zasilanie ST 2 (km 3+570-4+580 L (WE-3 WD-4))	90%	Mon 17-09-18	Wed 17-11-08			09-18		11-08							
331	KSZR 3 (km 4+580 L)	0%	Thu 17-11-30	Thu 18-03-15					11-30							03
332	Zasilanie SO 2 (wzdłuż DW (WD-4))	0%	Thu 18-06-07	Sat 18-06-30												
333	Zasilanie SO 1 (wzdłuż DW (WD-4))	0%	Thu 18-06-07	Sat 18-06-30												
334	KSZR 4 (km 6+250 P)	0%	Mon 18-07-02	Tue 18-07-17												
335	Zasilanie SO 3 (6+250-6+700 P (WD-5))	65%	Mon 18-07-02	Wed 18-07-25												
336	Zasilanie P1 (km 7+320-7+800 P)	50%	Mon 17-09-04	Sat 17-10-07			09-04	10-07								
337	KSZR 5 (km 7+780 P)	0%	Wed 18-04-11	Wed 18-04-18												04-1
338	Zasilanie stacji ZK-M (km 7+780-8+200 P)	0%	Wed 18-05-16	Thu 18-05-31												
339	Podpisanie umowy z PGE na świadczenie usług dystrybucyjnych (1 m-c od	0%	Thu 18-07-26	Wed 18-08-29												
340	<b>OŚWIETLENIE</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-03-17</b>	<b>Fri 18-12-14</b>											03-17	
354	<b>KANAŁ TELETECHNICZNY</b>	<b>2%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Sat 18-12-08</b>			09-04									
363	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>	<b>41%</b>	<b>Mon 17-07-03</b>	<b>Sat 18-11-10</b>	07-03											
390	<b>DRENAŻ</b>	<b>10%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Mon 18-10-08</b>			09-04									
405	<b>STACJA METEO</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-06-01</b>	<b>Fri 18-06-29</b>												
407	<b>Obiekty odcinek A</b>	<b>36%</b>	<b>Tue 17-07-18</b>	<b>Thu 19-01-03</b>	07-18											
408	<b>WE 1</b>	<b>58%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Fri 18-11-16</b>	07-19											
477	<b>Korpusy filary</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Mon 17-10-02</b>	07-19				10-02							
485	<b>Korpus podpor P1 P</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Tue 17-08-08</b>	07-19		08-08									
508	<b>Filary P2 P</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-07-24</b>	<b>Mon 17-09-11</b>	07-24			09-11								
524	<b>Filary P3 L</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-07-20</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	07-20			09-04								

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
540	<b>Filary P3 P</b>	100%	Thu 17-07-27	Mon 17-10-02	07-27	07-27			10-02							
556	<b>Korpus podpor P4L</b>	100%	Mon 17-07-31	Sat 17-09-02	07-31	07-31		09-02								
563	<b>Korpus podpor P4 P</b>	100%	Mon 17-08-28	Sat 17-09-30	08-28	08-28		09-30								
570	<b>Montaż łożysk</b>	100%	Tue 17-09-05	Wed 17-10-04	09-05	09-05		10-04								
573	<b>Ścianka zapleczna</b>	0%	Wed 18-03-28	Tue 18-04-10											03-28	
576	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	Thu 18-04-19	Fri 18-06-15											04-	
587	<b>Ustrójje nośne</b>	92%	Tue 17-09-05	Thu 18-03-15	09-05											03
588	<b>Ustroj jezdni L</b>	92%	Tue 17-09-05	Thu 18-03-15	09-05											03
589	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój</b>	100%	Tue 17-09-05	Thu 17-09-21	09-05	09-21										
592	<b>Deskowanie ustroju nośnego</b>	100%	Fri 17-09-22	Fri 17-10-20	09-22	10-20										
593	Ustawienie wież rusztowania	100%	Fri 17-09-22	Mon 17-10-09	09-22	10-09										
594	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Tue 17-10-10	Fri 17-10-20	10-10	10-20										
595	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	100%	Sat 17-10-21	Fri 17-11-03	10-21	11-03										
596	Zbrojenie	100%	Sat 17-10-21	Fri 17-11-03	10-21	11-03										
597	Montaż osłonek wypychanie kabli	100%	Tue 17-10-31	Wed 17-11-01	10-31	11-01										
598	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	49%	Sat 17-11-04	Sat 17-12-02	11-04	12-02										
599	Ustrój	100%	Sat 17-11-04	Sat 17-11-04	11-04	11-04										
600	sprężenie	100%	Wed 17-11-22	Thu 17-11-23	11-22	11-23										
601	Rozdeskowanie	30%	Fri 17-11-24	Sat 17-12-02	11-24	12-02										
602	<b>Dobetonowanie dźwigara</b>	100%	Sat 17-12-09	Thu 18-03-15	12-09											03
603	Deskowanie	100%	Tue 17-12-12	Thu 17-12-14	12-12	12-14										
604	Zbrojenie	100%	Sat 17-12-09	Mon 17-12-11	12-09	12-11										
605	Betonowanie	100%	Thu 18-03-15	Thu 18-03-15											03-15	
606	<b>izolacja ustroju</b>	0%	Thu 18-03-29	Fri 18-05-11											03-29	
609	<b>Montaż dylatacji</b>	0%	Fri 18-03-16	Tue 18-03-20											03-16	
612	<b>Kapy chodnikowe</b>	0%	Fri 18-03-30	Fri 18-05-04											03-30	
619	<b>Jezdni</b>	0%	Fri 18-08-10	Mon 18-08-27											03-30	
625	<b>Ustroj jezdni P</b>	86%	Tue 17-10-03	Tue 18-03-27	10-03											
626	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój</b>	100%	Tue 17-10-03	Thu 17-10-19	10-03	10-19										

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
629	<b>Deskowanie ustroju nośnego</b>	100%	Sat 17-10-21	Sat 17-11-18					10-21	11-18				
630	Ustawienie wież rusztowania	100%	Sat 17-10-21	Tue 17-11-07					10-21	11-07				
631	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Wed 17-11-08	Sat 17-11-18					11-08	11-18				
632	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	100%	Mon 17-11-20	Sat 17-12-02					11-20	12-02				
635	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	0%	Mon 17-12-04	Thu 18-01-04					12-04	01-04				
639	<b>Dobetonowanie dźwigara</b>	100%	Wed 18-03-21	Tue 18-03-27									03-21	
640	Deskowanie	100%	Fri 18-03-23	Mon 18-03-26									03-23	
641	Zbrojenie	100%	Wed 18-03-21	Thu 18-03-22									03-21	
642	Betonowanie	100%	Tue 18-03-27	Tue 18-03-27									03-27	
643	<b>izolacja ustroju</b>	0%	Tue 18-04-10	Wed 18-05-09									04-10	
646	<b>Montaż dylatacji</b>	0%	Wed 18-03-28	Sat 18-03-31									03-28	
649	<b>Kapy chodnikowe</b>	0%	Thu 18-03-15	Mon 18-05-07									03-15	
656	<b>Jezdnia</b>	0%	Thu 18-08-16	Mon 18-08-27										
662	<b>Mur oporowy P1</b>	78%	Wed 17-08-02	Wed 18-04-18					08-02					
663	<b>Mur P1 L</b>	75%	Wed 17-08-02	Fri 18-04-06					08-02					
664	Fundament muru P1 L	100%	Wed 17-08-02	Sat 17-08-05					08-02	08-05				
665	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	73%	Mon 17-08-07	Fri 18-04-06					08-07					
666	Lico muru 0,4 H	100%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21					08-07	09-21				
667	Lico muru 0,4 do 1 H	20%	Thu 18-03-15	Fri 18-04-06									03-15	
668	<b>Mur P1 P</b>	75%	Wed 17-08-02	Fri 18-04-06					08-02					
669	Fundament muru P1 L	100%	Wed 17-08-02	Sat 17-08-05					08-02	08-05				
670	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	73%	Mon 17-08-07	Fri 18-04-06					08-07					
671	Lico muru 0,4 H	100%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21					08-07	09-21				
672	Lico muru 0,4 do 1 H	20%	Thu 18-03-15	Fri 18-04-06									03-15	
673	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	100%	Mon 17-08-07	Thu 17-09-21					08-07	09-21				
674	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	20%	Sat 18-04-07	Wed 18-04-18									04-07	
675	<b>Mur oporowy P4</b>	73%	Mon 17-09-25	Wed 18-05-23					09-25					
676	<b>Mur P4 L</b>	75%	Mon 17-09-25	Fri 18-05-11					09-25					
677	Fundament muru P2 L	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28					09-25	09-28				

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
678	<b>Mur oprowowy + zasyпка P2 L</b>	<b>73%</b>	<b>Fri 17-09-29</b>	<b>Fri 18-05-11</b>				09-29						
679	Lico muru 0,4 H	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14				09-29	11-14					
680	Lico muru 0,4 do 1 H	20%	Thu 18-04-19	Fri 18-05-11										04
681	<b>Mur P4 P</b>	<b>75%</b>	<b>Mon 17-09-25</b>	<b>Fri 18-05-11</b>				09-25						
682	Fundament muru	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28				09-25	09-28					
683	<b>Mur oprowowy + zasyпка P2 P</b>	<b>73%</b>	<b>Fri 17-09-29</b>	<b>Fri 18-05-11</b>				09-29						
684	Lico muru 0,4 H	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14				09-29	11-14					
685	Lico muru 0,4 do 1 H	20%	Thu 18-04-19	Fri 18-05-11										04
686	Zasyпка korpusu 0-0,4 H	80%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14				09-29	11-14					
687	Zasyпка korpusu 0,4H - 1 H	20%	Sat 18-05-12	Wed 18-05-23										
688	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-05-24</b>	<b>Fri 18-09-07</b>										
691	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 1	0%	Sat 18-09-08	Fri 18-11-16										
692	<b>WD 1 A</b>	<b>5%</b>	<b>Mon 17-11-06</b>	<b>Thu 18-12-27</b>					11-06					
693	<b>Roboty przygotowawcze</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-11-06</b>	<b>Thu 17-11-16</b>					11-06	11-16				
695	Organizacja zaplecza	100%	Mon 17-11-06	Thu 17-11-16					11-06	11-16				
696	<b>Roboty fundamentowe</b>	<b>43%</b>	<b>Fri 17-11-17</b>	<b>Mon 18-04-02</b>					11-17					
697	<b>Fundament P1</b>	<b>43%</b>	<b>Fri 17-11-17</b>	<b>Thu 18-03-22</b>					11-17					
698	Wykop	100%	Fri 17-11-17	Tue 17-11-21					11-17	11-21				
699	Chudy beton	100%	Wed 17-11-22	Wed 17-11-22					11-22	11-22				
700	Zbrojenie funadmentu P1	60%	Thu 17-11-23	Wed 17-11-29					11-23	11-29				
701	deskowanie +Beton fundamentu P1	0%	Wed 17-11-29	Sat 17-12-02					11-29	12-02				
702	rozdeskowanie	0%	Thu 17-12-07	Fri 17-12-08					12-07	12-08				
703	Izolacja P1	0%	Tue 18-03-20	Tue 18-03-20									03-20	0
704	Zasyпка P1	0%	Wed 18-03-21	Thu 18-03-22									03-21	0
705	<b>Fundament P2</b>	<b>43%</b>	<b>Wed 17-11-22</b>	<b>Mon 18-04-02</b>					11-22					
706	Wykop	100%	Wed 17-11-22	Sat 17-11-25					11-22	11-25				
707	Chudy beton	100%	Mon 17-11-27	Mon 17-11-27					11-27	11-27				
708	Zbrojenie funadmentu P2 L	60%	Thu 17-11-30	Wed 17-12-06					11-30	12-06				
709	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	0%	Sat 17-12-09	Wed 17-12-13					12-09	12-13				

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	





ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
913	<b>Mur P2 L</b>	45%	Sat 17-09-02	Thu 18-03-29			09-02							
914	Fundament muru P2 L	100%	Sat 17-09-02	Thu 17-09-07			09-02	09-07						
915	<b>Mur oprowowy + zasyпка P2 L</b>	40%	Fri 17-09-08	Thu 18-03-29			09-08							
916	Lico muru 0,4 H	60%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24			09-08		10-24					
917	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 17-12-07	Thu 18-03-29						12-07				
918	<b>Mur P2 P</b>	23%	Sat 17-09-02	Thu 18-03-29			09-02							
919	Fundament muru P2 P	100%	Sat 17-09-02	Thu 17-09-07			09-02	09-07						
920	<b>Mur oprowowy + zasyпка P2 P</b>	17%	Fri 17-09-08	Thu 18-03-29			09-08							
921	Lico muru 0,4 H	25%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24			09-08		10-24					
922	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Thu 17-12-07	Thu 18-03-29						12-07				
923	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	60%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24			09-08		10-24					
924	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Thu 17-12-07	Thu 18-03-29						12-07				
925	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Fri 18-03-30	Sat 18-06-30										03-30
928	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	0%	Fri 18-06-15	Thu 18-07-19										
929	<b>WE 3</b>	61%	Fri 17-07-21	Thu 18-12-13	07-21									
969	<b>Korpusy</b>	100%	Fri 17-07-21	Thu 17-10-19	07-21				10-19					
994	<b>Płyty przejściowe</b>	78%	Fri 18-05-18	Fri 18-07-06										
995	<b>Płyta P1</b>	78%	Fri 18-05-18	Wed 18-06-13										
996	beton wyrównawczy	100%	Fri 18-05-18	Fri 18-05-18										
997	zbrojenie	100%	Sat 18-05-19	Wed 18-05-23										
998	betonowanie	100%	Thu 18-05-24	Fri 18-05-25										
999	izolacja	0%	Tue 18-06-12	Wed 18-06-13										
1000	<b>Płyta P2</b>	78%	Mon 18-06-11	Fri 18-07-06										
1001	beton wyrównawczy	100%	Mon 18-06-11	Mon 18-06-11										
1002	zbrojenie	100%	Tue 18-06-12	Fri 18-06-15										
1003	betonowanie	100%	Sat 18-06-16	Mon 18-06-18										
1004	izolacja	0%	Thu 18-07-05	Fri 18-07-06										
1005	<b>Ustrój nośny</b>	100%	Fri 17-09-01	Tue 18-04-24			09-01							
1006	<b>Ustroj jezdni L</b>	100%	Fri 17-09-01	Fri 17-12-01			09-01				12-01			

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1007	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój L</b>	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-12			09-01	09-12						
1010	<b>Deskowanie ustroju nośnego L</b>	100%	Thu 17-10-12	Mon 17-10-23				10-12	10-23					
1013	<b>Zbrojenie ustroju nośnego L</b>	100%	Tue 17-10-24	Tue 17-10-31				10-24	10-31					
1014	Zbrojenie	100%	Tue 17-10-24	Tue 17-10-31				10-24	10-31					
1015	<b>Betonowanie ustroju nośnego L</b>	100%	Wed 17-11-01	Fri 17-12-01				11-01	12-01					
1018	<b>Ustrój jezdni P</b>	100%	Fri 17-10-13	Tue 18-04-24				10-13						
1030	<b>izolacja ustroju</b>	0%	Thu 18-04-19	Fri 18-10-19										04-
1036	<b>Kapy chodnikowe</b>	4%	Sat 18-04-21	Mon 18-05-28										04
1037	montaż krawężników	0%	Sat 18-04-21	Mon 18-04-30										04
1038	deskowanie pod montaż desek	0%	Tue 18-05-01	Fri 18-05-11										
1039	montaż desek gzymsowych	0%	Sat 18-05-12	Mon 18-05-21										
1040	montaż zbrojenia	30%	Tue 18-05-22	Fri 18-05-25										
1041	betonowanie kapy chodnikowej	0%	Sat 18-05-26	Mon 18-05-28										
1042	drenaż pod kapą chodnikową	0%	Sat 18-05-26	Mon 18-05-28										
1043	<b>Jezdnie</b>	0%	Wed 18-10-17	Tue 18-10-23										
1048	<b>Mur oporowy P1</b>	62%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17				09-08						
1049	<b>Mur P1 L</b>	90%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17				09-08						
1051	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	90%	Fri 17-09-08	Thu 18-05-17				09-08						
1052	Lico muru 0,4 H	100%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24				09-08	10-24					
1053	Lico muru 0,4 do 1 H	70%	Wed 18-04-25	Thu 18-05-17										0
1054	<b>Mur P1 P</b>	7%	Fri 17-10-20	Thu 18-05-17				10-20						
1056	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	7%	Fri 17-10-20	Thu 18-05-17				10-20						
1059	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	100%	Wed 17-12-06	Fri 18-04-20										
1060	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	70%	Wed 18-04-25	Thu 18-05-17										0
1061	<b>Mur oporowy P2</b>	90%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09				09-29						
1062	<b>Mur P2 L</b>	90%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09				09-29						
1064	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	90%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09				09-29						
1065	Lico muru 0,4 H	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14				09-29	11-14					
1066	Lico muru 0,4 do 1 H	70%	Fri 18-05-18	Sat 18-06-09										

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1067	<b>Mur P2 P</b>	90%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09				09-29					
1069	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 P</b>	90%	Fri 17-09-29	Sat 18-06-09				09-29					
1070	Lico muru 0,4 H	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14				09-29					
1071	Lico muru 0,4 do 1 H	70%	Fri 18-05-18	Sat 18-06-09									
1072	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-11-14				09-29					
1073	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	70%	Fri 18-05-18	Sat 18-06-09									
1074	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Mon 18-06-11	Sat 18-09-22									
1076	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 3	0%	Tue 18-10-23	Thu 18-12-13									
1077	<b>WD 4</b>	57%	Fri 17-07-21	Fri 18-08-03	07-21								
1098	<b>Korpusy</b>	63%	Fri 17-07-21	Sat 18-03-17	07-21								
1099	<b>Korpus podpor P1</b>	100%	Fri 17-07-21	Fri 17-08-11	07-21			08-11					
1104	Izolacja podpory P1	100%	Thu 17-08-10	Fri 17-08-11				08-10					
1105	Ciosy podłożyskowe	100%	Fri 17-07-21	Sat 17-07-22	07-21			07-22					
1106	<b>Korpus podpor P2</b>	100%	Fri 17-07-21	Wed 17-08-09	07-21			08-09					
1109	Betonowanie P2	100%	Fri 17-07-21	Fri 17-07-21	07-21			07-21					
1110	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Mon 17-07-31	Tue 17-08-01				07-31					
1111	Izolacja podpory P2	100%	Tue 17-08-08	Wed 17-08-09				08-08					
1112	Ciosy podłożyskowe	100%	Wed 17-08-02	Thu 17-08-03				08-02					
1113	Montaż łożysk	100%	Sat 17-09-23	Wed 17-09-27					09-23				
1114	<b>Ścianka zapleczna</b>	0%	Fri 17-12-08	Sat 18-03-17						12-08			
1117	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	Sat 18-03-17	Fri 18-05-04								03-17	
1128	<b>Ustrój nośny</b>	100%	Wed 17-08-02	Thu 17-12-07	08-02						12-07		
1144	izolacja ustroju	0%	Mon 17-11-27	Mon 18-06-11							11-27		
1147	Montaż dylatacji	0%	Mon 18-03-19	Sat 18-03-24								03-19	
1150	Kapy chodnikowe	0%	Tue 17-11-28	Fri 18-03-30								11-28	
1157	Jezdnia	0%	Tue 18-06-19	Sat 18-06-30									
1163	<b>Mur oporowy P1</b>	84%	Mon 17-08-28	Mon 18-03-19	08-28								
1164	<b>Mur P1 L</b>	84%	Mon 17-08-28	Mon 18-03-19	08-28								
1165	Fundament muru P1 L	100%	Mon 17-08-28	Thu 17-08-31	08-28			08-31					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	Gantt Chart											
					Jun	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
1166	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	83%	Fri 17-09-01	Mon 18-03-19			09-01							0		
1167	Lico muru 0,4 H	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17			09-01		10-17							
1168	Lico muru 0,4 do 1 H	50%	Mon 17-11-27	Mon 18-03-19						11-27				03		
1169	<b>Mur P1 P</b>	84%	Mon 17-08-28	Mon 18-03-19			08-28							0		
1170	Fundament muru P1 P	100%	Mon 17-08-28	Thu 17-08-31			08-28		08-31							
1171	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	83%	Fri 17-09-01	Mon 18-03-19			09-01							0		
1172	Lico muru 0,4 H	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17			09-01		10-17							
1173	Lico muru 0,4 do 1 H	50%	Mon 17-11-27	Mon 18-03-19						11-27				03		
1174	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17			09-01		10-17							
1175	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	50%	Mon 17-11-27	Mon 18-03-19						11-27				03		
1176	<b>Mur oporowy P2</b>	57%	Fri 17-09-01	Wed 18-04-11			09-01									
1177	<b>Mur P2 L</b>	84%	Fri 17-09-01	Wed 18-04-11			09-01									
1178	Fundament muru P2 L	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-05			09-01		09-05							
1179	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	83%	Wed 17-09-06	Wed 18-04-11			09-06									
1180	Lico muru 0,4 H	100%	Wed 17-09-06	Sat 17-10-21			09-06		10-21							
1181	Lico muru 0,4 do 1 H	50%	Tue 18-03-20	Wed 18-04-11									03-20			
1182	<b>Mur P2 P</b>	6%	Fri 17-09-01	Wed 18-04-11			09-01									
1183	Fundament muru P2 P	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-05			09-01		09-05							
1184	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 P</b>	0%	Wed 17-09-06	Wed 18-04-11			09-06									
1187	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	100%	Wed 17-09-06	Sat 17-10-21			09-06		10-21							
1188	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	50%	Tue 18-03-20	Wed 18-04-11									03-20			
1189	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Thu 18-04-12	Sat 18-06-30									04-11			
1192	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WD 4	0%	Sat 18-06-30	Fri 18-08-03												
1193	<b>WD 5</b>	18%	Mon 17-07-24	Mon 18-08-06			07-24									
1214	<b>Korpusy</b>	100%	Mon 17-07-24	Wed 17-09-27			07-24		09-27							
1229	Montaż łożysk	100%	Tue 17-10-10	Tue 17-10-10					10-10		10-10					
1230	<b>Ścianka zapleczna</b>	0%	Wed 18-04-11	Mon 18-04-16									04-11			
1233	<b>Płyty przejściowe</b>	0%	Mon 18-04-16	Sat 18-06-02									04-11			
1244	<b>Ustrój nośny</b>	78%	Thu 17-09-21	Wed 18-04-04			09-21									

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1245	<b>Ustroj</b>	<b>78%</b>	<b>Thu 17-09-21</b>	<b>Wed 18-04-04</b>					09-21						
1246	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-09-21</b>	<b>Mon 17-10-09</b>					09-21	10-09					
1247	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Thu 17-09-21	Mon 17-10-02					09-21	10-02					
1248	Ułożenie płyt drogowych	100%	Tue 17-10-03	Mon 17-10-09					10-03	10-09					
1249	<b>Deskowanie ustroju nośnego</b>	<b>100%</b>	<b>Tue 17-10-10</b>	<b>Sat 17-11-04</b>					10-10	11-04					
1250	Ustawienie wież rusztowania	100%	Tue 17-10-10	Thu 17-10-26					10-10	10-26					
1251	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-11-04					10-27	11-04					
1252	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-11-06</b>	<b>Thu 17-11-16</b>					11-06	11-16					
1253	Zbrojenie	100%	Mon 17-11-06	Thu 17-11-16					11-06	11-16					
1254	Montaż osłonek wpychanie kabli	100%	Tue 17-11-14	Thu 17-11-16					11-14	11-16					
1255	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	<b>13%</b>	<b>Fri 17-11-17</b>	<b>Tue 18-03-20</b>					11-17						
1256	Ustrój	100%	Fri 17-11-17	Fri 17-11-17					11-17	11-17					
1257	sprężenie	0%	Wed 17-12-13	Wed 17-12-13					12-13	12-13					
1258	Rozdeskowanie	0%	Thu 17-12-14	Tue 18-03-20					12-14						
1259	<b>Dobetonowanie dzwigara</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-03-27</b>	<b>Wed 18-04-04</b>										03-27	
1263	<b>izolacja ustroju</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-04-13</b>	<b>Sat 18-05-05</b>										04-1	
1266	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-04-17</b>	<b>Mon 18-04-23</b>										04-1	
1269	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-04-14</b>	<b>Tue 18-05-15</b>										04-1	
1276	<b>Jezdnia</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-06-22</b>	<b>Mon 18-07-02</b>											
1282	<b>Mur oporowy P1</b>	<b>4%</b>	<b>Tue 17-09-26</b>	<b>Tue 18-04-17</b>					09-26						
1283	<b>Mur P1 L</b>	<b>6%</b>	<b>Tue 17-09-26</b>	<b>Tue 18-04-17</b>					09-26						
1284	Fundament muru P1 L	100%	Tue 17-09-26	Fri 17-09-29					09-26	09-29					
1285	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 17-09-30</b>	<b>Tue 18-04-17</b>					09-30						
1288	<b>Mur P1 P</b>	<b>6%</b>	<b>Thu 17-09-28</b>	<b>Tue 18-04-17</b>					09-28						
1289	Fundament muru P1 L	100%	Thu 17-09-28	Mon 17-10-02					09-28	10-02					
1290	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 17-10-03</b>	<b>Tue 18-04-17</b>					10-03						
1293	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Tue 17-10-03	Fri 17-11-17					10-03	11-17					
1294	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Mon 18-03-26	Tue 18-04-17										03-26	
1295	<b>Mur oporowy P2</b>	<b>4%</b>	<b>Thu 17-09-21</b>	<b>Thu 18-05-10</b>					09-21						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1296	<b>Mur P2 L</b>	6%	Thu 17-09-21	Thu 18-05-10				09-21						
1297	Fundament muru P2 L	100%	Thu 17-09-21	Mon 17-09-25				09-21	09-25					
1298	<b>Mur oprowowy + zasyпка P2 L</b>	0%	Tue 17-09-26	Thu 18-05-10				09-26						
1301	<b>Mur P2 P</b>	6%	Sat 17-09-30	Thu 18-05-10				09-30						
1302	Fundament muru P2 P	100%	Sat 17-09-30	Wed 17-10-04				09-30	10-04					
1303	<b>Mur oprowowy + zasyпка P2 P</b>	0%	Thu 17-10-05	Thu 18-05-10				10-05						
1306	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	0%	Thu 17-10-05	Mon 17-11-20				10-05	11-20					
1307	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Wed 18-04-18	Thu 18-05-10										04
1308	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Fri 18-05-11	Thu 18-07-19										
1311	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WD 5	0%	Tue 18-05-29	Mon 18-08-06										
1312	<b>PZ 6</b>	36%	Mon 17-07-24	Fri 18-12-28	07-24									
1315	<b>Roboty fundamentowe</b>	90%	Mon 17-07-24	Mon 17-11-20	07-24				11-20					
1316	<b>Fundament P1L</b>	90%	Mon 17-09-25	Mon 17-11-20				09-25	11-20					
1317	Wykop	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28				09-25	09-28					
1318	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-29	Thu 17-10-05				09-29	10-05					
1319	Chudy beton	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06				10-06	10-06					
1320	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Sat 17-10-07	Thu 17-10-12				10-07	10-12					
1321	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Fri 17-10-13	Sat 17-10-14				10-13	10-14					
1322	rozdeskowanie	100%	Thu 17-10-19	Fri 17-10-20				10-19	10-20					
1323	Izolacja P1	50%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01				11-01	11-01					
1324	Zasyпка P1	50%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20				11-16	11-20					
1325	<b>Fundament P1P</b>	90%	Mon 17-09-25	Mon 17-11-20				09-25	11-20					
1326	Wykop	100%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28				09-25	09-28					
1327	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-29	Thu 17-10-05				09-29	10-05					
1328	Chudy beton	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06				10-06	10-06					
1329	Zbrojenie fundamentu P1	100%	Sat 17-10-21	Thu 17-10-26				10-21	10-26					
1330	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-10-28				10-27	10-28					
1331	rozdeskowanie	100%	Thu 17-11-02	Fri 17-11-03				11-02	11-03					
1332	Izolacja P1	50%	Wed 17-11-15	Wed 17-11-15				11-15	11-15					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
1333	Zasyпка P1	50%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20												
1334	<b>Fundament P2 L</b>	<b>90%</b>	<b>Mon 17-09-04</b>	<b>Mon 17-10-16</b>												
1335	Wykop	100%	Mon 17-09-04	Thu 17-09-07												
1336	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-08	Thu 17-09-14												
1337	Chudy beton	100%	Fri 17-09-15	Fri 17-09-15												
1338	Zbrojenie fundamentu P2 L	100%	Sat 17-09-16	Thu 17-09-21												
1339	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Fri 17-09-22	Sat 17-09-23												
1340	rozdeskowanie	100%	Thu 17-09-28	Thu 17-09-28												
1341	Izolacja P2 L	50%	Wed 17-10-11	Wed 17-10-11												
1342	Zasyпка P2 L	50%	Thu 17-10-12	Mon 17-10-16												
1343	<b>Fundament P2 P</b>	<b>90%</b>	<b>Fri 17-09-01</b>	<b>Sat 17-09-30</b>												
1344	Wykop	100%	Mon 17-09-04	Thu 17-09-07												
1345	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-08	Thu 17-09-14												
1346	Chudy beton	100%	Fri 17-09-15	Fri 17-09-15												
1347	Zbrojenie fundadmentu P2 L	100%	Fri 17-09-01	Wed 17-09-06												
1348	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Thu 17-09-07	Fri 17-09-08												
1349	rozdeskowanie	100%	Wed 17-09-13	Wed 17-09-13												
1350	Izolacja P2 L	50%	Tue 17-09-26	Tue 17-09-26												
1351	Zasyпка P2 L	50%	Wed 17-09-27	Sat 17-09-30												
1352	<b>Fundament P3 L</b>	<b>90%</b>	<b>Mon 17-08-14</b>	<b>Sat 17-09-16</b>												
1353	Wykop	100%	Mon 17-08-14	Thu 17-08-17												
1354	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-08-18	Thu 17-08-24												
1355	Chudy beton	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-08-25												
1356	Zbrojenie fundamentu	100%	Sat 17-08-26	Thu 17-08-31												
1357	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-09-01	Sat 17-09-02												
1358	rozbiorka	100%	Thu 17-09-07	Thu 17-09-07												
1359	Izolacja	50%	Tue 17-09-12	Tue 17-09-12												
1360	Zasyпка	50%	Wed 17-09-13	Sat 17-09-16												
1361	<b>Fundament P3 P</b>	<b>90%</b>	<b>Mon 17-08-14</b>	<b>Thu 17-09-28</b>												

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1362	Wykop	100%	Mon 17-08-14	Thu 17-08-17			08-14	08-17						
1363	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-08-18	Thu 17-08-24			08-18	08-24						
1364	Chudy beton	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-08-25			08-25	08-25						
1365	Zbrojenie fundamentu	100%	Thu 17-09-07	Tue 17-09-12			09-07	09-12						
1366	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Wed 17-09-13	Thu 17-09-14			09-13	09-14						
1367	rozdeskowanie	100%	Tue 17-09-19	Tue 17-09-19			09-19	09-19						
1368	Izolacja	50%	Sat 17-09-23	Sat 17-09-23			09-23	09-23						
1369	Zasyпка	50%	Mon 17-09-25	Thu 17-09-28			09-25	09-28						
1370	<b>Fundament P4 L</b>	<b>90%</b>	<b>Mon 17-07-24</b>	<b>Sat 17-08-26</b>			07-24	08-26						
1371	Wykop	100%	Mon 17-07-24	Thu 17-07-27			07-24	07-27						
1372	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-07-28	Thu 17-08-03			07-28	08-03						
1373	Chudy beton	100%	Fri 17-08-04	Fri 17-08-04			08-04	08-04						
1374	Zbrojenie fundamentu	100%	Sat 17-08-05	Thu 17-08-10			08-05	08-10						
1375	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-08-11	Sat 17-08-12			08-11	08-12						
1376	rozdeskowanie	100%	Thu 17-08-17	Fri 17-08-18			08-17	08-18						
1377	Izolacja	50%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22			08-22	08-22						
1378	Zasyпка	50%	Wed 17-08-23	Sat 17-08-26			08-23	08-26						
1379	<b>Fundament P4 P</b>	<b>90%</b>	<b>Mon 17-07-24</b>	<b>Mon 17-09-04</b>			07-24	09-04						
1380	Wykop	100%	Mon 17-07-24	Thu 17-07-27			07-24	07-27						
1381	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-07-28	Thu 17-08-03			07-28	08-03						
1382	Chudy beton	100%	Fri 17-08-04	Fri 17-08-04			08-04	08-04						
1383	Zbrojenie funadmentu	100%	Fri 17-08-11	Wed 17-08-16			08-11	08-16						
1384	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Sat 17-08-19	Mon 17-08-21			08-19	08-21						
1385	rozdeskowanie	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-08-25			08-25	08-25						
1386	Izolacja	50%	Wed 17-08-30	Wed 17-08-30			08-30	08-30						
1387	Zasyпка	50%	Thu 17-08-31	Mon 17-09-04			08-31	09-04						
1388	<b>Korpusy filary</b>	<b>82%</b>	<b>Sat 17-08-26</b>	<b>Thu 18-04-19</b>			08-26							
1389	<b>Korpus podpor P1L</b>	<b>96%</b>	<b>Sat 17-11-04</b>	<b>Mon 18-03-19</b>					11-04					0
1390	Zbrojenie podpory	100%	Sat 17-11-04	Wed 17-11-08					11-04					11-08

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1391	Deskowanie podpory	100%	Mon 17-11-06	Sat 17-11-18					11-06	11-18			
1392	Betonowanie	100%	Mon 17-11-20	Mon 17-11-20					11-20	11-20			
1393	Rozdeskowanie podpory	100%	Mon 17-11-27	Tue 17-11-28					11-27	11-28			
1394	Izolacja podpory	0%	Thu 17-12-07	Thu 17-12-07					12-07	12-07			
1395	Ciosy podłożyskowe	100%	Fri 17-12-08	Sat 17-12-09					12-08	12-09			
1396	<b>Podparcie belki</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-12-13</b>	<b>Mon 18-03-19</b>					12-13				
1397	Deskowanie poprzecznic etap 1	100%	Wed 17-12-13	Thu 18-03-15					12-13				
1398	Zbrojenie poprzecznic etap 1	100%	Fri 18-03-16	Sat 18-03-17								03-16	03-16
1399	Betonowanie poprzecznic	100%	Mon 18-03-19	Mon 18-03-19								03-19	03-19
1400	<b>Korpus podpor P1 P</b>	<b>71%</b>	<b>Mon 17-10-30</b>	<b>Mon 18-04-02</b>					10-30				
1401	Zbrojenie podpory	100%	Sat 17-11-25	Sat 17-12-02					11-25	12-02			
1402	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-11-29	Tue 17-12-12					11-29	12-12			
1403	Betonowanie	100%	Wed 17-12-13	Wed 17-12-13					12-13	12-13			
1404	Rozdeskowanie podpory	100%	Sat 18-03-17	Mon 18-03-19								03-17	03-17
1405	Izolacja podpory	0%	Fri 18-03-30	Fri 18-03-30								03-30	03-30
1406	Ciosy podłożyskowe	0%	Sat 18-03-31	Mon 18-04-02								03-31	03-31
1407	<b>Podparcie belki</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 17-10-30</b>	<b>Sat 17-11-04</b>					10-30	11-04			
1408	Deskowanie poprzecznic etap 1	0%	Mon 17-10-30	Wed 17-11-01					10-30	11-01			
1409	Zbrojenie poprzecznic etap 1	0%	Thu 17-11-02	Fri 17-11-03					11-02	11-03			
1410	Betonowanie poprzecznic	0%	Sat 17-11-04	Sat 17-11-04					11-04	11-04			
1411	<b>Filary P2 L</b>	<b>94%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Wed 17-11-08</b>					09-14	11-08			
1412	Zbrojenie filary	100%	Fri 17-09-29	Thu 17-10-05					09-29	10-05			
1413	<b>P2 L1</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Wed 17-09-27</b>					09-14	09-27			
1414	Deskowanie podpory	100%	Thu 17-09-14	Mon 17-09-18					09-14	09-18			
1415	Betonowanie	100%	Tue 17-09-19	Tue 17-09-19					09-19	09-19			
1416	Rozdeskowanie podpory	100%	Tue 17-09-26	Wed 17-09-27					09-26	09-27			
1417	<b>P2 L2</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-09-28</b>	<b>Wed 17-10-11</b>					09-28	10-11			
1418	Deskowanie podpory	100%	Thu 17-09-28	Mon 17-10-02					09-28	10-02			
1419	Betonowanie	100%	Tue 17-10-03	Tue 17-10-03					10-03	10-03			

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1420	Rozdeskowanie podpory	100%	Tue 17-10-10	Wed 17-10-11				10-10	10-11						
1421	<b>P2 L3</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-10-12</b>	<b>Wed 17-10-25</b>				10-12	10-25						
1422	Deskowanie podpory	100%	Thu 17-10-12	Mon 17-10-16				10-12	10-16						
1423	Betonowanie	100%	Tue 17-10-17	Tue 17-10-17				10-17	10-17						
1424	Rozdeskowanie podpory	100%	Tue 17-10-24	Wed 17-10-25				10-24	10-25						
1425	Izolacja podpory	50%	Fri 17-11-03	Fri 17-11-03				11-03	11-03						
1426	Zasyпка podpory	50%	Sat 17-11-04	Wed 17-11-08				11-04	11-08						
1427	<b>Oczep P2L</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-10-26</b>	<b>Fri 17-11-03</b>				10-26	11-03						
1428	Deskowanie oczepu	100%	Thu 17-10-26	Mon 17-10-30				10-26	10-30						
1429	Zbrojenie oczepu	100%	Tue 17-10-31	Thu 17-11-02				10-31	11-02						
1430	Beton oczepu	100%	Fri 17-11-03	Fri 17-11-03				11-03	11-03						
1431	<b>Filary P2 P</b>	<b>72%</b>	<b>Fri 17-10-06</b>	<b>Tue 17-12-12</b>				10-06	12-12						
1432	Zbrojenie filary	100%	Fri 17-10-06	Thu 17-10-12				10-06	10-12						
1433	<b>P2 P4</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-10-26</b>	<b>Mon 17-11-06</b>				10-26	11-06						
1434	Deskowanie podpory	100%	Thu 17-10-26	Mon 17-10-30				10-26	10-30						
1435	Betonowanie	100%	Tue 17-10-31	Tue 17-10-31				10-31	10-31						
1436	Rozdeskowanie podpory	100%	Sat 17-11-04	Mon 17-11-06				11-04	11-06						
1437	<b>P2 P5</b>	<b>100%</b>	<b>Tue 17-11-07</b>	<b>Tue 17-11-14</b>				11-07	11-14						
1438	Deskowanie podpory	100%	Tue 17-11-07	Fri 17-11-10				11-07	11-10						
1439	Betonowanie	100%	Sat 17-11-11	Sat 17-11-11				11-11	11-11						
1440	Rozdeskowanie podpory	100%	Mon 17-11-13	Tue 17-11-14				11-13	11-14						
1441	<b>P2 P6</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-11-15</b>	<b>Tue 17-11-28</b>				11-15	11-28						
1442	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-11-15	Sat 17-11-18				11-15	11-18						
1443	Betonowanie	100%	Mon 17-11-20	Mon 17-11-20				11-20	11-20						
1444	Rozdeskowanie podpory	100%	Mon 17-11-27	Tue 17-11-28				11-27	11-28						
1445	Izolacja podpory	50%	Thu 17-12-07	Thu 17-12-07				12-07	12-07						
1446	Zasyпка podpory	50%	Fri 17-12-08	Tue 17-12-12				12-08	12-12						
1447	<b>Oczep P2P</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 17-11-29</b>	<b>Fri 17-12-08</b>				11-29	12-08						
1448	Deskowanie oczepu	0%	Wed 17-11-29	Sat 17-12-02				11-29	12-02						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
1449	Zbrojenie oczepu	0%	Mon 17-12-04	Wed 17-12-06								12-04	12-06			
1450	Beton oczepu	0%	Thu 17-12-07	Fri 17-12-08								12-07	12-08			
1451	<b>Filary P3 L</b>	<b>94%</b>	<b>Wed 17-09-20</b>	<b>Sat 17-11-11</b>				09-20						11-11		
1452	Zbrojenie podpory	100%	Wed 17-09-20	Tue 17-09-26				09-20		09-26						
1453	<b>P3 L1</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-09-27</b>	<b>Tue 17-10-10</b>				09-27		10-10						
1454	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-09-27	Sat 17-09-30				09-27		09-30						
1455	Betonowanie	100%	Mon 17-10-02	Mon 17-10-02				10-02		10-02						
1456	Rozdeskowanie podpory	100%	Mon 17-10-09	Tue 17-10-10				10-09		10-10						
1457	<b>P3 L2</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-10-11</b>	<b>Tue 17-10-24</b>				10-11		10-24						
1458	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-10-11	Sat 17-10-14				10-11		10-14						
1459	Betonowanie	100%	Mon 17-10-16	Mon 17-10-16				10-16		10-16						
1460	Rozdeskowanie podpory	100%	Mon 17-10-23	Tue 17-10-24				10-23		10-24						
1461	<b>P3 L3</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-10-16</b>	<b>Sat 17-10-28</b>				10-16		10-28						
1462	Deskowanie podpory	100%	Mon 17-10-16	Thu 17-10-19				10-16		10-19						
1463	Betonowanie	100%	Fri 17-10-20	Fri 17-10-20				10-20		10-20						
1464	Rozdeskowanie podpory	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-10-28				10-27		10-28						
1465	Izolacja podpory	50%	Tue 17-11-07	Tue 17-11-07				11-07		11-07						
1466	Zasyпка podpory	50%	Wed 17-11-08	Sat 17-11-11				11-08		11-11						
1467	<b>Oczep P3L</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-10-30</b>	<b>Wed 17-11-08</b>				10-30		11-08						
1468	Deskowanie oczepu	100%	Mon 17-10-30	Thu 17-11-02				10-30		11-02						
1469	Zbrojenie oczepu	100%	Fri 17-11-03	Mon 17-11-06				11-03		11-06						
1470	Beton oczepu	100%	Tue 17-11-07	Wed 17-11-08				11-07		11-08						
1471	<b>Filary P3 P</b>	<b>72%</b>	<b>Fri 17-10-06</b>	<b>Thu 18-04-19</b>				10-06								
1472	Zbrojenie podpory	100%	Fri 17-10-06	Thu 17-10-12				10-06		10-12						
1473	<b>P3 P4</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-11-29</b>	<b>Tue 17-12-12</b>						11-29				12-12		
1474	Deskowanie podpory	100%	Wed 17-11-29	Sat 17-12-02						11-29				12-02		
1475	Betonowanie	100%	Mon 17-12-04	Mon 17-12-04						12-04				12-04		
1476	Rozdeskowanie podpory	100%	Mon 17-12-11	Tue 17-12-12						12-11				12-12		
1477	<b>P3 P5</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-12-13</b>	<b>Mon 18-03-26</b>						12-13						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	






ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1507	Izolacja podpory	0%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01					11-01	11-01			
1508	Ciosy podłozyskowe	0%	Thu 17-10-26	Fri 17-10-27					10-26	10-27			
1509	<b>Podparcie belki</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 17-10-30</b>	<b>Sat 17-11-04</b>					10-30	11-04			
1513	<b>Montaż łożysk</b>	<b>67%</b>	<b>Sat 17-10-28</b>	<b>Tue 17-12-12</b>					10-28		12-12		
1514	Jezdnia L	100%	Mon 17-12-11	Tue 17-12-12							12-11	12-12	
1515	Jezdnia P	0%	Sat 17-10-28	Sat 17-10-28					10-28	10-28			
1516	<b>Ścianka zaplecza</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-07-17</b>	<b>Mon 18-07-30</b>									
1519	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-08-09</b>	<b>Thu 18-09-27</b>									
1530	<b>Ustrój nośne</b>	<b>8%</b>	<b>Thu 18-04-05</b>	<b>Thu 18-11-01</b>									04-05
1531	<b>Ustroj jezdni L</b>	<b>17%</b>	<b>Thu 18-04-05</b>	<b>Wed 18-10-24</b>									04-05
1532	<b>Belki typu T montaż</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 18-04-05</b>	<b>Fri 18-04-20</b>									04-05
1533	Montaż belek prefabrykowanych	100%	Thu 18-04-05	Mon 18-04-16									04-05
1534	montaż deskowania traconego	100%	Tue 18-04-17	Fri 18-04-20									04-
1535	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-04-21</b>	<b>Mon 18-05-07</b>									04
1536	Zbrojenie	0%	Sat 18-04-21	Mon 18-05-07									04
1537	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-05-08</b>	<b>Mon 18-06-11</b>									
1538	Ustrój	0%	Tue 18-05-08	Tue 18-05-08									
1539	Rozdeskowanie	0%	Sat 18-06-02	Mon 18-06-11									
1540	<b>izolacja ustroju</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-06-25</b>	<b>Fri 18-08-24</b>									
1541	Izolacja pod kapami chodnikowymi	0%	Mon 18-06-25	Mon 18-06-25									
1542	Izolacja jezdni	0%	Thu 18-08-23	Fri 18-08-24									
1543	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-06-12</b>	<b>Fri 18-06-15</b>									
1544	Montaż	0%	Tue 18-06-12	Wed 18-06-13									
1545	Deskowanie + Betonowanie	0%	Thu 18-06-14	Fri 18-06-15									
1546	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-06-26</b>	<b>Wed 18-07-25</b>									
1547	montaż krawężników	0%	Tue 18-06-26	Fri 18-06-29									
1548	montaż deskowania pod deski gzymsowe	0%	Sat 18-06-30	Wed 18-07-11									
1549	montaż desek gzymsowych	0%	Thu 18-07-12	Tue 18-07-17									
1550	montaż zbrojenia	0%	Wed 18-07-18	Mon 18-07-23									


Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1551	betonowanie kapy chodnikowej	0%	Tue 18-07-24	Wed 18-07-25											
1552	drenaż pod kapą chodnikową	0%	Sat 18-06-30	Mon 18-07-02											
1553	<b>Jezdnia</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-09-29</b>	<b>Wed 18-10-24</b>											
1554	Korytka	0%	Fri 18-10-19	Wed 18-10-24											
1555	asfalt twardolany	0%	Thu 18-10-04	Thu 18-10-04											
1556	drenaz	0%	Sat 18-09-29	Mon 18-10-01											
1557	sma	0%	Fri 18-10-05	Fri 18-10-05											
1558	przeciwspadki	0%	Sat 18-10-06	Sat 18-10-06											
1559	<b>Ustroj jezdni P</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-05-09</b>	<b>Thu 18-11-01</b>											
1587	<b>Mur oporowy P1</b>	<b>4%</b>	<b>Fri 17-12-08</b>	<b>Wed 18-08-08</b>											
1588	<b>Mur P1 L</b>	<b>5%</b>	<b>Fri 17-12-08</b>	<b>Wed 18-08-08</b>											
1589	Fundament muru P1 L	100%	Fri 17-12-08	Tue 17-12-12											
1590	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 17-12-13</b>	<b>Wed 18-08-08</b>											
1591	Lico muru 0,4 H	0%	Wed 17-12-13	Wed 18-05-09											
1592	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Tue 18-07-17	Wed 18-08-08											
1593	<b>Mur P1 P</b>	<b>5%</b>	<b>Sat 18-03-31</b>	<b>Wed 18-08-08</b>											
1594	Fundament muru P1 L	100%	Sat 18-03-31	Wed 18-04-04											
1595	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-04-05</b>	<b>Wed 18-08-08</b>											
1596	Lico muru 0,4 H	0%	Thu 18-04-05	Fri 18-06-01											
1597	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Tue 18-07-17	Wed 18-08-08											
1598	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Thu 18-04-05	Fri 18-06-01											
1599	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Tue 18-07-17	Wed 18-08-08											
1600	<b>Mur oporowy P4</b>	<b>4%</b>	<b>Thu 17-10-05</b>	<b>Fri 18-08-31</b>											
1601	<b>Mur P4 L</b>	<b>5%</b>	<b>Thu 17-10-05</b>	<b>Fri 18-08-31</b>											
1602	Fundament muru P2 L	100%	Thu 17-10-05	Mon 17-10-09											
1603	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 17-10-10</b>	<b>Fri 18-08-31</b>											
1606	<b>Mur P4 P</b>	<b>5%</b>	<b>Thu 17-11-02</b>	<b>Fri 18-08-31</b>											
1607	Fundament muru	100%	Thu 17-11-02	Mon 17-11-06											
1608	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 P</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 17-11-07</b>	<b>Fri 18-08-31</b>											

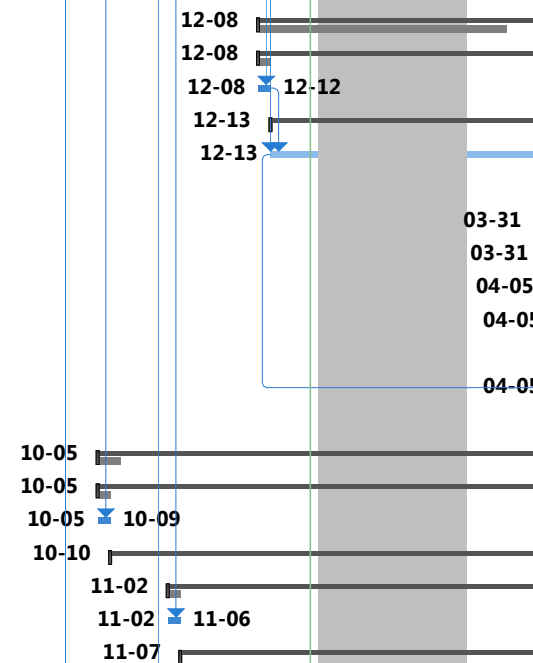


Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1611	Zasyпка korpusu 0-0,4 H	0%	Tue 17-11-07	Tue 18-04-03					11-07				
1612	Zasyпка korpusu 0,4H - 1 H	0%	Thu 18-08-09	Fri 18-08-31									
1613	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-09-01</b>	<b>Fri 18-11-09</b>									
1616	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie PZ6	0%	Fri 18-10-05	Fri 18-12-28									
1617	<b>WE 7.1</b>	<b>12%</b>	<b>Mon 17-08-14</b>	<b>Fri 18-12-07</b>									
1657	<b>Korpusy</b>	<b>91%</b>	<b>Mon 17-08-14</b>	<b>Thu 17-11-23</b>									
1658	<b>Korpus podpor P1L</b>	<b>94%</b>	<b>Mon 17-08-14</b>	<b>Thu 17-09-21</b>									
1659	Zbrojenie podpory P1	100%	Mon 17-08-14	Fri 17-08-18									
1660	Deskowanie podpory P1	100%	Fri 17-08-25	Sat 17-09-02									
1661	Betonowanie P1	100%	Mon 17-09-04	Mon 17-09-04									
1662	Rozdeskowanie podpory P1	100%	Wed 17-09-13	Thu 17-09-14									
1663	Izolacja podpory P1	0%	Thu 17-09-21	Thu 17-09-21									
1664	<b>Korpus podpor P1P</b>	<b>94%</b>	<b>Wed 17-09-13</b>	<b>Thu 17-10-12</b>									
1665	Zbrojenie podpory P1	100%	Wed 17-09-13	Mon 17-09-18									
1666	Deskowanie podpory P1	100%	Fri 17-09-15	Sat 17-09-23									
1667	Betonowanie P1	100%	Mon 17-09-25	Mon 17-09-25									
1668	Rozdeskowanie podpory P1	100%	Wed 17-10-04	Thu 17-10-05									
1669	Izolacja podpory P1	0%	Thu 17-10-12	Thu 17-10-12									
1670	<b>Korpus podpor P2 L</b>	<b>82%</b>	<b>Tue 17-09-19</b>	<b>Thu 17-11-02</b>									
1671	Zbrojenie podpory P2	100%	Tue 17-09-19	Sat 17-09-23									
1672	Deskowanie podpory P2	100%	Fri 17-10-06	Sat 17-10-14									
1673	Betonowanie P2	100%	Mon 17-10-16	Mon 17-10-16									
1674	Rozdeskowanie podpory P2	0%	Wed 17-10-25	Thu 17-10-26									
1675	Izolacja podpory P2	0%	Thu 17-11-02	Thu 17-11-02									
1676	<b>Korpus podpor P2 P</b>	<b>94%</b>	<b>Wed 17-10-25</b>	<b>Thu 17-11-23</b>									
1677	Zbrojenie podpory P2	100%	Wed 17-10-25	Mon 17-10-30									
1678	Deskowanie podpory P2	100%	Fri 17-10-27	Sat 17-11-04									
1679	Betonowanie P2	100%	Mon 17-11-06	Mon 17-11-06									
1680	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Wed 17-11-15	Thu 17-11-16									

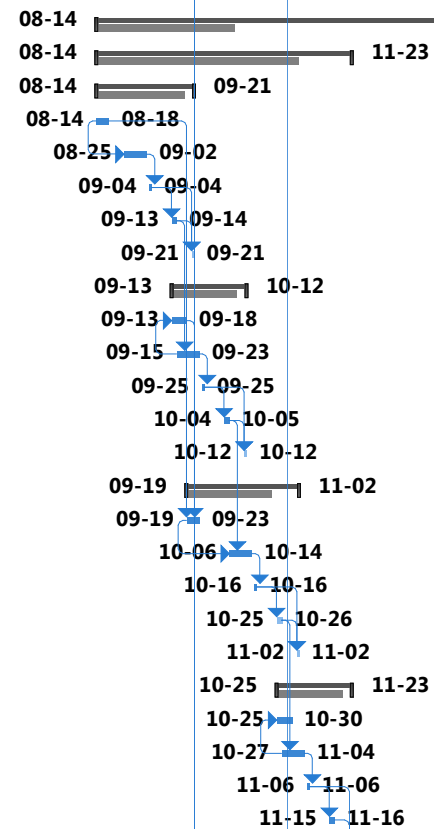

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1									
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar						
1681	Izolacja podpory P2	0%	Thu 17-11-23	Thu 17-11-23																
1682	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-05-12</b>	<b>Thu 18-08-30</b>																
1693	<b>Ustrój nośny</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-10-27</b>	<b>Fri 18-05-04</b>																
1718	izolacja ustroju	0%	Wed 18-05-02	Tue 18-05-22																
1721	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-05-02</b>	<b>Thu 18-08-30</b>																
1724	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-05-03</b>	<b>Mon 18-05-21</b>																
1730	<b>Jezdnia</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-08-28</b>	<b>Thu 18-09-13</b>																
1735	<b>Mur oporowy P1</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-09-15</b>	<b>Fri 18-05-11</b>																
1748	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-05-12</b>	<b>Fri 18-08-24</b>																
1750	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 7.1	0%	Sat 18-08-25	Fri 18-12-07																
1751	<b>Mur oporowy WE 7.1 _M7.2</b>	<b>14%</b>	<b>Tue 17-07-25</b>	<b>Fri 18-12-07</b>																
1752	Wymiana gruntu	100%	Tue 17-07-25	Thu 17-09-14																
1753	<b>Mur oporowy</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-09-29</b>	<b>Fri 18-12-07</b>																
1758	<b>M 7.2</b>	<b>34%</b>	<b>Tue 17-07-25</b>	<b>Mon 18-12-10</b>																
1759	<b>Roboty przygotowawcze</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-07-31</b>	<b>Wed 17-09-20</b>																
1764	Montaż mostu tymczasowego	100%	Mon 17-07-31	Wed 17-09-20																
1765	<b>Roboty fundamentowe</b>	<b>90%</b>	<b>Tue 17-07-25</b>	<b>Fri 17-10-20</b>																
1766	<b>Fundament P1L</b>	<b>91%</b>	<b>Tue 17-07-25</b>	<b>Wed 17-09-20</b>																
1767	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Tue 17-07-25	Fri 17-07-28																
1768	Wymiana gruntu	100%	Sat 17-07-29	Fri 17-08-04																
1769	Chudy beton	100%	Sat 17-08-05	Sat 17-08-05																
1770	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-14																
1771	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Tue 17-08-15	Fri 17-08-18																
1772	rozdeskowanie	100%	Wed 17-08-23	Thu 17-08-24																
1773	Izolacja P1	50%	Mon 17-08-28	Mon 17-08-28																
1774	Zasyпка P1	50%	Sat 17-09-16	Wed 17-09-20																
1775	<b>Fundament P1P</b>	<b>91%</b>	<b>Tue 17-07-25</b>	<b>Wed 17-09-20</b>																
1776	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Tue 17-07-25	Fri 17-07-28																
1777	Wymiana gruntu	100%	Tue 17-07-25	Mon 17-07-31																

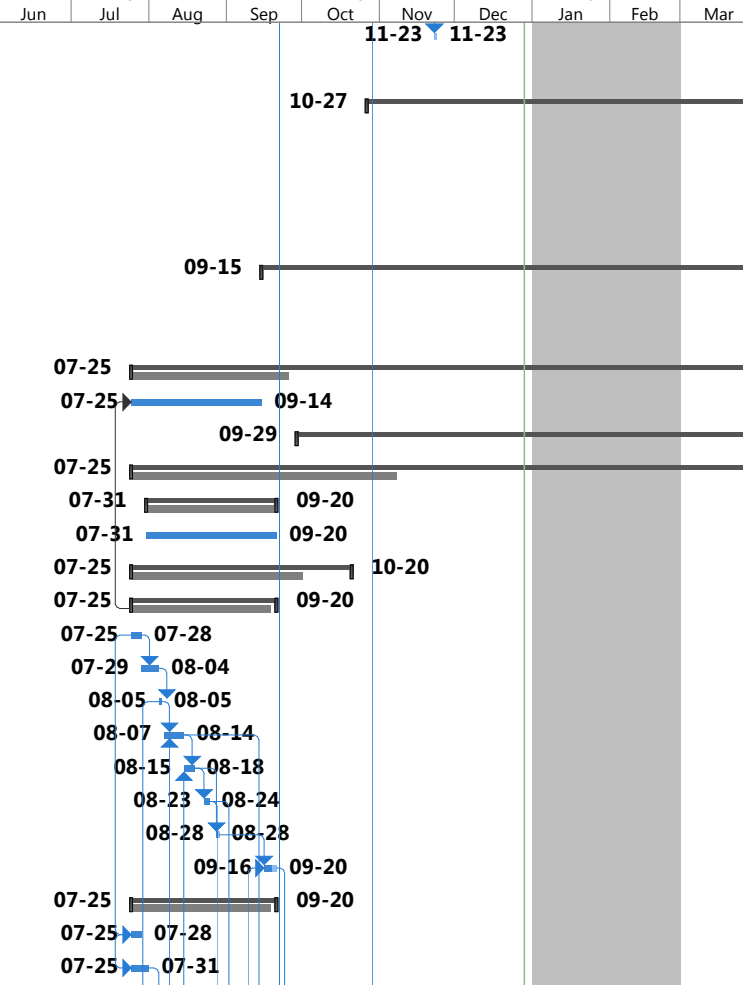

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1778	Chudy beton	100%	Sat 17-08-05	Sat 17-08-05		08-05	08-05								
1779	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Fri 17-08-25	Fri 17-09-01			08-25	09-01							
1780	deskowanie +Beton fundamentu P1	100%	Sat 17-09-02	Wed 17-09-06				09-02	09-06						
1781	rozdeskowanie	100%	Mon 17-09-11	Tue 17-09-12				09-11	09-12						
1782	Izolacja P1	50%	Fri 17-09-15	Fri 17-09-15				09-15	09-15						
1783	Zasyпка P1	50%	Sat 17-09-16	Wed 17-09-20				09-16	09-20						
1784	<b>Fundament F2 L</b>	<b>85%</b>	<b>Sat 17-07-29</b>	<b>Wed 17-09-13</b>				07-29	09-13						
1787	Chudy beton	100%	Sat 17-07-29	Sat 17-07-29			07-29	07-29							
1788	Zbrojenie funadmentu P2 L	100%	Fri 17-08-11	Fri 17-08-18			08-11	08-18							
1789	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Sat 17-08-19	Tue 17-08-22			08-19	08-22							
1790	rozdeskowanie	100%	Sat 17-08-26	Sat 17-08-26			08-26	08-26							
1791	Izolacja P2 L	50%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08				09-08	09-08						
1792	Zasyпка P2 L	50%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-13				09-09	09-13						
1793	<b>Fundament F2 P</b>	<b>91%</b>	<b>Sat 17-07-29</b>	<b>Fri 17-09-29</b>				07-29	09-29						
1794	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Sat 17-07-29	Wed 17-08-02			07-29	08-02							
1795	Wymiana gruntu	100%	Thu 17-08-03	Wed 17-08-09			08-03	08-09							
1796	Chudy beton	100%	Thu 17-08-10	Thu 17-08-10			08-10	08-10							
1797	Zbrojenie funadmentu P2 L	100%	Mon 17-08-28	Mon 17-09-04				08-28	09-04						
1798	deskowanie+Beton fundamentu P2 L	100%	Tue 17-09-05	Thu 17-09-07				09-05	09-07						
1799	rozdeskowanie	100%	Tue 17-09-12	Tue 17-09-12				09-12	09-12						
1800	Izolacja P2 L	50%	Mon 17-09-25	Mon 17-09-25				09-25	09-25						
1801	Zasyпка P2 L	50%	Tue 17-09-26	Fri 17-09-29				09-26	09-29						
1802	<b>Fundament P3 L</b>	<b>90%</b>	<b>Mon 17-08-28</b>	<b>Fri 17-10-06</b>				08-28	10-06						
1803	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Mon 17-08-28	Thu 17-08-31			08-28	08-31							
1804	Wymiana gruntu	100%	Fri 17-09-01	Thu 17-09-07				09-01	09-07						
1805	Chudy beton	100%	Fri 17-09-08	Fri 17-09-08				09-08	09-08						
1806	Zbrojenie fundamentu	100%	Thu 17-09-14	Thu 17-09-21				09-14	09-21						
1807	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-09-22	Fri 17-09-22				09-22	09-22						
1808	rozdeskowanie	100%	Wed 17-09-27	Wed 17-09-27				09-27	09-27						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1809	Izolacja	50%	Mon 17-10-02	Mon 17-10-02				10-02	10-02						
1810	Zasyпка	50%	Tue 17-10-03	Fri 17-10-06				10-03	10-06						
1811	<b>Fundament P3 P</b>	<b>90%</b>	<b>Fri 17-09-01</b>	<b>Fri 17-10-20</b>				09-01	10-20						
1812	Wykop wraz z zabezpieczeniem	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-09-05				09-01	09-05						
1813	Wymiana gruntu	100%	Wed 17-09-06	Tue 17-09-12				09-06	09-12						
1814	Chudy beton	100%	Wed 17-09-13	Wed 17-09-13				09-13	09-13						
1815	Zbrojenie funadmentu	100%	Thu 17-09-28	Thu 17-10-05				09-28	10-05						
1816	deskowanie+Beton fundamentu	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06				10-06	10-06						
1817	Izolacja	50%	Mon 17-10-16	Mon 17-10-16				10-16	10-16						
1818	Zasyпка	50%	Tue 17-10-17	Fri 17-10-20				10-17	10-20						
1819	<b>Korpusy filary</b>	<b>70%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Mon 18-03-19</b>				09-14							
1820	<b>Korpus podpor P1L</b>	<b>61%</b>	<b>Thu 17-09-21</b>	<b>Wed 17-11-29</b>				09-21	11-29						
1821	Zbrojenie podpory	100%	Thu 17-09-21	Thu 17-09-28				09-21	09-28						
1822	Deskowanie podpory	100%	Tue 17-09-26	Mon 17-10-09				09-26	10-09						
1823	Betonowanie	100%	Tue 17-10-10	Tue 17-10-10				10-10	10-10						
1824	Rozdeskowanie podpory	100%	Thu 17-10-19	Fri 17-10-20				10-19	10-20						
1825	Izolacja podpory	0%	Fri 17-10-27	Fri 17-10-27				10-27	10-27						
1826	Ciosy podłozyskowe	100%	Sat 17-10-28	Mon 17-10-30				10-28	10-30						
1827	<b>Podparcie belki</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-11-23</b>	<b>Wed 17-11-29</b>				11-23	11-29						
1828	Deskowanie poprzecznic etap 1	100%	Thu 17-11-23	Sat 17-11-25				11-23	11-25						
1829	Zbrojenie poprzecznic etap 1	100%	Mon 17-11-27	Tue 17-11-28				11-27	11-28						
1830	Betonowanie poprzecznic	100%	Wed 17-11-29	Wed 17-11-29				11-29	11-29						
1831	<b>Skrzydółko P1L</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 17-10-21</b>	<b>Tue 17-11-21</b>				10-21	11-21						
1837	<b>Korpus podpor P1 P</b>	<b>46%</b>	<b>Wed 17-10-18</b>	<b>Mon 18-03-19</b>				10-18							
1838	Zbrojenie podpory	100%	Wed 17-10-18	Thu 17-10-26				10-18	10-26						
1839	Deskowanie podpory	100%	Sat 17-10-21	Fri 17-11-03				10-21	11-03						
1840	Betonowanie	100%	Sat 17-11-04	Sat 17-11-04				11-04	11-04						
1841	Rozdeskowanie podpory	100%	Tue 17-11-14	Wed 17-11-15				11-14	11-15						
1842	Izolacja podpory	0%	Wed 17-11-22	Wed 17-11-22				11-22	11-22						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1843	Ciosy podłozyskowe	0%	Thu 17-11-23	Fri 17-11-24						11-23	11-24				
1844	<b>Podparcie belki</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 17-12-13</b>	<b>Mon 18-03-19</b>							12-13				03-19
1845	Deskowanie poprzecznic etap 1	0%	Wed 17-12-13	Thu 18-03-15							12-13				03-19
1846	Zbrojenie poprzecznic etap 1	0%	Fri 18-03-16	Sat 18-03-17											03-19
1847	Betonowanie poprzecznic	0%	Mon 18-03-19	Mon 18-03-19											03-19
1848	<b>Skrzydło P1P</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 17-11-15</b>	<b>Thu 18-03-15</b>							11-15				03-19
1854	<b>Filary P2 L</b>	<b>93%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Mon 17-11-20</b>					09-14						
1855	Zbrojenie filary	100%	Thu 17-09-14	Wed 17-09-20					09-14	09-20					
1856	<b>P2 L1</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-09-21</b>	<b>Tue 17-09-26</b>					09-21	09-26					
1859	<b>P2 L2</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-10-09</b>	<b>Fri 17-10-13</b>					10-09	10-13					
1862	<b>P2 L3</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-09-27</b>	<b>Mon 17-10-02</b>					09-27	10-02					
1865	Izolacja podpory	50%	Wed 17-11-15	Wed 17-11-15						11-15	11-15				
1866	Zasyпка podpory	50%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20						11-16	11-20				
1867	<b>Oczep P2L</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-10-20</b>	<b>Sat 17-10-28</b>					10-20	10-28					
1868	Deskowanie oczepu	100%	Fri 17-10-20	Tue 17-10-24					10-20	10-24					
1869	Zbrojenie oczepu	100%	Wed 17-10-25	Fri 17-10-27					10-25	10-27					
1870	Beton oczepu	100%	Sat 17-10-28	Sat 17-10-28					10-28	10-28					
1871	<b>Filary P2 P</b>	<b>67%</b>	<b>Thu 17-09-21</b>	<b>Fri 17-12-08</b>					09-21					12-08	
1872	Zbrojenie filary	100%	Thu 17-09-21	Wed 17-09-27					09-21	09-27					
1873	<b>P2 P4</b>	<b>100%</b>	<b>Tue 17-10-03</b>	<b>Sat 17-10-07</b>					10-03	10-07					
1876	<b>P2 P5</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-10-26</b>	<b>Tue 17-10-31</b>					10-26	10-31					
1879	<b>P2 P6</b>	<b>100%</b>	<b>Sat 17-10-14</b>	<b>Thu 17-10-19</b>					10-14	10-19					
1882	Izolacja podpory	50%	Mon 17-12-04	Mon 17-12-04						12-04	12-04				
1883	Zasyпка podpory	50%	Tue 17-12-05	Fri 17-12-08						12-05	12-08				
1884	<b>Oczep P2P</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 17-11-07</b>	<b>Thu 17-11-16</b>					11-07	11-16					
1885	Deskowanie oczepu	0%	Tue 17-11-07	Fri 17-11-10					11-07	11-10					
1886	Zbrojenie oczepu	0%	Sat 17-11-11	Tue 17-11-14					11-11	11-14					
1887	Beton oczepu	0%	Wed 17-11-15	Thu 17-11-16					11-15	11-16					
1888	<b>Korpus podpor P3L</b>	<b>97%</b>	<b>Sat 17-10-14</b>	<b>Wed 17-11-29</b>					10-14					11-29	

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	


ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1889	Zbrojenie podpory	100%	Sat 17-10-14	Mon 17-10-23					10-14	10-23					
1890	Deskowanie podpory	100%	Tue 17-10-17	Mon 17-10-30					10-17	10-30					
1891	Betonowanie	100%	Tue 17-10-31	Tue 17-10-31					10-31	10-31					
1892	Rozdeskowanie podpory	100%	Thu 17-11-09	Fri 17-11-10					11-09	11-10					
1893	Izolacja podpory	0%	Fri 17-11-17	Fri 17-11-17					11-17	11-17					
1894	Ciosy podłozyskowe	100%	Sat 17-11-18	Mon 17-11-20					11-18	11-20					
1895	<b>Podparcie belki</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-11-23</b>	<b>Wed 17-11-29</b>					11-23	11-29					
1896	Deskowanie poprzecznic etap 1	100%	Thu 17-11-23	Sat 17-11-25					11-23	11-25					
1897	Zbrojenie poprzecznic etap 1	100%	Mon 17-11-27	Tue 17-11-28					11-27	11-28					
1898	Betonowanie poprzecznic	100%	Wed 17-11-29	Wed 17-11-29					11-29	11-29					
1899	<b>Korpus podpor P3 P</b>	<b>71%</b>	<b>Sat 17-11-11</b>	<b>Mon 18-03-19</b>					11-11						0
1900	Zbrojenie podpory	100%	Sat 17-11-11	Sat 17-11-18					11-11	11-18					
1901	Deskowanie podpory	100%	Tue 17-11-14	Mon 17-11-27					11-14	11-27					
1902	Betonowanie	100%	Tue 17-11-28	Tue 17-11-28					11-28	11-28					
1903	Rozdeskowanie podpory	100%	Thu 17-12-07	Fri 17-12-08					12-07	12-08					
1904	Izolacja podpory	0%	Thu 18-03-15	Thu 18-03-15										03-15	03
1905	Ciosy podłozyskowe	0%	Sat 17-12-09	Mon 17-12-11					12-09	12-11					
1906	<b>Podparcie belki</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 17-12-13</b>	<b>Mon 18-03-19</b>					12-13						0
1907	Deskowanie poprzecznic etap 1	0%	Wed 17-12-13	Thu 18-03-15					12-13						03
1908	Zbrojenie poprzecznic etap 1	0%	Fri 18-03-16	Sat 18-03-17											03
1909	Betonowanie poprzecznic	0%	Mon 18-03-19	Mon 18-03-19											03
1910	<b>Montaż łożysk</b>	<b>67%</b>	<b>Tue 17-11-21</b>	<b>Tue 17-12-12</b>					11-21	12-12					
1911	Jezdnia L	100%	Tue 17-11-21	Wed 17-11-22					11-21	11-22					
1912	Jezdnia P	0%	Tue 17-12-12	Tue 17-12-12					12-12	12-12					
1913	<b>Ścianka zapleczna</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-07-26</b>	<b>Wed 18-08-08</b>											
1916	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-08-17</b>	<b>Fri 18-09-21</b>											
1927	<b>Ustrój nośne</b>	<b>10%</b>	<b>Sat 18-03-24</b>	<b>Mon 18-10-01</b>											03-24
1928	<b>Ustrój jezdni L</b>	<b>18%</b>	<b>Sat 18-03-24</b>	<b>Mon 18-10-01</b>											03-24
1929	<b>Belki typu T montaż</b>	<b>100%</b>	<b>Sat 18-03-24</b>	<b>Fri 18-04-13</b>											03-24

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
1930	Montaż belek prefabrykowanych	100%	Sat 18-03-24	Mon 18-04-09										03-24
1931	montaż deskowania traconego	100%	Tue 18-04-10	Fri 18-04-13										04-1
1932	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-04-14</b>	<b>Mon 18-04-30</b>										04-1
1933	Zbrojenie	0%	Sat 18-04-14	Mon 18-04-30										04-1
1934	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-05-01</b>	<b>Mon 18-06-04</b>										
1935	Ustrój	0%	Tue 18-05-01	Tue 18-05-01										
1936	Rozdeskowanie	0%	Sat 18-05-26	Mon 18-06-04										
1937	<b>izolacja ustroju</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-06-18</b>	<b>Wed 18-08-22</b>										
1938	Izolacja pod kapami chodnikowymi	0%	Mon 18-06-18	Mon 18-06-18										
1939	Izolacja jezdni	0%	Tue 18-08-21	Wed 18-08-22										
1940	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-06-05</b>	<b>Fri 18-06-08</b>										
1941	Montaż	0%	Tue 18-06-05	Wed 18-06-06										
1942	Deskowanie + Betonowanie	0%	Thu 18-06-07	Fri 18-06-08										
1943	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-06-19</b>	<b>Thu 18-08-02</b>										
1944	montaż krawężników	0%	Tue 18-06-19	Wed 18-06-27										
1945	montaż deskowania pod deski gzymsowe	0%	Thu 18-06-28	Fri 18-07-13										
1946	montaż desek gzymsowych	0%	Sat 18-07-14	Wed 18-07-25										
1947	montaż zbrojenia	0%	Thu 18-07-26	Tue 18-07-31										
1948	betonowanie kapy chodnikowej	0%	Wed 18-08-01	Thu 18-08-02										
1949	drenaż pod kapą chodnikową	0%	Thu 18-06-28	Fri 18-06-29										
1950	<b>Jezdnia</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-08-23</b>	<b>Mon 18-10-01</b>										
1951	Korytka	0%	Thu 18-08-23	Tue 18-08-28										
1952	asfalt twardolany	0%	Fri 18-09-28	Fri 18-09-28										
1953	drenaz	0%	Wed 18-08-29	Thu 18-08-30										
1954	sma	0%	Sat 18-09-29	Sat 18-09-29										
1955	przeciwspadki	0%	Mon 18-10-01	Mon 18-10-01										
1956	<b>Ustroj jezdni P</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-05-02</b>	<b>Mon 18-10-01</b>										
1984	<b>Mur oporowy P3</b>	<b>7%</b>	<b>Tue 17-10-03</b>	<b>Fri 18-10-12</b>										10-03
1985	<b>Mur P3 L</b>	<b>8%</b>	<b>Tue 17-10-03</b>	<b>Fri 18-10-12</b>										10-03

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

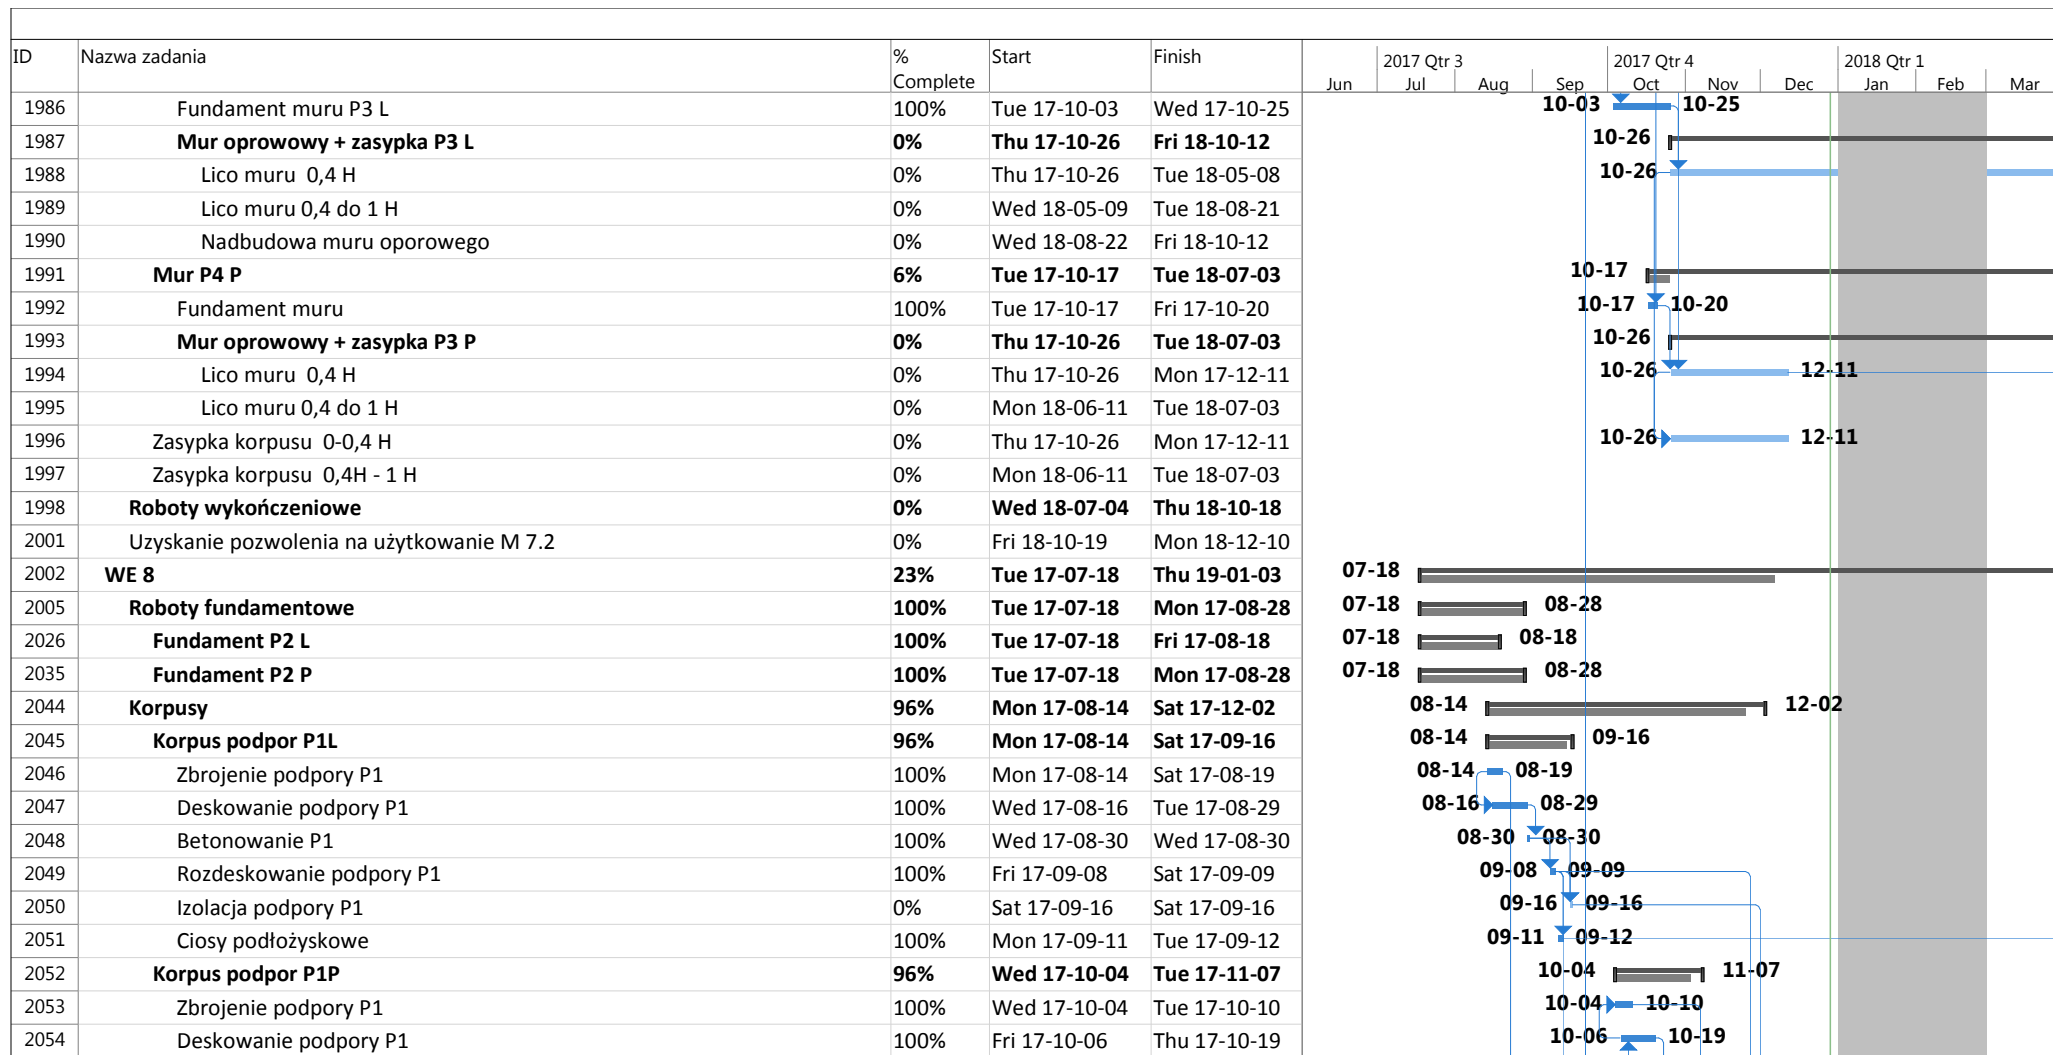

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	


ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
2055	Betonowanie P1	100%	Fri 17-10-20	Fri 17-10-20					10-20	10-20					
2056	Rozdeskowanie podpory P1	100%	Mon 17-10-30	Tue 17-10-31					10-30	10-31					
2057	Izolacja podpory P1	0%	Tue 17-11-07	Tue 17-11-07					11-07	11-07					
2058	ciosy podłożyskowe	100%	Wed 17-11-01	Thu 17-11-02					11-01	11-02					
2059	<b>Korpus podpor P2 L</b>	<b>96%</b>	<b>Mon 17-08-21</b>	<b>Thu 17-10-12</b>							10-12				
2060	Zbrojenie podpory P2	100%	Mon 17-08-21	Sat 17-08-26					08-21	08-26					
2061	Deskowanie podpory P2	100%	Mon 17-09-11	Sat 17-09-23					09-11	09-23					
2062	Betonowanie P2	100%	Mon 17-09-25	Mon 17-09-25					09-25	09-25					
2063	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Wed 17-10-04	Thu 17-10-05					10-04	10-05					
2064	Izolacja podpory P2	0%	Thu 17-10-12	Thu 17-10-12					10-12	10-12					
2065	ciosy podłożyskowe	100%	Fri 17-10-06	Fri 17-10-06					10-06	10-06					
2066	<b>Korpus podpor P2 P</b>	<b>96%</b>	<b>Fri 17-10-27</b>	<b>Sat 17-12-02</b>							10-27		12-02		
2067	Zbrojenie podpory P2	100%	Fri 17-10-27	Thu 17-11-02					10-27	11-02					
2068	Deskowanie podpory P2	100%	Wed 17-11-01	Tue 17-11-14					11-01	11-14					
2069	Betonowanie P2	100%	Wed 17-11-15	Wed 17-11-15					11-15	11-15					
2070	Rozdeskowanie podpory P2	100%	Fri 17-11-24	Sat 17-11-25					11-24	11-25					
2071	Izolacja podpory P2	0%	Sat 17-12-02	Sat 17-12-02					12-02	12-02					
2072	ciosy podłożyskowe	100%	Mon 17-11-27	Tue 17-11-28					11-27	11-28					
2073	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-07-24</b>	<b>Fri 18-09-07</b>											
2084	<b>Ścianka zaplecza</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-06-30</b>	<b>Fri 18-07-13</b>											
2087	<b>Montaż łożysk</b>	<b>50%</b>	<b>Sat 18-05-12</b>	<b>Sat 18-05-12</b>											
2088	Jezdnia Lewa	100%	Sat 18-05-12	Sat 18-05-12											
2089	Jezdnia prawa	0%	Sat 18-05-12	Sat 18-05-12											
2090	<b>Ustrój nośny</b>	<b>47%</b>	<b>Mon 17-11-27</b>	<b>Fri 18-06-29</b>							11-27				
2091	<b>Ustroj jezdnia L</b>	<b>68%</b>	<b>Mon 17-11-27</b>	<b>Wed 18-05-02</b>							11-27				
2092	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój L</b>	<b>60%</b>	<b>Mon 17-11-27</b>	<b>Thu 17-12-07</b>							11-27		12-07		
2093	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Mon 17-11-27	Sat 17-12-02							11-27		12-02		
2094	Ułożenie płyt drogowych	0%	Mon 17-12-04	Thu 17-12-07							12-04		12-07		
2095	<b>Deskowanie ustroju nośnego L</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-12-08</b>	<b>Thu 18-03-22</b>							12-08				

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1				
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
2096	Ustawienie wież rusztowania	100%	Fri 17-12-08	Thu 17-12-14							12-08	12-14			
2097	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Thu 18-03-15	Thu 18-03-22											
2098	<b>Zbrojenie ustroju nośnego L</b>	<b>60%</b>	<b>Fri 18-03-23</b>	<b>Tue 18-04-03</b>											
2099	Zbrojenie	60%	Fri 18-03-23	Tue 18-04-03											
2100	<b>Betonowanie ustroju nośnego L</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-04-04</b>	<b>Wed 18-05-02</b>											
2101	Ustrój	0%	Wed 18-04-04	Wed 18-04-04											
2102	Rozdeskowanie	0%	Mon 18-04-30	Wed 18-05-02											
2103	<b>Ustroj jezdni P</b>	<b>27%</b>	<b>Mon 17-12-04</b>	<b>Fri 18-06-29</b>											
2104	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój P</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-12-04</b>	<b>Thu 17-12-14</b>											
2105	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Mon 17-12-04	Sat 17-12-09											
2106	Ułożenie płyt drogowych	100%	Mon 17-12-11	Thu 17-12-14											
2107	<b>Deskowanie ustroju nośnego P</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-05-05</b>	<b>Sat 18-05-19</b>											
2108	Ustawienie wież rusztowania	0%	Sat 18-05-05	Fri 18-05-11											
2109	Deskowanie ustroju nośnego	0%	Sat 18-05-12	Sat 18-05-19											
2110	<b>Zbrojenie ustroju nośnego P</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-05-21</b>	<b>Thu 18-05-31</b>											
2111	Zbrojenie	0%	Mon 18-05-21	Thu 18-05-31											
2112	<b>Betonowanie ustroju nośnego P</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-06-01</b>	<b>Fri 18-06-29</b>											
2113	Ustrój	0%	Fri 18-06-01	Fri 18-06-01											
2114	Rozdeskowanie	0%	Wed 18-06-27	Fri 18-06-29											
2115	<b>izolacja ustroju</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-06-27</b>	<b>Sat 18-10-06</b>											
2118	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-07-26</b>	<b>Wed 18-08-01</b>											
2121	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-07-02</b>	<b>Thu 18-07-26</b>											
2128	<b>Jezdni</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-10-03</b>	<b>Mon 18-10-08</b>											
2133	<b>Mur oporowy P1</b>	<b>4%</b>	<b>Mon 17-11-27</b>	<b>Mon 18-07-23</b>											
2134	<b>Mur P1 L</b>	<b>6%</b>	<b>Mon 17-11-27</b>	<b>Mon 18-07-23</b>											
2135	Fundament muru P1 L	100%	Mon 17-11-27	Thu 17-11-30											
2136	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-12-01</b>	<b>Mon 18-07-23</b>											
2137	Lico muru 0,4 H	0%	Fri 17-12-01	Mon 18-04-16											
2138	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Sat 18-06-30	Mon 18-07-23											

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
2139	<b>Mur P1 P</b>	6%	Mon 17-11-27	Mon 18-07-23						11-27			
2140	Fundament muru P1 L	100%	Mon 17-11-27	Thu 17-11-30						11-27	11-30		
2141	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	0%	Fri 17-12-01	Mon 18-07-23						12-01			
2142	Lico muru 0,4 H	0%	Fri 17-12-01	Mon 18-04-16						12-01			
2143	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Sat 18-06-30	Mon 18-07-23						12-01			
2144	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	0%	Fri 17-12-01	Mon 18-04-16						12-01			
2145	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	0%	Sat 18-06-30	Mon 18-07-23						12-01			
2146	<b>Mur oporowy P2</b>	4%	Mon 17-11-27	Wed 18-08-15						11-27			
2147	<b>Mur P2 L</b>	6%	Mon 17-11-27	Wed 18-08-15						11-27			
2148	Fundament muru P2 L	100%	Mon 17-11-27	Thu 17-11-30						11-27	11-30		
2149	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	0%	Fri 17-12-01	Wed 18-08-15						12-01			
2150	Lico muru 0,4 H	0%	Fri 17-12-01	Mon 18-04-16						12-01			
2151	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Tue 18-07-24	Wed 18-08-15						12-01			
2152	<b>Mur P2 P</b>	6%	Mon 17-11-27	Wed 18-08-15						11-27			
2153	Fundament muru P2 P	100%	Mon 17-11-27	Thu 17-11-30						11-27	11-30		
2154	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 P</b>	0%	Mon 17-12-04	Wed 18-08-15						12-04			
2155	Lico muru 0,4 H	0%	Mon 17-12-04	Wed 18-04-18						12-04			
2156	Lico muru 0,4 do 1 H	0%	Tue 18-07-24	Wed 18-08-15						12-04			
2157	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	0%	Mon 17-12-04	Wed 18-04-18						12-04			
2158	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	0%	Tue 18-07-24	Wed 18-08-15						12-04			
2159	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Thu 18-08-16	Wed 18-10-24									
2161	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 8	0%	Thu 18-10-25	Thu 19-01-03									
2162	<b>PZ 9</b>	10%	Mon 17-08-07	Thu 18-12-13									
2163	<b>Roboty przygotowawcze</b>	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-07									
2164	Dojazd do obiektu	100%	Mon 17-08-07	Mon 17-08-07									
2165	<b>Roboty fundamentowe</b>	74%	Tue 17-08-08	Tue 17-11-28									
2166	<b>Fundament P1L</b>	76%	Tue 17-08-08	Fri 17-11-10									
2167	Wykop	100%	Tue 17-08-08	Fri 17-08-11									
2168	Wymiana pod fundamentem	100%	Wed 17-10-04	Sat 17-10-07									



Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	


ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
2169	Chudy beton	100%	Mon 17-10-09	Mon 17-10-09					10-09	10-09					
2170	Zbrojenie fundamentu P1	100%	Tue 17-10-10	Sat 17-10-14					10-10	10-14					
2171	Deskowanie + Beton fundamentu P1	100%	Sat 17-10-14	Wed 17-10-18					10-14	10-18					
2172	Rozdeskowanie	100%	Mon 17-10-23	Mon 17-10-23					10-23	10-23					
2173	Izolacja P1	0%	Sat 17-11-04	Mon 17-11-06					11-04	11-06					
2174	Zasyпка P1	0%	Tue 17-11-07	Fri 17-11-10					11-07	11-10					
2175	<b>Fundament P1 P</b>	<b>76%</b>	<b>Tue 17-08-08</b>	<b>Mon 17-11-20</b>											
2176	Wykop	100%	Tue 17-08-08	Fri 17-08-11					08-08	08-11					
2177	Wymiana pod fundamentem	100%	Wed 17-10-04	Sat 17-10-07					10-04	10-07					
2178	Chudy beton	100%	Mon 17-10-09	Mon 17-10-09					10-09	10-09					
2179	Zbrojenie funadmentu P1	100%	Sat 17-10-21	Thu 17-10-26					10-21	10-26					
2180	Deskowanie + Beton fundamentu P1	100%	Tue 17-10-24	Fri 17-10-27					10-24	10-27					
2181	Rozdeskowanie	100%	Wed 17-11-01	Wed 17-11-01					11-01	11-01					
2182	Izolacja P1	0%	Tue 17-11-14	Wed 17-11-15					11-14	11-15					
2183	Zasyпка P1	0%	Thu 17-11-16	Mon 17-11-20					11-16	11-20					
2184	<b>Fundament P2 L</b>	<b>68%</b>	<b>Sat 17-08-12</b>	<b>Fri 17-11-17</b>											
2185	Wykop	100%	Sat 17-08-12	Wed 17-08-16					08-12	08-16					
2186	Wymiana pod fundamentem	100%	Thu 17-08-17	Mon 17-08-21					08-17	08-21					
2187	Chudy beton	100%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22					08-22	08-22					
2188	Zbrojenie funadmentu P2 L	60%	Mon 17-10-16	Fri 17-10-20					10-16	10-20					
2189	Deskowanie + Beton fundamentu P2 L	100%	Sat 17-10-21	Wed 17-10-25					10-21	10-25					
2190	Rozdeskowanie	100%	Mon 17-10-30	Mon 17-10-30					10-30	10-30					
2191	Izolacja P2 L	0%	Sat 17-11-11	Mon 17-11-13					11-11	11-13					
2192	Zasyпка P2 L	0%	Tue 17-11-14	Fri 17-11-17					11-14	11-17					
2193	<b>Fundament P2 P</b>	<b>76%</b>	<b>Sat 17-08-12</b>	<b>Tue 17-11-28</b>											
2194	Wykop	100%	Sat 17-08-12	Wed 17-08-16					08-12	08-16					
2195	Wymiana pod fundamentem	100%	Thu 17-08-17	Mon 17-08-21					08-17	08-21					
2196	Chudy beton	100%	Tue 17-08-22	Tue 17-08-22					08-22	08-22					
2197	Zbrojenie funadmentu P2	100%	Fri 17-10-27	Wed 17-11-01					10-27	11-01					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
2198	Deskowanie +Beton fundamentu P2	100%	Wed 17-11-01	Sat 17-11-04					11-01	11-04			
2199	Rozdeskowanie	100%	Thu 17-11-09	Thu 17-11-09					11-09	11-09			
2200	Izolacja P2	0%	Wed 17-11-22	Thu 17-11-23					11-22	11-23			
2201	Zasyпка P2	0%	Fri 17-11-24	Tue 17-11-28					11-24	11-28			
2202	<b>Korpusy</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 17-11-11</b>	<b>Thu 18-04-05</b>					11-11				
2227	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-07-14</b>	<b>Mon 18-08-06</b>									
2238	<b>Ustrój nośny</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-03-30</b>	<b>Tue 18-07-17</b>									03-30
2263	<b>izolacja ustroju</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-07-14</b>	<b>Fri 18-08-24</b>									
2266	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-07-14</b>	<b>Wed 18-09-19</b>									
2269	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-07-16</b>	<b>Tue 18-07-31</b>									
2276	<b>Jezdnia</b>	<b>0%</b>	<b>Sat 18-09-15</b>	<b>Thu 18-09-20</b>									
2281	<b>Mur oporowy P1</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-03-30</b>	<b>Thu 18-07-12</b>									03-30
2294	<b>Mur oporowy P2</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-03-30</b>	<b>Thu 18-07-12</b>									03-30
2307	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 18-07-13</b>	<b>Thu 18-09-20</b>									
2309	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie PZ 9	0%	Thu 18-09-20	Thu 18-12-13									
2310	<b>WE 10</b>	<b>59%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Fri 18-11-30</b>	07-19								
2350	<b>Korpusy</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Thu 17-08-31</b>	07-19			08-31					
2375	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-06-04</b>	<b>Thu 18-07-19</b>									
2386	<b>Ustrój nośny</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Thu 18-05-10</b>				08-25					
2387	<b>Ustroj jezdni L</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-09-29</b>	<b>Tue 17-12-12</b>				09-29			12-12		
2388	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój L</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-09-29</b>	<b>Mon 17-10-16</b>				09-29		10-16			
2389	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Fri 17-09-29	Tue 17-10-10				09-29		10-10			
2390	Ułożenie płyt drogowych	100%	Wed 17-10-11	Mon 17-10-16				10-11		10-16			
2391	<b>Deskowanie ustroju nośnego L</b>	<b>100%</b>	<b>Tue 17-10-17</b>	<b>Wed 17-11-01</b>				10-17		11-01			
2392	Ustawienie wież rusztowania	100%	Tue 17-10-17	Wed 17-10-25				10-17		10-25			
2393	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Thu 17-10-26	Wed 17-11-01				10-26		11-01			
2394	<b>Zbrojenie ustroju nośnego L</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 17-11-02</b>	<b>Mon 17-11-13</b>				11-02		11-13			
2395	Zbrojenie	100%	Thu 17-11-02	Mon 17-11-13				11-02		11-13			
2396	<b>Betonowanie ustroju nośnego L</b>	<b>100%</b>	<b>Tue 17-11-14</b>	<b>Tue 17-12-12</b>				11-14		12-12			

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
2397	Ustrój	100%	Tue 17-11-14	Tue 17-11-14					11-14	11-14				
2398	Rozdeskowanie	100%	Sat 17-12-09	Tue 17-12-12						12-09	12-12			
2399	<b>Ustroj jezdni P</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Thu 18-05-10</b>										
2400	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój P</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Sat 17-10-21</b>										
2401	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-09-05										
2402	Ułożenie płyt drogowych	100%	Tue 17-10-17	Sat 17-10-21										
2403	<b>Deskowanie ustroju nośnego P</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 18-03-15</b>	<b>Fri 18-03-30</b>										
2404	Ustawienie wież rusztowania	100%	Thu 18-03-15	Fri 18-03-23										
2405	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Sat 18-03-24	Fri 18-03-30										
2406	<b>Zbrojenie ustroju nośnego P</b>	<b>100%</b>	<b>Sat 18-03-31</b>	<b>Wed 18-04-11</b>										
2407	Zbrojenie	100%	Sat 18-03-31	Wed 18-04-11										
2408	<b>Betonowanie ustroju nośnego P</b>	<b>100%</b>	<b>Thu 18-04-12</b>	<b>Thu 18-05-10</b>										
2409	Ustrój	100%	Thu 18-04-12	Thu 18-04-12										
2410	Rozdeskowanie	100%	Tue 18-05-08	Thu 18-05-10										
2411	<b>izolacja ustroju</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-05-08</b>	<b>Wed 18-09-26</b>										
2414	<b>Montaż dylatacji</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-05-08</b>	<b>Mon 18-10-01</b>										
2417	<b>Kapy chodnikowe</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-05-09</b>	<b>Thu 18-05-31</b>										
2424	<b>Jezdnia</b>	<b>0%</b>	<b>Thu 18-09-27</b>	<b>Tue 18-10-02</b>										
2429	<b>Mur oporowy P1</b>	<b>74%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Sat 18-06-02</b>										
2430	<b>Mur P1 L</b>	<b>75%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Sat 18-06-02</b>										
2431	Fundament muru P1 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29										
2432	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>73%</b>	<b>Fri 17-09-01</b>	<b>Sat 18-06-02</b>										
2433	Lico muru 0,4 H	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17										
2434	Lico muru 0,4 do 1 H	20%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02										
2435	<b>Mur P1 P</b>	<b>75%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Sat 18-06-02</b>										
2436	Fundament muru P1 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29										
2437	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	<b>73%</b>	<b>Wed 17-08-30</b>	<b>Sat 18-06-02</b>										
2438	Lico muru 0,4 H	100%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14										
2439	Lico muru 0,4 do 1 H	20%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02										

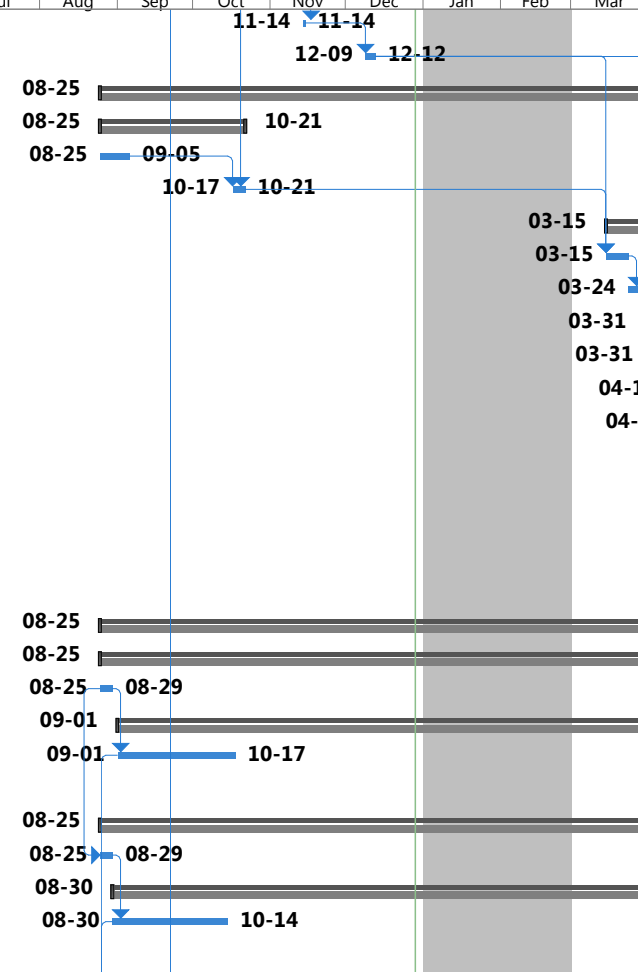

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	



ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
2440	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	100%	Fri 17-09-01	Tue 17-10-17			09-01		10-17						
2441	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	20%	Fri 18-05-11	Sat 18-06-02											
2442	<b>Mur oporowy P2</b>	<b>74%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Tue 18-06-26</b>			08-25								
2443	<b>Mur P2 L</b>	<b>75%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Tue 18-06-26</b>			08-25								
2444	Fundament muru P2 L	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29			08-25		08-29						
2445	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	<b>73%</b>	<b>Wed 17-08-30</b>	<b>Tue 18-06-26</b>			08-30								
2446	Lico muru 0,4 H	100%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14			08-30								
2447	Lico muru 0,4 do 1 H	20%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26											
2448	<b>Mur P2 P</b>	<b>75%</b>	<b>Fri 17-08-25</b>	<b>Tue 18-06-26</b>			08-25								
2449	Fundament muru P2 P	100%	Fri 17-08-25	Tue 17-08-29			08-25		08-29						
2450	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 P</b>	<b>73%</b>	<b>Wed 17-08-30</b>	<b>Tue 18-06-26</b>			08-30								
2451	Lico muru 0,4 H	100%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14			08-30								
2452	Lico muru 0,4 do 1 H	20%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26											
2453	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	100%	Wed 17-08-30	Sat 17-10-14			08-30								
2454	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	20%	Mon 18-06-04	Tue 18-06-26											
2455	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 18-06-27</b>	<b>Tue 18-10-09</b>											
2457	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WE 10	0%	Wed 18-10-10	Fri 18-11-30											
2458	<b>WD 11</b>	<b>61%</b>	<b>Sat 17-07-22</b>	<b>Tue 18-09-11</b>			07-22								
2476	<b>Korpusy</b>	<b>100%</b>	<b>Sat 17-07-22</b>	<b>Wed 17-09-06</b>			07-22			09-06					
2477	<b>Korpus podpor P1</b>	<b>100%</b>	<b>Sat 17-07-22</b>	<b>Wed 17-08-09</b>			07-22			08-09					
2484	<b>Korpus podpor P2</b>	<b>100%</b>	<b>Fri 17-07-28</b>	<b>Wed 17-09-06</b>			07-28			09-06					
2491	Montaż łożysk	100%	Sat 17-09-09	Sat 17-09-09					09-09	09-09					
2492	<b>Ścianka zapleczna</b>	<b>0%</b>	<b>Wed 17-12-13</b>	<b>Sat 18-03-17</b>								12-13			0
2495	<b>Płyty przejściowe</b>	<b>0%</b>	<b>Fri 17-12-08</b>	<b>Mon 18-04-23</b>								12-08			
2506	<b>Ustrój nośny</b>	<b>92%</b>	<b>Tue 17-08-29</b>	<b>Thu 17-11-30</b>			08-29					11-30			
2507	<b>Ustroj</b>	<b>92%</b>	<b>Tue 17-08-29</b>	<b>Thu 17-11-30</b>			08-29					11-30			
2508	<b>Przygotowanie podłoża pod ustrój</b>	<b>100%</b>	<b>Tue 17-08-29</b>	<b>Fri 17-09-08</b>			08-29			09-08					
2509	Przygotowanie podłoża góra robót ziemnych	100%	Tue 17-08-29	Sat 17-09-02			08-29			09-02					
2510	Ułożenie płyt drogowych	100%	Mon 17-09-04	Fri 17-09-08			09-04			09-08					

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4				2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
2511	<b>Deskowanie ustroju nośnego</b>	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-27			09-09	09-27							
2512	Ustawienie wież rusztowania	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-20			09-09	09-20							
2513	Deskowanie ustroju nośnego	100%	Thu 17-09-21	Wed 17-09-27			09-21	09-27							
2514	<b>Zbrojenie ustroju nośnego</b>	100%	Thu 17-09-28	Mon 17-10-09			09-28	10-09							
2515	Zbrojenie	100%	Thu 17-09-28	Mon 17-10-09			09-28	10-09							
2516	Montaż osłonek wpychanie kabli	100%	Thu 17-10-05	Sat 17-10-07			10-05	10-07							
2517	<b>Betonowanie ustroju nośnego</b>	100%	Tue 17-10-10	Sat 17-11-11			10-10	11-11							
2518	Ustrój	100%	Tue 17-10-10	Tue 17-10-10			10-10	10-10							
2519	sprężenie	100%	Sat 17-11-04	Sat 17-11-04			11-04	11-04							
2520	Rozdeskowanie	100%	Mon 17-11-06	Sat 17-11-11			11-06	11-11							
2521	<b>Dobetonowanie dźwigara</b>	33%	Fri 17-11-24	Thu 17-11-30			11-24	11-30							
2522	Deskowanie	0%	Mon 17-11-27	Wed 17-11-29			11-27	11-29							
2523	Zbrojenie	100%	Fri 17-11-24	Sat 17-11-25			11-24	11-25							
2524	Betonowanie	0%	Thu 17-11-30	Thu 17-11-30			11-30	11-30							
2525	<b>izolacja ustroju</b>	0%	Sat 18-03-17	Thu 18-06-21										03-17	
2528	<b>Montaż dylatacji</b>	0%	Mon 18-03-19	Sat 18-03-24										03-19	
2531	<b>Kapy chodnikowe</b>	0%	Mon 18-03-19	Fri 18-04-27										03-19	
2538	<b>Jezdnia</b>	0%	Fri 18-06-22	Wed 18-08-08											
2544	<b>Mur oporowy P1</b>	81%	Sat 17-09-09	Sat 17-12-09			09-09	12-09							
2545	<b>Mur P1 L</b>	81%	Sat 17-09-09	Sat 17-12-09			09-09	12-09							
2546	Fundament muru P1 L	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-13			09-09	09-13							
2547	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	80%	Thu 17-09-14	Sat 17-12-09			09-14	12-09							
2548	Lico muru 0,4 H	100%	Thu 17-09-14	Mon 17-10-30			09-14	10-30							
2549	Lico muru 0,4 do 1 H	40%	Fri 17-11-17	Sat 17-12-09				11-17	12-09						
2550	<b>Mur P1 P</b>	81%	Sat 17-09-09	Sat 17-12-09			09-09	12-09							
2551	Fundament muru P1 L	100%	Sat 17-09-09	Wed 17-09-13			09-09	09-13							
2552	<b>Mur oporowy +zasyпка</b>	80%	Thu 17-09-14	Sat 17-12-09			09-14	12-09							
2553	Lico muru 0,4 H	100%	Thu 17-09-14	Mon 17-10-30			09-14	10-30							
2554	Lico muru 0,4 do 1 H	40%	Fri 17-11-17	Sat 17-12-09				11-17	12-09						

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
2555	Zasyпка korpusu P1 0-0,4H	100%	Thu 17-09-14	Mon 17-10-30				09-14		10-30			
2556	Zasyпка korpusu P1 0,4H - 1 H	40%	Fri 17-11-17	Sat 17-12-09						11-17		12-09	
2557	<b>Mur oporowy P2</b>	<b>81%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Mon 18-04-02</b>				09-14					
2558	<b>Mur P2 L</b>	<b>81%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Mon 18-04-02</b>				09-14					
2559	Fundament muru P2 L	100%	Thu 17-09-14	Mon 17-09-18				09-14		09-18			
2560	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 L</b>	<b>80%</b>	<b>Tue 17-09-19</b>	<b>Mon 18-04-02</b>				09-19					
2561	Lico muru 0,4 H	100%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03				09-19			11-03		
2562	Lico muru 0,4 do 1 H	40%	Mon 17-12-11	Mon 18-04-02							12-11		
2563	<b>Mur P2 P</b>	<b>81%</b>	<b>Thu 17-09-14</b>	<b>Mon 18-04-02</b>				09-14					
2564	Fundament muru P2 P	100%	Thu 17-09-14	Mon 17-09-18				09-14		09-18			
2565	<b>Mur oporowy + zasyпка P2 P</b>	<b>80%</b>	<b>Tue 17-09-19</b>	<b>Mon 18-04-02</b>				09-19					
2566	Lico muru 0,4 H	100%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03				09-19			11-03		
2567	Lico muru 0,4 do 1 H	40%	Mon 17-12-11	Mon 18-04-02							12-11		
2568	Zasyпка korpusu P2 0-0,4 H	100%	Tue 17-09-19	Fri 17-11-03				09-19			11-03		
2569	Zasyпка korpusu P2 0,4H - 1 H	40%	Mon 17-12-11	Mon 18-04-02							12-11		
2570	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Tue 18-04-03</b>	<b>Wed 18-08-08</b>									04-03
2573	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WD 11	0%	Wed 18-08-08	Tue 18-09-11									
2574	<b>Przepusty</b>	<b>25%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Sat 18-11-17</b>	07-19								
2575	<b>Przepust 1+ 901</b>	<b>31%</b>	<b>Mon 17-08-21</b>	<b>Sat 18-11-17</b>				08-21					
2576	<b>Roboty fundamentowe</b>	<b>100%</b>	<b>Mon 17-08-21</b>	<b>Mon 17-09-11</b>				08-21		09-11			
2580	<b>Konstrukcja przepustu</b>	<b>74%</b>	<b>Tue 17-09-12</b>	<b>Mon 17-11-13</b>				09-12			11-13		
2581	montaż prefabrykatów	100%	Tue 17-09-12	Fri 17-09-22				09-12		09-22			
2582	Zasyпка przepustu	0%	Sat 17-09-23	Mon 17-10-09				09-23		10-09			
2583	Wykonanie płyty zespalającej	100%	Tue 17-10-10	Fri 17-10-20				10-10		10-20			
2584	Wykonanie wlotu wylotu przepustu	100%	Sat 17-10-21	Mon 17-11-13				10-21		11-13			
2585	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-07-02</b>	<b>Sat 18-11-17</b>									
2587	<b>Przepust 3+300</b>	<b>29%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Sat 18-11-17</b>	07-19								
2592	<b>Konstrukcja przepustu</b>	<b>100%</b>	<b>Wed 17-07-19</b>	<b>Wed 17-09-13</b>	07-19			09-13					
2597	<b>Roboty wykończeniowe</b>	<b>0%</b>	<b>Mon 18-07-02</b>	<b>Sat 18-11-17</b>									

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	

ID	Nazwa zadania	% Complete	Start	Finish	2017 Qtr 3			2017 Qtr 4			2018 Qtr 1			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
2598	schody , umocnienia, pomosty dla zwierząt	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17										
2599	<b>Przepust 10+246</b>	15%	Tue 17-09-19	Sat 18-11-17					09-19					
2600	<b>Roboty fundamentowe</b>	100%	Tue 17-09-19	Tue 17-10-10					09-19	10-10				
2601	Wykopy	100%	Tue 17-09-19	Tue 17-09-26					09-19	09-26				
2602	Wykonanie fundamentu kruszywowo piaskowego	100%	Wed 17-09-27	Sat 17-10-07					09-27	10-07				
2603	Wykonanie chudego betonu	100%	Mon 17-10-09	Tue 17-10-10					10-09	10-10				
2604	<b>Konstrukcja przepustu</b>	17%	Wed 17-10-11	Sat 18-03-17					10-11					01
2605	montaż prefabrykatów	100%	Wed 17-10-11	Sat 17-10-21					10-11	10-21				
2606	Zasyпка przepustu	0%	Mon 17-10-23	Tue 17-11-07					10-23	11-07				
2607	Wykonanie płyty zespalającej	0%	Wed 17-11-08	Sat 17-11-18					11-08	11-18				
2608	Wykonanie wlotu wylotu przepustu	0%	Mon 17-11-20	Sat 18-03-17					11-20					03
2609	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17										
2611	<b>Przepust 10+346</b>	29%	Thu 17-09-14	Sat 18-11-17					09-14					
2616	<b>Konstrukcja przepustu</b>	100%	Thu 17-09-14	Thu 17-11-09					09-14	11-09				
2621	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17										
2623	<b>Przepust 10+546</b>	25%	Fri 17-09-08	Sat 18-11-17					09-08					
2628	<b>Konstrukcja przepustu</b>	100%	Fri 17-09-08	Tue 17-10-24					09-08	10-24				
2633	<b>Roboty wykończeniowe</b>	0%	Mon 18-07-02	Sat 18-11-17										
2635	<b>Obiekty odcinek B</b>	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17					08-15	10-17				
2636	<b>PZ 12</b>	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17					08-15	10-17				
2758	<b>WE 13</b>	100%	Tue 17-08-15	Tue 17-10-17					08-15	10-17				

Krytyczne		Tylko z zakończeniem		Podsumowanie ręczne	
Podział krytyczny		Tylko z czasem trwania		Podsumowanie projektu	
Postęp krytyczny		Plan bazowy		Zadania zewnętrzne	
Zadanie		Podział według planu bazowego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Punkt kontrolny według planu bazowego		Zadanie nieaktywne	
Postęp zadania		Punkt kontrolny		Nieaktywny punkt kontrolny	
Zadanie ręczne		Postęp sumaryczny		Podsumowanie nieaktywne	
Tylko z rozpoczęciem		Podsumowanie		Termin ostateczny	
